



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 27

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 06 de noviembre de 2024
HORA:	De 08:00 am a 9:30 am
LUGAR:	Bogotá – reunión virtual estado del proyecto
ASISTENTES:	Adriana María García – profesional FINDETER Jaime Orozco – profesional FINDETER Diego Ríos – director interventoría Elver Hernández – coordinador interventoría Oscar Castaño profesional de apoyo EPC SA ESP Sonia Fajardo – secretaria infraestructura La Mesa Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento de las obras del proyecto construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa Anapoima

DESARROLLO:

1. la interventoría realiza presentación del estado de las obras informando lo siguiente:

Avance físico programado: 96.98%

Avance físico ejecutado: 83.13%

Financiero ejecutado: 80.3%

Actividades en ejecución: 13 frentes de ejecución de obra representados en 1 Frentes de instalación de tubería en HD 400mm. 1 frente en prueba de estanqueidad en tanque de succión, 6 frentes de construcción de estructuras especiales, 2 frentes de pruebas hidráulicas, 1 frente de instalación de tubería en acero de 350 mm frontera la Mesa Bojacá y 1 frente construcción cercha metálica para viaducto Doima, 1 frente de búsqueda de fugas en sector altogrande.

Tubería retirada 7.704 ml



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Hasta la fecha tubería instalada entre tanque de Bojacá y Tanque Casablanca 12.655 ml

Tubería instalada: 40.9 km

Tubería probada 32.8 km

Alertas: falta de permisos en el sector de la Arenera, permiso de INVIAS en sector de la cámara de desviación en Madrid, definición del tipo de pavimento en el sector de Doima por requerimiento del ICCU de ejecutar obras de llaves de empalme sobre 1.6 km y energización definitiva ante ENEL.

fecha probable de terminación: noviembre 2025

Actividades críticas


- Intervención vía Madrid ante INVIAS (Caja de derivación): radicado por EPC ante INVIAS, en proceso de revisión, duración programada ejecución de obra: 120 días, EPC se encuentra a espera de respuesta de la CAR para remitir nuevamente información ante INVIAS.
- Caja de Control: duración programada de ejecución de obra: 190 días, en proceso de importación de accesorios, interventoría indica que se mantiene plan de trabajo para llegada al país en el mes de diciembre de 2024.
- Permiso La Arenera. (aprovechamiento forestal CAR) – en proceso de ajuste del informe por parte del contratista
- Servidumbres de la arenera y cámaras de quiebre 2 y 4, ampliación de área de servidumbre a cargo de EPC y municipio de La Mesa, en proceso de estudios previos por parte de EPC y comité predial de La Mesa.
- Energización de subestación, trámite ante ENEL, contratista debe iniciar de nuevo el proceso para lo cual los municipios, EPC y la ERAT deben coordinar la emisión del poder que autorice al contratista a realizar los trámites en nombre de ellos.
- Entrega de obras viaducto sector Doima a cargo de DEVISAB: se iniciaron obras en agosto, pero bajos rendimiento, en proceso de terminación de estructura para que el contratista proceda con la revisión de la misma.
- Definición solución asfalto sector Doima: no previsto en presupuesto del proyecto la instalación de la llave de empalme entre asfalto existente y nuevo (contratista e interventor presentaron 4 alternativas, 3 requieren adición presupuestal, 1 jurídicamente no se considera viable), se debe presentar ante el ICCU y DEVISAB propuestas para conciliar solución.
- Definición operador a cargo de EPC, se dio inicio al contrato de interventoría par poder que emita concepto respecto a la solicitud de modificación del contrato de consultoría.

Los contratos de obra e interventoría vencen en su fase de construcción el 19 de noviembre de 2024, por lo cual se está revisando la solicitud de prórroga de ambos contratos por un termino inicial de 3 meses sin adición en ambos contratos.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión propuesta solicitud prorroga contratos derivados	FINDETER	19/11/2024

FIRMAS: se adjunta pantallazo de participantes del comité

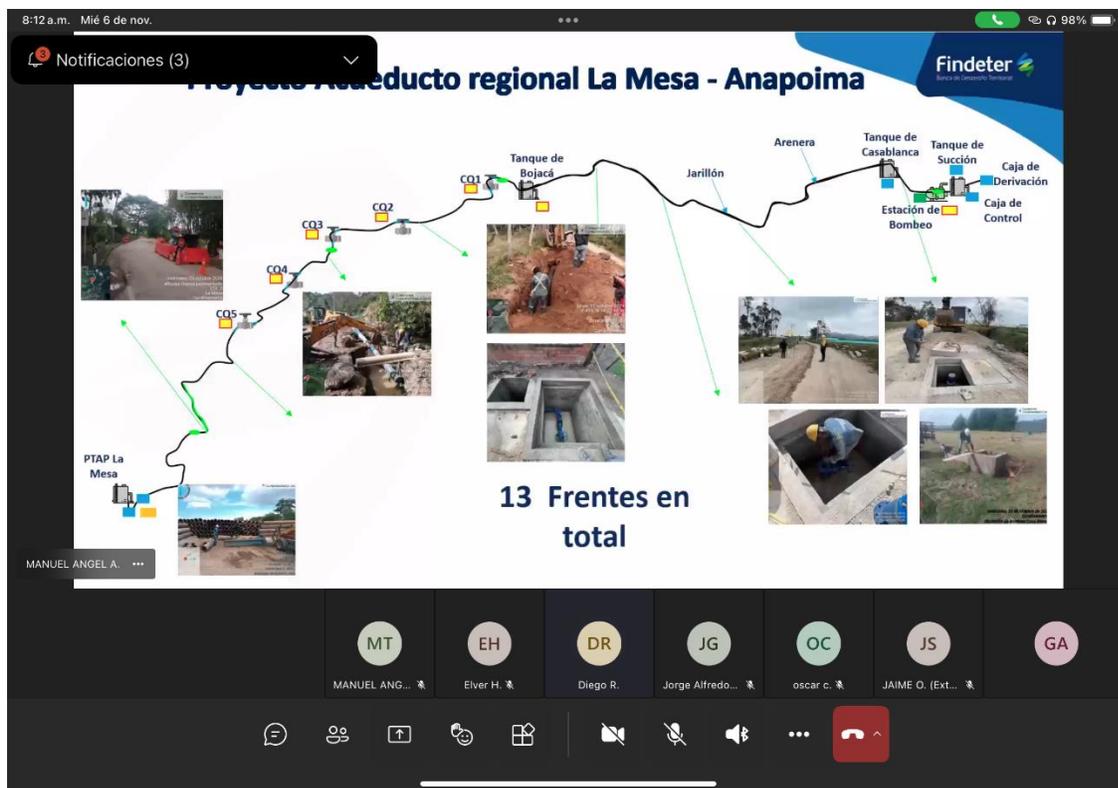

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora

Revisó:

Fecha: 07/10/2024
