



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de diciembre de 2024
HORA:	De 8:00 am a 08:20 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">1. FINDETER: José David Tatis Aguas - Supervisor2. Municipio de Planeta Rica: Miguel Marín – Profesional ambiental3. MVCT: Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al proyecto Convenio D318-2018 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II – CÓRDOBA.

1. Revisión de compromisos adquiridos en Mesa Técnica de Seguimiento del 06 de diciembre de 2024.
2. Seguimiento actividades de Obra -% Planeado vs ejecutado
3. Revisión proceso constructivo Filtros
4. Documentación plataforma SIGEVAS
5. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Desde FINDETER se informa que con la llegada de la tubería se inició la instalación de la línea de impulsión con la excavación requerida.

FINDETER informa que el contratista de obra realizó solicitud el 18 de diciembre de 2024 de suspensión al contrato de obra derivado por un término de 23 días

justificado en que el proveedor que realiza la fabricación de tubería de acero al carbón y respectivos accesorios informó a todos los clientes que hasta el 10 de diciembre de 2024 cerraría despacho con reapertura a partir del 13 de enero de 2025, lo cual afecta el suministro de material requerido como parte de las actividades en campo para la construcción de filtros y actividades de empalme en el tanque, solicitud que fue analizada en comité técnico en FINDETER y aprobada para que se suscriba a partir del 23 de diciembre de 2024 hasta el 15 de enero de 2025, con reinicio a partir del 16 de enero de 2025.

Contratista informó a FINDETER que se culminaría la instalación de la línea de impulsión cerrando respectivamente la excavación previo al inicio del periodo de suspensión solicitado. Y previo al reinicio de las actividades, el contratista de obra deberá presentar el cronograma de ejecución de las actividades pendientes

FINDETER aclara que la suspensión de los contratos no genera afectación al desarrollo del convenio D318-2018.

2. FINDETER informa que el avance de obra a la fecha es del 79%.
3. FINDETER indica que según lo informado por parte del residente de obra y con la verificación realizada en campo junto con el personal que ejecutará las actividades se constató que para la instalación de los filtros y mediante el manejo de válvulas se puede realizar la actividad sin que sea necesario hacer el pare de la planta.
4. FINDETER realizará actualización de la plataforma SIGEVAS en el transcurso del día viernes 20 de diciembre de 2024

Desde el MVCT se solicita a las partes informar si se tienen gestiones o actividades adicionales dentro de la ruta crítica para exponer en la presente mesa técnica, de modo que se pueda adelantar con antelación las respectivas gestiones. Las partes indican que no se tienen temas a tratar.


2 . Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Allegar documentos de suspensión a los contratos derivados	FINDETER	30/Dic/2024
2	Remitir registro fotográfico de evidencias en la instalación de la línea de impulsión	FINDETER	26/Dic/2024

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Actualización documental de la plataforma SIGEVAS	FINDETER	20/Dic/2024

Link de reunión: [Convenio D318-2018 Planeta Rica- Mesa Técnica de Seguimiento-20241220_080032-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:

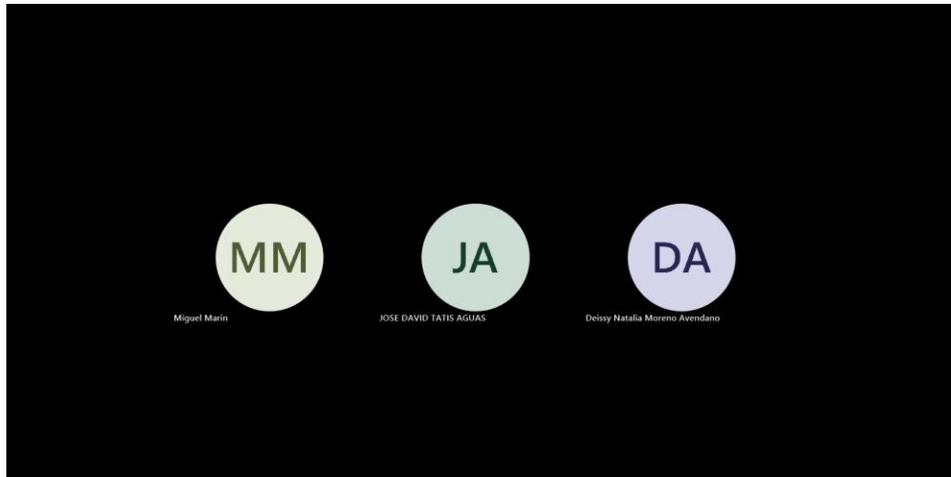

Elaboró: Deissy Natalia Moreno – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 23 de diciembre de 2024
