



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

### DATOS GENERALES

FECHA:	17 de diciembre de 2024
HORA:	De 9:30 am a 10:30 am y de 4:30 pm a 5:30 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none"><li>Plan Departamental de Aguas- Ejecutor: Rubén Ely- Jefe Área Técnica PDA Luisa Berrio – Apoyo área técnica Beatriz Lugo – Jefe área de contratación</li><li>Municipio Cereté- Getulio Padrón Heyne Mogollon – Asesor Jurídico municipio de Cereté San Carlos- Cristian Sanchez Romero – Secretario de Planeación Fray Monterrosa – Alcalde municipio de San Carlos</li><li>Contratos Derivados: Consortio Cereté San Carlos- Contratista de Obra Luis Guillermo Guzmán</li><li>AQUALIA Andrés Sepúlveda Guarín</li><li>MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio Diana Carolina Pinzon Velasquez – Apoyo jurídico</li></ol>

### ORDEN DEL DIA:

- Reporte ejecución de pruebas inherentes al Convenio CUR 1095-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
- Proceso de entrega a Municipio y empresa Operadora.

### DESARROLLO:

- Reporte de ejecución de pruebas



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por parte de AQUALIA se informa que se realizó acompañamiento a las pruebas realizadas, en esta prueba se presentaron algunas fugas en el manifold de salida, se identificaron 3 sitios con fugas en la línea de 16 pulgadas.

Con respecto al manifold de salida, AQUALIA informa se realizó la inspección de los ajustes de las fugas y por parte de ellos se encuentran listos para realizar las pruebas de manifold con carga y los dos sitios que se corrigieron cerca de la estación de bombeo. Aqualia considera que es factible que se realice la prueba en la tarde del 17 de diciembre de 2024.

Contratista indica que se encuentra trabajando en las fugas que se han presentado

## 2. Proceso de entrega a municipio y empresa operadora

Se informa que el PDA remitió a las alcaldías de Cereté y San Carlos la documentación como parte del proceso de entrega, debido a que el convenio se vence el 20 de diciembre de 2024 y se requiere hacer la entrega de la infraestructura construida.

Por parte de la alcaldía de Cereté se informa que se esta revisando la documentación allegada.

El PDA menciona que el proyecto se encuentra en pruebas finales y puesta en marcha, debido a que la corrección de fugas hace parte de esta fase de pruebas. Por otro lado menciona que, se cuentan con las pólizas y un rubro que se desembolsará al contratista en el momento de la liquidación, lo cual es garantía de que el contratista va a permanecer en sitio reparando las fugas que se presenten. Adicionalmente solicita que se realice la entrega y recibo de las obras a la alcaldía ya que no existen falencia en infraestructura construida o deficiencias técnicas.

Con respecto a la entrega de las obras, las partes acuerdan que se consultarán las condiciones de recibo de la obra con las respectivas áreas jurídicas y que en las horas de la tarde del día 17 de diciembre de 2024 se volverán a reunir para determinar las acciones que se van a tomar

### **Continuación reunión:**

El PDA informa que en compañía de AQUALIA se están realizando las pruebas de las redes de acueducto. Adicionalmente informa que las fugas que se han presentado se han ido reparando por parte del contratista.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Con respecto al recibo de las obras, las alcaldías y el PDA acuerdan que se realizará el recibo de las obras con las observaciones a las que haya lugar, respecto a las actividades de puesta en marcha y reparación de fugas que se están realizando.

El PDA informa que remitirá el acta con las observaciones realizadas para la respectiva revisión por parte de las alcaldías.

## 2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Trámite de acta de entrega de infraestructura.	Contratista, PDA y Alcaldías	19/Dic/2024
2	Reparación de fugas presentadas en la fase de pruebas	Contratista	


Link de grabación: [Convenio 1095-2020 Cereté- San Carlos Mesa Técnica de Seguimiento-20241217\\_094718-Grabación de la reunión.mp4](#)

[Convenio 1095-2020 Cereté- San Carlos Mesa Técnica de Seguimiento-20241217\\_163932-Grabación de la reunión.mp4](#)

## FIRMAS:


 Convenio 1095-2020 Cereté- San Carlos Mesa Técnica de Seguimiento

17 dic 2024 9:30 a.m. - 10:30 a.m.

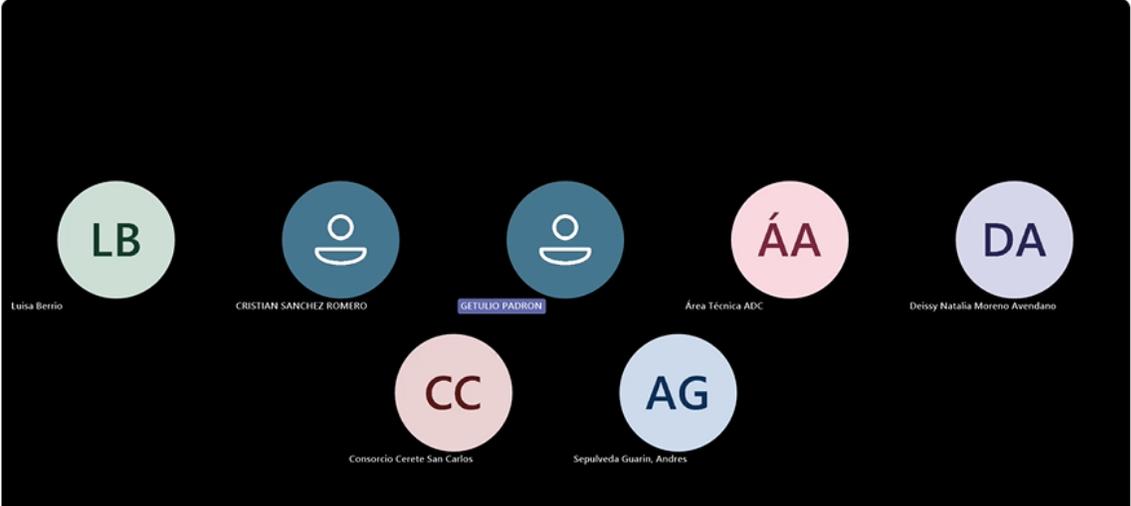

 **Convenio 1095-2020 Cereté- San Carlos Mesa Técnica de Seguimiento**

17 dic 2024 4:30 p.m. - 5:30 p.m.

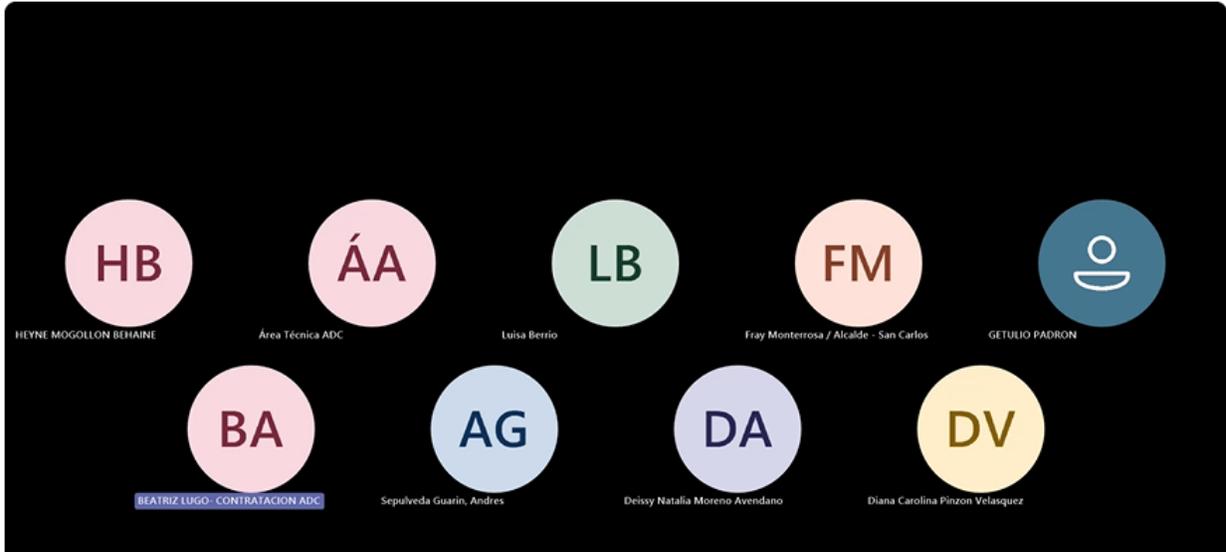

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 30 de Noviembre de 2024
