



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 22

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de octubre de 2024
HORA:	De 08:00 am a 9:30 am
LUGAR:	Bogotá – reunión presencial recorrido de obra
ASISTENTES:	Adriana María García – profesional FINDETER Jaime Orozco – profesional FINDETER Diego Ríos – director interventoría Elver Hernández – coordinador interventoría Oscar Castaño profesional de apoyo EPC SA ESP Sonia Fajardo – secretaria infraestructura La Mesa Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento de las obras del proyecto construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa Anapoima

DESARROLLO:

1. la interventoría realiza presentación del estado de las obras informando lo siguiente:

Avance físico programado: 95.7%

Avance físico ejecutado: 82.53%

Financiero ejecutado: 80.3%

Actividades en ejecución: 15 frentes de ejecución de obra representados en 3 Frentes de instalación de tubería en HD 400mm. 1 frente en prueba de estanqueidad en tanque de succión, 8 frentes de construcción de estructuras especiales, 1 frente demolición de placa huella en el Jarillón, 3 frentes de pruebas hidráulicas, 1 frente de instalación de tubería en acero de 350 mm frontera la Mesa Bojacá y 1 frente construcción cercha metálica para viaducto Doima.

Tubería retirada 7.704 ml



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Hasta la fecha tubería instalada entre tanque de Bojacá y Tanque Casablanca 12.655 ml

Tubería instalada: 40.9 km

Tubería probada 32.4 km

Alertas: falta de permisos en el sector de la Arenera, permiso de INVIAS en sector de la cámara de desviación en Madrid, definición del tipo de pavimento en el sector de Doima por requerimiento del ICCU de ejecutar obras de llaves de empalme sobre 1.6 km y energización definitiva ante ENEL.

fecha probable de terminación: junio 2025 más 3 meses de puesta en marcha


Actividades críticas

- Intervención vía Madrid ante INVIAS (Caja de derivación): radicado por EPC ante INVIAS, en proceso de revisión, duración programada ejecución de obra: 120 días.
- Caja de Control: duración programada de ejecución de obra: 190 días, en proceso de importación de accesorios
- Permiso La Arenera. (aprovechamiento forestal CAR) – en proceso de revisión por CAR
- Instalación de tubería: programado ejecución obra 159 días – estado, en proceso de permiso con servidumbre con municipio de Madrid, pendiente pronunciamiento de la CAR, respuesta del constructor al municipio por observaciones en proceso constructivo y obras de mitigación por zona de riesgo.
- Servidumbres de la arenera y cámaras de quiebre 2 y 4, ampliación de área de servidumbre a cargo de EPC y municipio de La Mesa, en proceso de legalización.
- Energización de subestación, trámite ante ENEL, no se puede dar continuidad hasta construcción de nueva subestación en Madrid – fecha de terminación estimada por ENEL - noviembre de 2024 y posterior se debe iniciar proceso de apertura de expediente para solicitud de conexión definitiva.
- Entrega de obras viaducto sector Doima a cargo de DEVISAB: se iniciaron obras en agosto, pero bajos rendimiento, posterior a esta obra, contratista acueducto debe instalar tubería, tiempo aproximado de 4 meses
- Definición solución asfalto sector Doima: no previsto en presupuesto del proyecto la instalación de la llave de empalme entre asfalto existente y nuevo (contratista e interventor presentaron 4 alternativas, 3 requieren adición presupuestal, 1 jurídicamente no se considera viable)
- Definición operador a cargo de EPC

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión respuesta observaciones proceso constructivo sector arenera	FINDETER	30/10/2024

FIRMAS: se adjunta pantallazo de participantes del comité

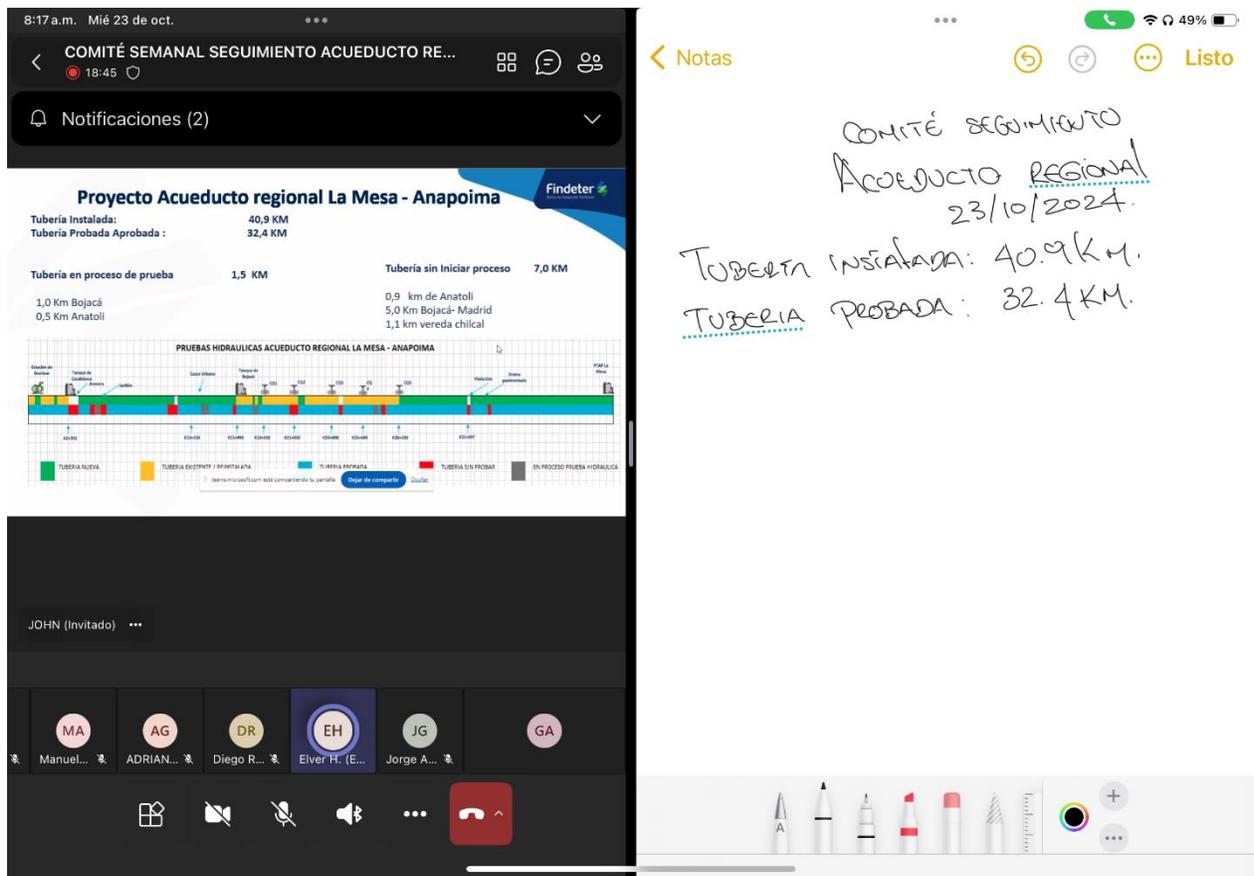

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora
 Revisó:
 Fecha: 07/10/2024
