

ACTA No. 32

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de enero de 2025
HORA:	De 08:00 am a 01:00 pm
LUGAR:	Bogotá – virtual
ASISTENTES:	Adriana María García – profesional FINDETER Jaime Orozco – profesional FINDETER Diego Ríos – director interventoría Elver Hernández – coordinador interventoría Oscar Castaño profesional de apoyo EPC SA ESP Sonia Fajardo – secretaria infraestructura La Mesa Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT Alejandra Ortega Municipio de Anapoima
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de revisión de seguimiento al proyecto construcción y puesta en Marcha del Acueducto Regional La Mesa Anapoima

DESARROLLO:

- La interventoría inicia presentación del estado de obra indicando lo siguiente:
Avance de obra: 86.44% ejecutado y 86.44 programado
Ejecución de actividades en los frentes de Caja de control, tanque de succión, Jarillón, Casco urbano de Bojacá, Tanque de Bojacá, cámara de quiebres 1 a 5, Sector Doima y Anatolí.
Fecha de terminación de terminación etapa de obra: 19 de febrero de 2025, para lo cual se deberá presentar solicitud de reformulación por modificación en el plan financiero del contrato en el componente de interventoría, esta reformulación deberá remitirse al Ministerio una vez se cuente con el respaldo financiero, que a la fecha va a ser por parte del municipio de Anapoima con 150 millones de pesos y el restante (440 millones aprox) por EPC SA ESP.
Para la reformulación se necesita la comunicación de EPC SA ESP y los municipios que respalde la mayor permanencia de la interventoría, una vez esto se tenga, FINDETER procederá a presentar en comité técnico para que permita la presentación de la reformulación.

Se le solicita desde este ministerio a EPC y municipios indicar fecha de remisión de la comunicación a lo cual se da respuesta por las partes indicando que el 03 de febrero se remitirá la documentación a FINDETER.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

EPC SA ESP solicita que se haga la evaluación financiera de las obras que permiten la funcionalidad del proyecto y continuar con la ejecución, posterior a esto se deberá revisar los balances de obra necesarias por afectaciones.

Para la caja de derivación se informa por parte de este ministerio que se realizó mesa de trabajo con INVIAS quien informó que la solicitud fue devuelta a EPC y que de acuerdo a esta devolución EPC deberá remitir las subsanaciones, por lo cual se remite a EPC SA ESP el contacto del profesional de INVIAS para que inicie las gestiones correspondientes.

La caja de control se inició a construir el 13 de enero, con una duración de 90 días de ejecución

El tanque de succión falta la prueba de estanqueidad la cual no se ha podido ejecutar por falta de agua para el lleno total, a la fecha se tiene prueba a altura de 2 mts.

Falta la reparación estructural en la parte alta del tanque para lo cual ya se cuenta con las láminas de fibra de carbón, pero solo serán instaladas hasta que se haga la totalidad de la prueba de estanquidad.

Tanque Casablanca: en ejecución obras civiles como cámaras para instalación de accesorios.

Sector arenera: ejecución inicial estaba por 5 meses, pero con los ajustes de procedimientos solicitados por el municipio de Madrid, el plazo actual de ejecución es de 7 meses.

El proceso constructivo fue enviado a FINDETER el 22 de enero de 2025.

Valor de las obras: \$5.173.862.016

Presupuesto actual: 1.500.000.000 aproximadamente con lo cual se necesita una adición de 4.600 millones de pesos.

Para avanzar en el tema se solicita a EPC SA ESP coordinar reunión con el municipio de Madrid.

Jarillón: en construcción de placa huella en una longitud de 350 mts

Bojacá: en proceso de reemplazo de pavimento, totalidad de tubería instalada

Tanque de Bojacá: sin acceso por condiciones de vías, se va a solicitar al municipio la autorización para disponer materiales de escombros y mejorar las condiciones de ingreso.

Chircal: se siguen ejecutando pruebas en un tramo faltante de 0.54 km

Cámara de Quiebre: termina la 1, en la 2, 3 y 5, falta la conexión del desagüe, en la 4 ya se terminaron las obras.

Anatolí: la comunidad no deja terminar pruebas en un tramo de 600 mts por lo cual el 27 de enero se realizará reunión con comunidad para ver alternativas de trabajo.

Altogrande ya se terminaron obras

Doima: viaducto ejecutado por DEVISAB sigue sin ser entregado a lo cual se le solicita a EPC SA ESP coordinar reunión para que se proceda con la entrega y así el contratista pueda ejecutar sus obras.

El viaducto responsabilidad del contratista se encuentra en ejecución la cimentación de los caisson.


Para el sector de Doima pavimentado interventoría indica que hoy remite el presupuesto final en el cual se necesitan 2.600 millones adicionales para la ejecución de acuerdo a exigencias del ICCU

Sector Florián: terminado

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión INVIAS	EPC	07/02/2025
2	Reunión ICCU	EPC	10/02/2025
3	Reunión Madrid	EPC	10/02/2025
4	Remisión soporte respaldo financiero mayor permanencia interventoría	EPC y municipios	07/02/2025


FIRMAS: se adjunta acta de firmas de participantes del comité y registro fotográfico

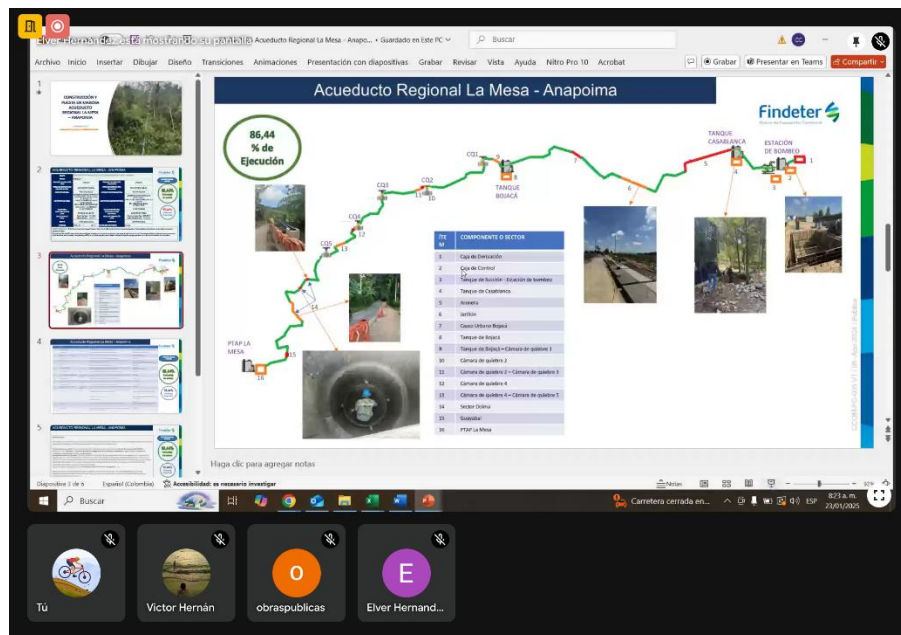



Vivienda

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

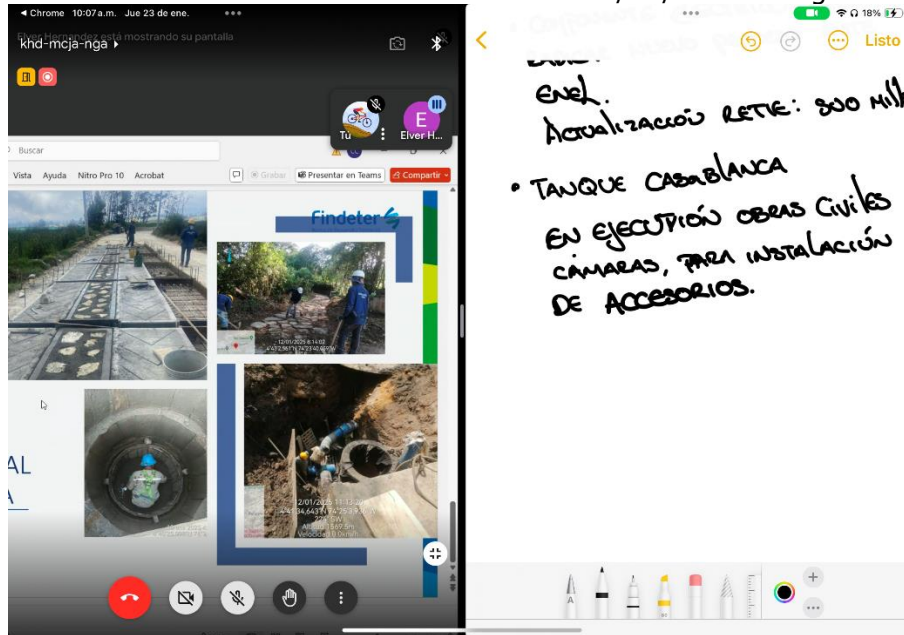

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora

Revisó:

Fecha: 238/01/2025
