

ACTA MESA DE SEGUIMIENTO.

DATOS GENERALES

FECHA:	Yarumal, Antioquia, 24 de febrero de 2025
HORA:	De 8:00 Am a 9:30 Am
LUGAR:	Virtual

ORDEN DEL DIA:

1. Temas.
2. Compromisos.

DESARROLLO:

Findeter informa que de acuerdo al cronograma establecido el día 4 de diciembre de 2024 se entregó la estructuración de la reformulación la cual fue observada por parte del equipo hidráulico de Findeter por la utilización de algunos accesorios que deben ser evaluados, razón por la cual se decidió volver a suspender por dos meses más hasta el 5 de marzo de 2025. Durante estos dos meses se debe presentar los precios no previstos a la interventoría para su revisión y aprobación, presentar los ajustes solicitados por parte de Findeter y en fin presentar toda la documentación requerida para la aprobación de la reformulación.


Se espera dar inicio a las obras en el mes de marzo de 2025 de la misma. No se inician obras hasta tanto la tubería no se encuentre en obra con el objeto de no dar inicio al contrato de interventoría dado que después ese tiempo va hacer falta y sería necesario prorrogar el contrato de interventoría lo cual generaría mayores costos al proyecto.

El tramo inicial contempla un tramo de aproximadamente de 5,6 km de tubería de 14 pulgadas lo cual se programa instalar en un plazo de más o menos seis (6) meses y en paralelo presentar la reformulación.

Se anexa evidencia de mesa de trabajo:



Vivienda

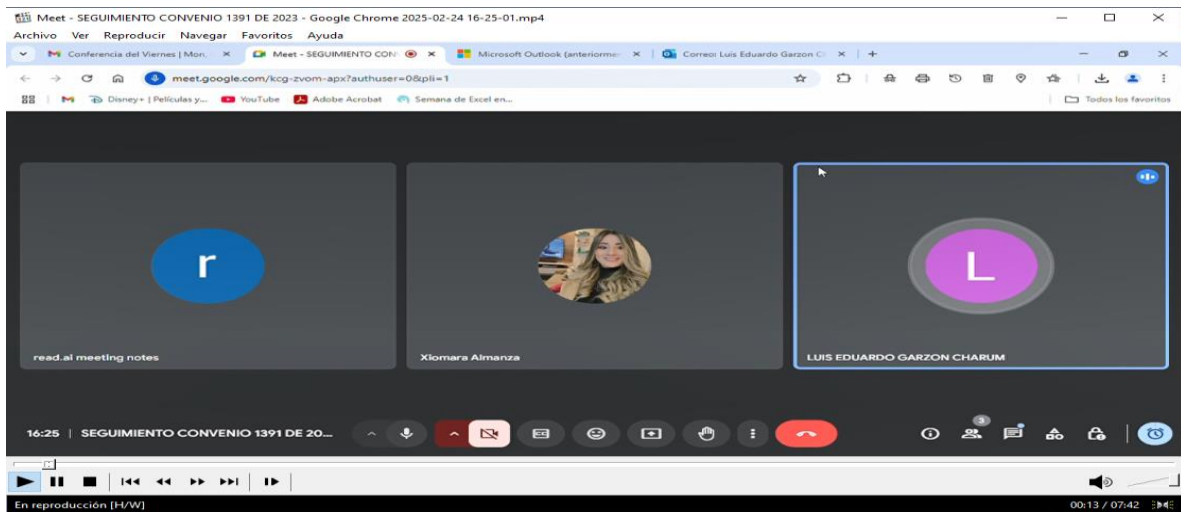

FIRMA:

LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum apoyo a la supervisión del ministerio.
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum
Fecha: 24-02-2025.
