



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de Febrero de 2025
HORA:	De 11:30 am a 12:10 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">1. Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisión2. Contratos Derivados Naren Ortíz- Auxiliar de Residente de Interventoría Lennin Cuello- Consorcio Acueducto San Antero3. AQUALIA Ana Vellojin Argel – Apoyo a la supervisión4. Alcaldía Municipio de San Antero. Angelica Díaz – Secretaria de Infraestructura.5. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al Convenio CUR 1007-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.

1. Avance de Obra-PDA- Interventoría
2. Gestiones frente a predio - Alcaldía Municipal
3. Permiso Intervención
4. Revisión de compromisos establecidos previamente en mesa de seguimiento
5. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Avance de Obra-PDA- Interventoría

Interventoría informa que el avance ejecutado a la fecha es de 65.55% respecto a un porcentaje planeado de 73.10%. Asimismo se indica que con la prórroga generada a



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

los contratos derivados hasta el 08 de abril de 2025, conforme a la fecha de finalización del convenio, para culminar el alcance contractual se requiere prorrogar el convenio, solicitud que fue radicada en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Por otra parte, interventoría indica que avanza la ejecución en la zona de la PTAP Tijeretas con trabajos en los floculadores, asimismo se realiza la instalación de la tubería de conducción y los cruces sin zanja requeridos y se adelantan trabajos en la captación con la construcción del cárcamo para la instalación de acometidas.

Interventoría informa que de los tres cruces faltantes por realizar, el que se requiere en la zona de la glorieta cuya infraestructura es administrada por la ANI, al respecto el municipio informa que el permiso ya se encuentra en trámite del cual se recibieron observaciones el 20 de febrero de 2025 y está en proceso de subsanación.

Los anteriores reportes de actividades ejecutadas son soportados mediante registro fotográfico que proyectó la interventoría.

Gestiones predio aledaño a la captación: secretaria de infraestructura informa que se notificó al contratista de obra e interventoría indicando que existe legalidad sobre la servidumbre existente y que por tanto pueden iniciar las intervenciones; no obstante, es requerido que el contratista notifique la programación de obra para poder realizar el acompañamiento requerido.

Interventoría aclara que en las cuatro veces que se ha realizado intentos para ingresar al predio el propietario no lo ha permitido; por tanto es necesario que la Alcaldía de San Antero haga el acompañamiento de ingreso a fin de que se tenga el respaldo de las gestiones adelantadas. Por lo anterior se programa adelantar el ingreso al predio con el respectivo acompañamiento para el 25 de febrero de 2025 en horario 07:00 am.

Se programa mesa técnica de seguimiento para el 28 de febrero de 2025.

2 Compromisos


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acompañamiento de la alcaldía de San Antero para ingreso al predio.	Alcaldía de San Antero	25/Febrero/2025
2	Programar mesa técnica de seguimiento	MVCT	28/Febrero/2025 11:00 am



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Link soporte de la mesa técnica de seguimiento: [CUR 1007-2020 Mesa Técnica de Seguimiento San Antero-20250221_112430-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:

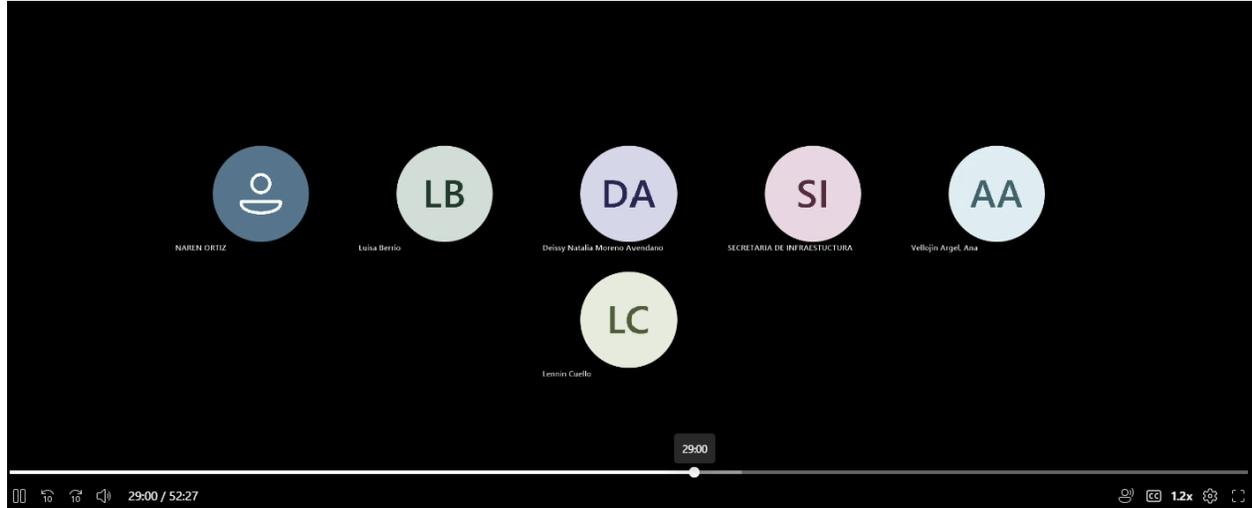

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 24 de febrero de 2025
