

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de febrero de 2025
HORA:	De 11:00 am a 11:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisión 2. Contratos Derivados Naren Ortiz- Auxiliar de Residente de Interventoría Lennin Cuello- Consorcio Acueducto San Antero 3. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al Convenio CUR 1007-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.

1. Avance de Obra-PDA- Interventoría
2. Revisión de compromisos establecidos previamente en mesa de seguimiento
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Avance de Obra-PDA- Interventoría

Interventoría informa que el avance ejecutado a la fecha es de 66.10% a corte del 24 de febrero respecto a un porcentaje planeado de 76.35%, por lo que se tiene un retraso del 10,25%. Se especifica que se tienen cuatro frentes de trabajo en captación, línea de aducción, en la planta y en la línea de conducción de 6" desde la planta hasta el porvenir.

Desde la interventoría ratifica los porcentajes relacionados anteriormente teniendo en cuenta que la fecha de finalización es el 8 de abril de 2025.

Así mismo, se especifica que en captación se tiene la construcción de la caseta de transferencias, la placa de la planta de energía y actualmente se ejecuta las excavaciones para la caja de registros de la tubería eléctrica

Interventoría informa que referente a la instalación de las bombas en captación, según el plan de trabajo se espera que para mediados de abril lleguen los equipos para realizar su respectiva instalación; se señala que la planta no puede parar por lo que se realizará un cronograma de instalación empezando por las dos bombas que no están en funcionamiento actualmente de modo que se ejecuten las actividades de manera paralela.

Así mismo, se indica que en el segundo frente en la línea de captación y la planta se está desarrollando la instalación de accesorios de la tubería, se aclara que en el paso de Lórica hacen faltan dos tramos, el primero en la finca (que no se ha generado el ingreso) de 320 m. y el segundo de la tubería de 16" y 12.5" desde la protección del talud hasta donde inicia el restaurante tres sabores, que corresponden a 400 m, para culminar la línea del paso de Lórica. También falta la construcción de la cámara de quiebre de los dos cruces especiales que permita culminar la instalación de dicha tubería. En planta se tiene intervenida la pasarela principal del floculador 1 y 2, la obra civil se encuentra en un avance del 98%, faltando algunos suministros y sedimentadores para entregar al tren a Aqualia y que se efectúen las respectivas pruebas. En la línea de planta a San Antero se está adelantando la instalación de tubería de 6", faltan 200 m. para alcanzar el cruce, se espera que para la próxima semana se genere la instalación de tubería, por lo que restaría la instalación de válvulas ventosas y purgas.

Se presenta el plano terminado, señalando los puntos mencionados anteriormente para tener claridad de la ubicación de los mismos, especificando que la tubería mostrada en verde representa que se encuentra instalada y se ha realizado la respectiva prueba, en rojo la tubería faltante y en naranja la tubería instalada sin pruebas.

Frente a lo que corresponde a planta, falta 70 m de tubería que salen de la misma y dos cruces de tanque el silencio hasta el paso realizado que son aproximadamente 250 m. y el otro es el cruce de la estación de servicio de combustible y la llegada al tanque.

Con respecto al frente de abra del tanque al porvenir esta pendiente la salida de 10" del tanque hasta el macromedidor.

Se relaciona que desde la PTAP al tanque Patagonia se puede probar tubería y el tanque, por lo que se solicitó a Aqualia el cargue completo para validar posibles

filtraciones y asentamientos. Según cronograma de obra se tienen previstas estas actividades la próxima semana, se iniciará con el tramo de tanque Patagonia a Porvenir según lo señalado por el representante del consorcio, para lo cual se abrirá un nuevo frente de obra, adicionalmente señala que para la próxima semana se estará realizando la instalación de tubería del paso de captación.

2. Revisión de compromisos establecidos previamente en mesa de seguimiento

Se señala por el representante del consorcio, que el propietario de la finca no permitió el acceso, sin embargo, se indica que ya se adelantó concertación y se iniciarán actividades la semana próxima.

Desde MVCT se reitera la importancia y precaución en la instalación de la tubería del tramo de la finca evitando que posteriormente se tenga que acceder seguido a realizar reparaciones dado las implicaciones de acceso que se han tenido. Así mismo se especifica que la próxima semana se tramitará ante contratos la prórroga del contrato.

Desde la interventoría se especifica que se requirió a Aqualia las pólizas, sin embargo, no se ha realizado la entrega de los otrosíes.

Se programa mesa técnica de seguimiento para el jueves 13 de marzo de 2025.

3. Compromisos


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Tramitar ante contratos la prórroga del contrato.	MVCT	7/marzo/2025
2	Confirmar la entrega de pólizas y otrosíes por parte de Aqualia	Interventoría	13/marzo/2025
3	Se deben iniciar pruebas en tanque y tubería	Contratista de Obra	Marzo /2025
4	Programar mesa técnica de seguimiento	MVCT	13/marzo/2025 10:00 am

Link soporte de la mesa técnica de seguimiento:

[CUR 1007-2020 Mesa Técnica de Seguimiento San Antero-20250228 111947-Grabación de la reunión.mp4](#)

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

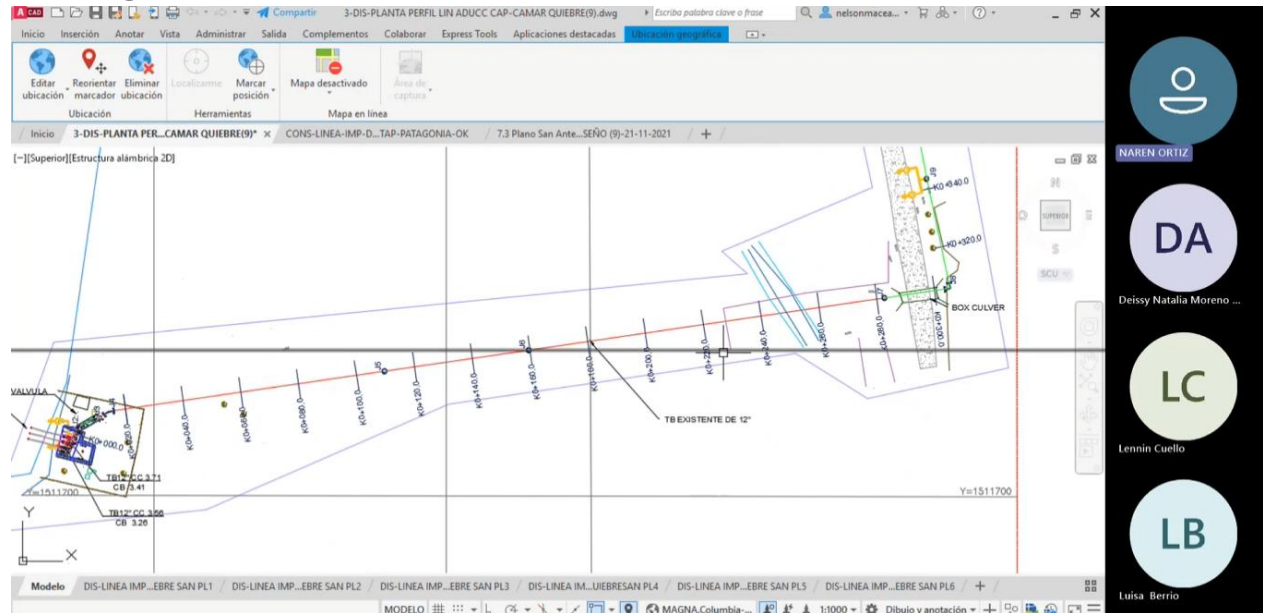

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT
 Revisó: -
 Fecha: 03 de marzo de 2025
