



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01-2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25 de febrero de 2025
HORA:	De 2:30 pm – 3:15 am horas
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Juan Carlos Paredes – Supervisor / Findeter Angie Martínez Pérez – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista MVCT
INVITADOS:	Juan Carlos Paredes – Supervisor / Findeter Angie Martínez Pérez – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Tema 1: Seguimiento proyecto.

DESARROLLO:

- Se presenta la siguiente información del proyecto:

OBJETO REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, LA PUESTA EN MARCHA E INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN RED DE ACUEDUCTO TANQUES CHARRASQUERO Y II Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN VÍA NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.

ESTADO GIRARDOT ACUEDUCTO ETAPA II = EN EJECUCION.

FECHA DE INICIO (Obra) 15/01/2025

FECHA DE INICIO (interventoría) 15/01/2025

FORMA DE CONTRATACIÓN Obra: Directa Interventoría: Directa



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

CONTRATO DE OBRA: PAF-ATF-O-130-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PAF-ATF-I-125-2024

CONTRATISTA DE OBRA: ELECTROHIDRAULICA S.A. REPRESENTACIONES
R.L. Oscar Gabriel Garcia Gómez

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO M & Y R.L. Yeris
Alexander Abadía Méndez

VALOR OBRA: \$ 523.718.311, 00

VALOR INTERVENTORÍA: \$178.000.000

PAGOS REALIZADOS (Obra) \$ 0.00

PAGOS REALIZADOS Interventoría: \$ 0.00

FECHA DE TERMINACION (Obra): 15/05/2025

FECHA DE TERMINACIÓN (Interventoría) 15/06/2025

GESTOR: Reinaldo Galvis Londoño

SUPERVISOR: Juan Carlos Paredes Hernández

AVANCE PROGRAMADO: 43,38%

AVANCE EJECUTADO: 37,17%

- Desde el 15/01/2025 se vienen ejecutando las actividades de obra en los componentes del proyecto en cuanto a:
 - El componente mecánico con el desmonte y retiro de las tres (3) unidades de bombas de impulsión las cuales se encuentran en alistamiento.
 - Respecto del componente eléctrico se está llevando a cabo el comisionamiento y puesta en marcha de la celta de media tensión, así mismo la revisión al transformador instalado, así mismo se trabaja en el



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
acondicionamiento de señales de control para la puesta a punto de las
señales para la automatización del sistema de bombeo.


- El atraso se presenta en la cuantificación del componente mecánico que se encuentra en curso.
- Se realizó visita el 15 de enero de 2025 para el inicio de las obras, que contó con la asistencia del ACUAGIR, Municipio y Findeter.
- Ya se cuenta con la orden de compra de los dos compresores para el sistema hidroneumático
- Se iniciaron las actividades de limpieza del tanque de almacenamiento
- Se realizan comités de seguimiento periódicos entre supervisión de Findeter, contratista de obra e interventoría.
- A la fecha se reporta una ejecución normal sin inconvenientes.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega informe mensuales	Findeter	

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

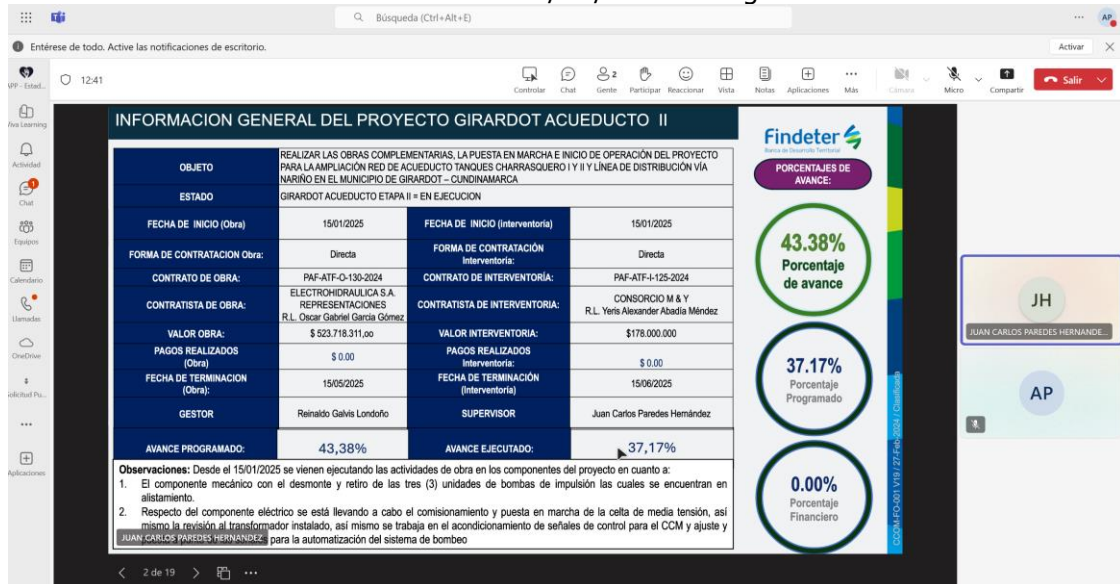

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO GIRARDOT ACUEDUCTO II

OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, LA PUESTA EN MARCHA E INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN RED DE ACUEDUCTO TANQUES CHARRASQUERO I Y II Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN VÍA NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA		
ESTADO	GIRARDOT ACUEDUCTO ETAPA II = EN EJECUCION		
FECHA DE INICIO (Obra)	15/01/2025	FECHA DE INICIO (Interventoría)	15/01/2025
FORMA DE CONTRATACIÓN Obra:	Directa	FORMA DE CONTRATACIÓN Interventoría:	Directa
CONTRATO DE OBRA:	PAF-ATF-Q-130-2024	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	PAF-ATF-I-125-2024
CONTRATISTA DE OBRA:	ELECTROHIDRAULICA S.A. REPRESENTACIONES R.L. Oscar Gabriel García Gómez	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO M & Y R.L. Yelis Alexander Abadía Méndez
VALOR OBRA:	\$ 523.718.311,00	VALOR INTERVENTORIA:	\$178.000.000
PAGOS REALIZADOS (Obra)	\$ 0.00	PAGOS REALIZADOS Interventoría:	\$ 0.00
FECHA DE TERMINACION (Obra):	15/05/2025	FECHA DE TERMINACIÓN (Interventoría)	15/06/2025
GESTOR	Reinaldo Galvis Londoño	SUPERVISOR	Juan Carlos Paredes Hernández
AVANCE PROGRAMADO:	43,38%	AVANCE EJECUTADO:	37,17%

Observaciones: Desde el 15/01/2025 se vienen ejecutando las actividades de obra en los componentes del proyecto en cuanto a:

1. El componente mecánico con el desmonte y retiro de las tres (3) unidades de bombas de impulsión las cuales se encuentran en alistamiento.
2. Respecto del componente eléctrico se está llevando a cabo el comisionamiento y puesta en marcha de la celda de media tensión, así mismo la revisión al transformador instalado, así mismo se trabaja en el acondicionamiento de señales de control para el CCM y ajuste y JUAN CARLOS PAREDES HERNANDEZ para la automatización del sistema de bombeo

Porcentajes de Avance:

- 43.38%** Porcentaje de avance
- 37.17%** Porcentaje Programado
- 0.00%** Porcentaje Financiero



INVENTORIA CONSORCIO M&Y

REGISTRO FOTOGRÁFICO

El contratista realiza el mantenimiento del puente grúa existente en la unidad con el fin de garantizar la finalización de la actividad de desmonte y traslado de unidades de bombeo y poder realizar el debido mantenimiento a la mencionadas anteriormente.




Mantenimiento de puente grúa

JUAN CARLOS PAREDES HERNANDEZ


ANGIE MARTÍNEZ PÉREZ
 Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Angie Martínez Pérez
 Revisó: Oscar Iván López Rodríguez
 Fecha: 25 de febrero de 2025
