



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de marzo de 2025
HORA:	De 11:00 am a 11:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">1. Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisión2. Contratos Derivados Naren Ortíz- Auxiliar de Residente de Interventoría3. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño - Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al Convenio CUR 1007-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.

1. Avance de Obra
2. Reporte estado de avance del cronograma
3. Permiso Intervención ANI
4. Prórroga Convenio
5. Pruebas

DESARROLLO:

- 1.** Avance de Obra
- 2.** Reporte estado de avance del cronograma



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Interventoría informa que a corte del 24 de marzo se cuenta con un avance del 77.5% resaltando que los equipos de bombeo para la zona de captación ya se encuentran en el área del proyecto, las bombas de lodos están siendo transportadas al proyecto y las bombas impulsadoras desde la captación hasta la plata tijeretas se tiene programado que lleguen el 11 de abril de 2025 al proyecto, por lo que para esta fecha ya se contarían con las 9 bombas para la respectiva instalación.

Interventoría informa se avanza en tres frentes de trabajo:

- i). Zona de captación, se cuentan con los suministros de bombas y elementos electromecánicos, a la espera de maniobras eléctricas y de coordinación con Aqualia para realizar las instalaciones y conexiones, así mismo se encuentra pendiente el suministro e instalación de gabinetes de control;
- ii). Línea de conducción desde la zona de captación hasta la PTAP Tijeretas, se adelanta la instalación y anclaje de accesorios, se culminó la instalación de tubería en el predio aledaño a la captación, la cual tenía una longitud de 320 m y por tanto se cerró la gestión con el propietario, y
- iii). Línea de conducción desde la PTATP Tijeretas hasta el tanque Patagonia se adelanta el replanteo para la instalación válvulas de purga y ventosas, de modo que a finales de abril se tenga el 100% de este tramo y permita el inicio de pruebas.

En relación con las actividades en la PTAP Tijeretas, se está a la espera de la instalación de los sedimentadores tipo colmena. Para ello, se está finalizando la instalación de los filtros y se debe proceder con el llenado de la sección, ya que los sedimentadores necesitan instalarse con agua. Esto permitirá realizar la entrega para operación el 5 de abril de 2025, momento a partir del cual se podrán efectuar las pruebas necesarias. Posteriormente, Aqualia podrá habilitar el segundo tren para su intervención, a partir del 21 de abril de 2025. Esta programación es clave, dado que, debido a la demanda de consumo, es necesario cumplir con la capacidad requerida durante la Semana Santa, conforme a los compromisos adquiridos con la comunidad.

3. Permiso Intervención ANI

Municipio que adelanta el trámite de solicitud no se conectó a la mesa técnica de seguimiento, se requerirá de manera formal.

4. Pólizas contratos derivados

Interventor informa que las pólizas tanto del contrato de Interventoría como del contrato de obra se encuentran remitidas a Aqualia.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

5. Prórroga Convenio

MVCT indica el trámite de prórroga se encuentra en el área de Contratos, y se solicita que una vez se remita sea firmado con celeridad por las partes.

Se programa mesa técnica de seguimiento para el jueves 10 de abril de 2025.

6. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir trazabilidad como parte de la solicitud del permiso de intervención.	Alcaldía Municipal	13/marzo/2025
2	Allegar los informes mensuales de ejecución al Municipio	PDA	13/marzo/2025
3	Entrega de primera sección de la PTAP a operador Aqualia para intervención.	Contratista de Obra/Ejecutor	05/Abril/2025
3	Allegar registro fotográfico mediante SIGEVAS. (Frecuencia Semanal).	PDA	04/Abril/2025
4	Programar mesa técnica de seguimiento	MVCT	10/Abril/2025 11:00 am

Link soporte de la mesa técnica de seguimiento:

[CUR 1007-2020 Mesa Técnica de Seguimiento San Antero-20250327 110426-Grabación de la reunión.mp4](#)




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

CUR 1007-2020 Mesa Técnica de Seguimiento San Antero

27 mar 2025 11:00 - 11:30

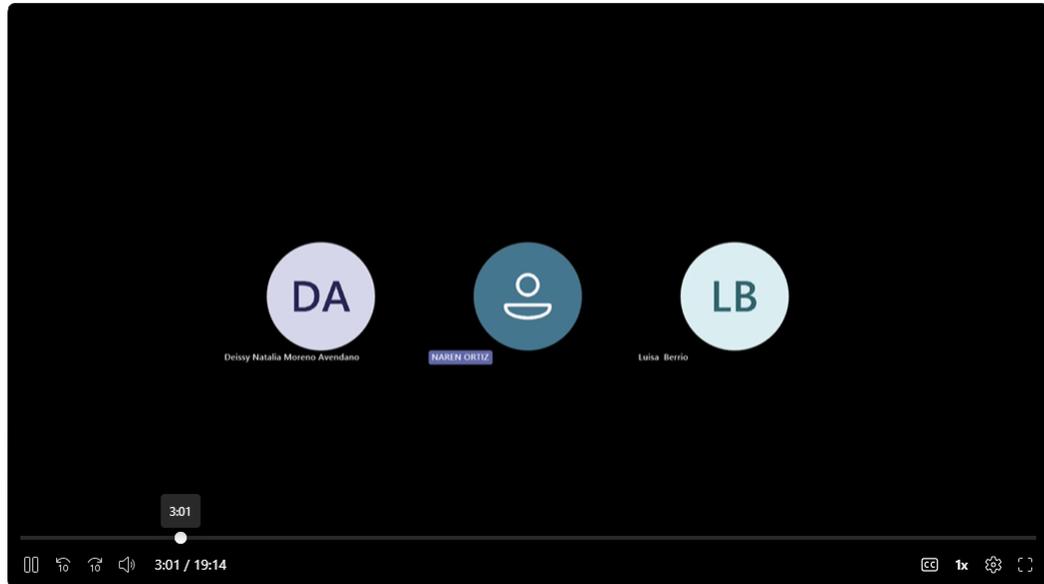

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT- Apoyo a la Supervisión

Revisó: Luisa Berrio- Apoyo a la Supervisión Ejecutor- PDA

Fecha: 31 de marzo de 2025
