



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de marzo de 2025
HORA:	De 10:00 am a 10:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">1. FINDETER: José David Tatis Aguas – Supervisor del proyecto entidad ejecutora2. Municipio de Planeta Rica: Miguel Marín – Profesional ambiental de la secretaria de Infraestructura y Planeación3. Contratos derivados Andrés Velandia – Director de Interventoría4. MVCT: Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al proyecto Convenio D318-2018 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II – CÓRDOBA.

1. Estado de contratos, porcentajes de avance de obra y actividades en curso
2. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Estado de contratos, porcentajes de avance de obra y actividades en curso



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Supervisor FINDETER, informa que actualmente los contratos se encuentran en ejecución, con fecha de terminación actual de 20 de marzo de 2025 de acuerdo con la última prórroga, el avance físico es de 96% frente al 99% programado, con corte al 16 de marzo de 2025. El avance financiero del proyecto respecto a los pagos adelantados a los contratos derivados es del 88.86%.

Se informa que los 4 filtros están culminados, de los cuales 3 se encuentran conectados y por tanto se han adelantado las respectivas pruebas, el filtro restante se conectará dentro del término contractual, resaltando que los filtros no serán operativos hasta tanto se haga traslado de los equipos de bombeo. Asimismo, en la caseta de bombas se instaló el puente grúa el cual fue probado mediante de generador de energía, teniendo en cuenta que cuando el operador realice la intervención deberá también realizar la energización de los equipos de control.

FINDETER informa que el contratista está verificando las actividades requeridas para realizar maniobra de llenado del tanque elevado y hacer la prueba de carga en la tubería de la línea de impulsión.

Desde FINDETER se solicita al Municipio iniciar las gestiones para garantizar por parte del operador el traslado de los equipos de bombeo y generar las adecuaciones en el componente eléctrico para poner en operación la infraestructura construida. Al respecto delegado del Municipio solicita que el ejecutor eleve la solicitud de manera formal para iniciar el trámite respectivo.

MVCT solicita iniciar la consolidación de información que permita realizar el acta de entrega y recibo a satisfacción por parte del Municipio, información que deberá incluir los planos récord, manuales de operación, certificados de calidad, relación de resultados de pruebas, entre otros.

2 . Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitud al municipio de iniciar gestiones con operador Aqualia.	FINDETER	20/marzo/2025
2	Entrega de información para recibo por parte del Municipio	FINDETER	


Link de reunión:

[Convenio D318-2018 Planeta Rica- Mesa Técnica de Seguimiento-20250319_100408-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

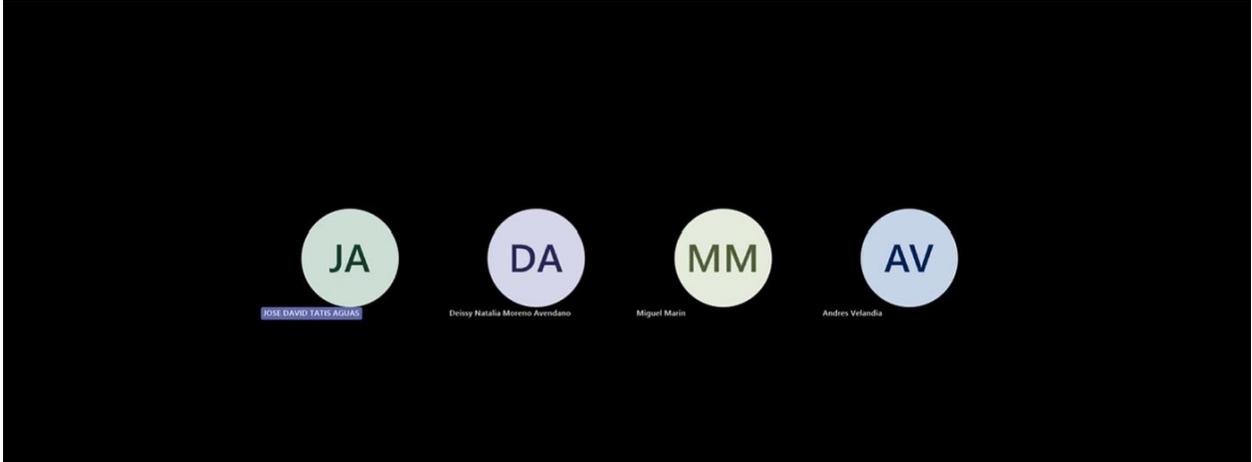

Elaboró: Deissy Natalia Moreno – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 25 de marzo de 2025
