



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de marzo de 2025
HORA:	De 11:00 p.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia Juan Carlos Castaño, Supervisor de Proyectos – EDESO. Veracruz Mosquera, Supervisora administración municipal Rionegro. Luisa Fernanda Duque, Apoyo a la Supervisión – EDESO. Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los convenios

- CUR 800 de 2022 - Vigencia 22 mayo 2025 (Suspendido)
- CUR 802 de 2022 - Vigencia 29 de mayo de 2025.
- CUR 1082 de 2022 - En liquidación del convenio (10 de febrero 2025)

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza a los Convenios Interadministrativos de Uso de Recursos Nos. 800, 802, y 1082 de 2022, se realizó reunión virtual, la cual contó con la participación de administración municipal de Rionegro, la EDESO y el MVCT, y en la que se analizó el estado de cada proyecto y las necesidades y soluciones planteadas.

1. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

La EDESO informó que los indicadores continúan en los mismos valores.

- Avance físico programado 98 % Suspendido 10 de septiembre 2024
- Avance físico ejecutado 92.21 %
- Avance financiero programado 98.0 %
- Avance financiero ejecutado 92.00 %

Por otra parte la EDESO informó sobre la trazabilidad de las gestiones realizadas por las entidades con respecto a la solución de las filtraciones de la tubería paralela al caño del sector bajo de Rincon Santo y que continúan pendientes.

- Complementación de la información por parte de EDESO, con el concepto sobre el informe presentado por la Interventoría con datos de lo ocurrido en la fecha de instalación de la tubería. Se determinó una nueva fecha para remitir al municipio la información para el miércoles 26 de marzo de 2025.
- Informe formal del consultor SANEAR con los soportes planos y demás documentación que soporten la solución al imprevisto en la red. Se avanza el análisis solución a través de pilotes y concepto de la geotecnia que se aplaza para el 28 de marzo de 2025, fecha en la que se entregarán las memorias de cálculo de la geotecnia.
- Justificación de la Reformulación del proyecto soportada en la solicitud del contratista de obra, la aprobación de esta por parte de la interventoría, la validación y solicitud de reformulación de EDESO y del municipio de Rionegro. Se comprometieron radicarla 11 de abril de 2025.
- Presupuesto para las obras e interventoría y su certificación de disponibilidad del recurso que será aportado por el Municipio. El contratista entregó incompleto el presupuesto el 17 de marzo de marzo de 2025, la interventoría lo está revisando. la EDESO remitirá el 31 de marzo de 2025 al municipio de Rionegro para iniciar el trámite de consecución de recursos.
- Gestion para la obtención de recursos por parte del municipio de Rionegro para el pago de obra e interventoría, acorde al presupuesto por definir.

El MVCT reiteró a EDESO y al Ente Territorial que acorde con la evaluación de la solución planteada hasta hoy para solucionar las filtraciones en 268 ml., se dé celeridad a la gestión ya que han transcurrido cuatro meses en solucionar la situación a la fecha no se tiene, atrasando la entrega del proyecto que tiene un avance físico del 92.21 % del alcance reformulado.

De otra parte el Ministerio solicitó a la EDESO se informara sobre el estado de las observaciones al proyecto, y se actualizó como se relaciona a continuación.

Estación de Bombeo de Aguas Residuales

- | | |
|--|------------|
| - Protección tubería paso elevado y estabilización talud. | Pendiente. |
| - Pruebas de equipos de bombeo pruebas, pasamanos. | Pendientes |
| - Empradización parcial EBAR | Pendiente |
| - Certificado de aprobación obras eléctricas del Proyecto EPM. | Pendiente |
| - Canal de entrada: Instalación barandas, pasamanos, rejillas, | |

- | | |
|---|-----------|
| vertedero triangular. | Pendiente |
| - Canales diente de sierra en tanque sedimentación secundaria | Pendiente |
| - Instalación equipo de dosificación de cloro. | Pendiente |
| - Planos récord y manual de operación. | Pendiente |

El MVCT reiteró a EDESOS y al Municipio dar celeridad a la estructuración de la reformulación No. 2 del proyecto.

2. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Estado de la contratación derivada: Suspendida desde el 11 de octubre de 2024, en liquidación contratación derivada.

Convenió: Se prorrogó hasta el 29 de mayo de 2024.

La EDESOS informó que los indicadores de avance de las obras son los siguientes al 11 de octubre de 2024 fechas en las que se suspendieron los contratos de obra e interventoría:

- | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------|
| • Avance físico programado | 100 % | |
| • Avance físico ejecutado | 73.94 % | 11 de octubre 2024 14% |
| • Avance financiero ejecutado | 71.74 % | |
| • Avance financiero programado | 71.74 % | |

El Ministerio solicitó a EDESOS información sobre la gestión y avance en las actividades realizadas las cuales se relacionan a continuación:

Procesos de presunto incumplimiento del Contratista de obra: EDESOS informó que se comunicó a la Aseguradora Solidaria de Colombia (póliza 520-47-9940000452369), a través del área jurídica de la Empresa y que continua pendiente el informe de la interventoría que indique las obras que se pueden recibir y cumplan con las especificaciones, evaluación de los perjuicios causado por el contratista y la devolución del anticipo que se no se amortizó.

Así mismo, EDESOS en su área jurídica continua las actividades para producir el acto administrativo que declara el presunto incumplimiento del contrato de obra.

De otra parte el Ministerio solicitó a EDESOS que se actualizara los datos y la información contractual del proyecto en la Plataforma SIGEVAS, cargando los documentos que a continuación se relacionan.

- Copia de modificaciones contractuales de los contratos obra e interventoría, actividades de preoperacionales, contratación de personal, alquiler de equipo, contratos de suministro de materiales, (29 de enero al 13 de febrero de 2025).
- Ejecución de las obras No se cumplió.
- Conclusiones de las reuniones de seguimiento preventivo con la Contraloría General de la Republica.
- Copia modificaciones contractuales de la contratación derivada.
- Copia de la garantía única actualizada que ampara el buen manejo de anticipo, el cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la responsabilidad extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales.
- Copia de las actas de reuniones de obra o interinstitucionales, comunicaciones con el contratista de obra y la interventoría.

El Municipio por su parte informó que con respecto al informe de la investigación que se realizó con el equipo robótico y CCTV remitió a EDESO el análisis y la evaluación de los tramos investigados, con las observaciones respectivos con el fin de que se tengan en cuenta en la liquidación del contrato de obra.

EDESO informó que la interventoría entregará el informe final el 31 de marzo de 2025, y luego del análisis del documento la entidad dará inicio al acto administrativo de incumplimiento al contrato de obra a partir del 10 de abril de 2025. Se estima que alrededor del 30 de mayo de 2025 se dé respuesta a los recursos de reposición.

En cuanto a la gestión adelantada ante la aseguradora se informó por parte de esta el contratista de obra los rindió el 20 de marzo de 2025.

Dado lo anterior EDESO remitirá al Ministerio el 4 de abril de 2025 la solicitud de suspensión del Convenio hasta que resuelva y liquide la contratación derivada y se realice una nueva contratación de las obras pendientes.

3. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

Indicadores de avance: Continúan sin modificación dado que se continua con la liquidación de los contratos derivados de obra e interventoría.

- | | |
|-------------------------------|--------|
| • Avance físico programado | 100 % |
| • Avance físico ejecutado | 100 % |
| • Avance financiero ejecutado | 89.4 % |

- Avance financiero programado 100 %

La EDESO informó sobre el avance en la rectificación y corrección de observaciones y se relacionan a continuación los pendientes:

- Aprobación RETIE operador servicio de suministro de energía EPM Pendiente
- Conexiones domiciliarias operador: La administración municipal informó que se encuentra contratando el operador del proyecto el cual firmaría acta de inicio el próximo 25 de marzo de 2025. Pendiente
- Liquidaciones contratos derivados. Nueva fecha 21 marzo 2025 Pendiente
- Actualización Sigevas. Pendiente

La administración municipal de Rionegro manifestó que la operación y mantenimiento continúa realizándola a través de EDESO.

Al respecto el Ministerio reiteró que el plazo para la liquidación del Convenio 1082 de 2022, venció el 10 de febrero de 2024, por lo que están en mora de remitir la documentación.

Por otra parte el Ministerio recordó que el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción del proyecto por parte del Municipio debe ser suscrita por el alcalde y el Gerente de EDESO.


COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
Convenio CUR 800 de 2022			
1	Complemento del concepto de EDESO a Informe de la Interventoría Filtraciones.	EDESO	28/02/2025 21/03/2025 28/03/2025
2	Respuesta formal del diseñador al municipio de Rionegro sobre la solución a las filtraciones.	SANEAR	28/12/2024 25/03/2025
3	Radicación de solicitud de prórroga de la suspensión 1 del convenio.	EDESO M. Rionegro	Cumplido
4	Definición del presupuesto para as obras complementarias o adicionales	EDESO M. Rionegro	17/03/2025
5	Gestion para expedición CDP que respalde recursos para el cierre financiero de la solicitud de reformulación No. 2.	Municipio de. Rionegro	10/04/2025
6	Radicación solicitud de Reformulación No. 2 del proyecto	EDESO M. Rionegro	10/04/2025

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

	Convenio CUR 802 de 2022		
5	Radicación de documentación del proyecto solicitada en la presente reunion. Rta Oficio	EDES0	11/03/2025 Cumplido
6	Plan de Acción para desarrollo del proyecto	EDES0	11/03/2025 Cumplido
	Convenio CUR 1082 de 2022		
7	Inicio de operación de obras sector al YEE	M. Rionegro	25/03/ 2025
8	Liquidación contratación derivada obra e Interventoria	EDES0	15/03/2025 21/03/2025
9	Liquidación Convenio	EDES0- M Rionegro	Pendiente

Anexo: Asistencia a la reunión
 Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
 Fecha: 21/03/2025.

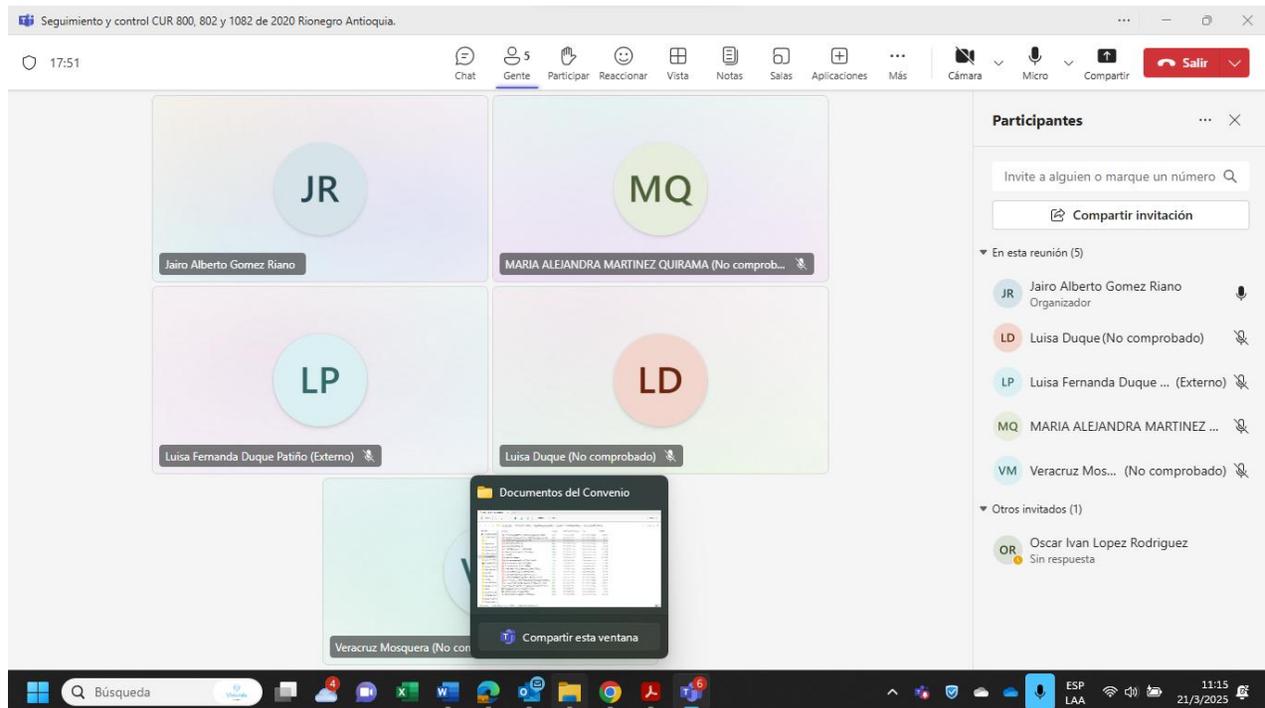



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento y control CUR 800, 802 y 1082 de 2020 Rionegro Antioquia.

46:04

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- LD Luisa Duque (No comprobado)
- LP Luisa Fernanda Duque ... (Externo)
- MQ MARIA ALEJANDRA MARTINEZ ...
- VM Veracruz Mos... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

Búsqueda

ESP LAA 11:43 21/3/2025
