



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	4 de abril de 2025
HORA:	De 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia Juan Carlos Castaño, Supervisor de Proyectos – EDESO. Veracruz Mosquera, Supervisora administración municipal Rionegro. Luisa Fernanda Duque, Apoyo a la Supervisión – EDESO. Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los convenios

- CUR 800 de 2022 - Vigencia 22 mayo 2025 (Suspendido)
- CUR 802 de 2022 - Vigencia 29 de mayo de 2025.
- CUR 1082 de 2022 - En liquidación del convenio (10 de febrero 2025)

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza a los Convenios Interadministrativos de Uso de Recursos Nos. 800, 802, y 1082 de 2022, se realizó reunión virtual, la cual contó con la participación de administración municipal de Rionegro, la EDESO y el MVCT, y en la que se analizó el estado de cada proyecto y las necesidades y soluciones planteadas.

1. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

La EDESO informó que los indicadores continúan en los mismos valores.

- Avance físico programado 98 % Suspendido 10 de septiembre 2024
- Avance físico ejecutado 93.50 %
- Avance financiero programado 98.0 %
- Avance financiero ejecutado 92.00 %

En desarrollo de la reunion se verificaron las fechas de los compromisos que se adquirieron en la reunion anterior encontrado lo siguiente:

- Complementación de la información por parte de EDESOS, con el concepto sobre el informe presentado por la Interventoría con datos de lo ocurrido en la fecha de instalación de la tubería.

La fecha del compromiso se aplazó dado que la interventoría no ha presentado el informe final del contrato de obra. La nueva fecha se aplazó para 7 de abril de 2025.

- Informe formal del consultor SANEAR con los soportes planos y demás documentación que soporten la solución al imprevisto en la red.

La fecha de entrega se aplazó el 4 de abril de 2024, habida cuenta que el informe debe complementarse con las memorias de cálculo

- Justificación de la Reformulación del proyecto soportada en la solicitud del contratista de obra, la aprobación de esta por parte de la interventoría, la validación y solicitud de reformulación de EDESOS y del municipio de Rionegro. Se comprometieron radicarla 11 de abril de 2025.

El no cumplimiento del compromiso se debe a que el presupuesto final solo se presentará por parte del contratista el 7 de abril de 2025. Con el valor definido se gestionará el CDP.

- Presupuesto para las obras e interventoría y su certificación de disponibilidad del recurso que será aportado por el Municipio.

Se aplazo la entrega para el 7 de abril de 2025.

El MVCT reiteró a EDESOS y al Ente Territorial que acorde con la evaluación de la solución planteada hasta hoy para solucionar las filtraciones en 268 ml., es necesario que EDESOS se utilicen las herramientas que tiene el contratos de obra en sus cláusulas decimo primera y décimo segunda, dado que se lleva 7 meses solucionando el problema presentado y aun no se cuenta con la totalidad de la documentación para solucionar el problema de desplazamiento de la tubería, atrasando la entrega del proyecto que tiene un avance físico del 92.21 % del alcance reformulado.

Por otra parte se verificaron las obras pendientes encontrando lo siguiente:

Estación de Bombeo de Aguas Residuales

- | | |
|---|------------|
| - Protección tubería paso elevado y estabilización talud. | Pendiente. |
| - Pruebas de equipos de bombeo pruebas, pasamanos. | Pendientes |

- | | |
|--|-----------|
| - Empradización parcial EBAR | Pendiente |
| - Certificado de aprobación obras eléctricas del Proyecto EPM. | Pendiente |
| - Canal de entrada: Instalación barandas, pasamanos, rejillas, vertedero triangular. | Pendiente |
| - Canales diente de sierra en tanque sedimentación secundaria | Pendiente |
| - Instalación equipo de dosificación de cloro. | Pendiente |
| - Planos récord y manual de operación. | Pendiente |

El MVCT reiteró a EDES0 y al Municipio dar celeridad a la estructuración de la reformulación No. 2 del proyecto.

2. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Estado de la contratación derivada: En liquidación del contrato de obra e interventoría por presunto incumplimiento del Contratista de Obras, que abandonó la obra.

Convenió: Se prorrogó hasta el 29 de mayo de 2024.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| • Avance físico programado | 100 % |
| • Avance físico ejecutado | 74.0 % 11 de octubre 2024 14% |
| • Avance financiero ejecutado | 71.74 % |
| • Avance financiero programado | 71.74 % |

EDES0 informó que continua pendiente el informe final de interventora, el cual evidenciara el presunto incumplimiento del Contratista de obra, del cual dependen las demás gestiones para iniciar el proceso de presunto incumplimiento del contrato de obra, como son informe de EDES0, gestión ante la aseguradora, Acto Administrativo para declarar el presunto incumplimiento del contrato de obra.

De otra parte el Ministerio solicitó a EDES0 que se actualizara los datos y la información contractual del proyecto en la Plataforma SIGEVAS, cargando los documentos que a continuación se relacionan.

- Conclusiones de las reuniones de seguimiento preventivo con la Contraloría General de la Republica.
- Copia de la garantía única actualizada que ampara el buen manejo de anticipo, el cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la responsabilidad extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales.
- Copia de las actas de reuniones de obra o interinstitucionales, comunicaciones con el contratista de obra y la interventoría.

Dado lo anterior EDES0 remitirá al Ministerio el 4 de abril de 2025 la solicitud de suspensión del Convenio hasta que resuelva y liquide la contratación derivada y se realice una nueva contratación de las obras pendientes.

3. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

Indicadores de avance: Continúan sin modificación dado que se continua con la liquidación de los contratos derivados de obra e interventoría.

- Avance físico programado 100 %
- Avance físico ejecutado 100 %
- Avance financiero ejecutado 89.4 %
- Avance financiero programado 100 %

La EDES0 informó que las actividades que se relaciona continuación continúan pendientes en su corrección entes:

- Aprobación RETIE operador servicio de suministro de energía EPM Pendiente

El contratista informó que le operador de suministro de energía EPM ESP, señaló que se va a repotenciar la red por lo que una vez realizada esta actividad se hará el trámite de la repuesta aprobación del RETIE.

- Conexión de intradomiciliarias les municipio s domiciliarias operador:

La administración municipal suscribió acta de inicio con la empresa Aguas de Rionegro que operará la infraestructura construida, y una de las primeras actividades será la de conectar la intradomiciliarias al proyecto.

- Liquidaciones contratos derivados.

EDES0 informó que la demora en la liquidación del contrato de obra se debe a que el contratista de obra concilia el pago de un impuesto local (Estampillas) que incluyo en el porcentaje de administración el cual no se pagará por parte del contratante.

Al respecto el Ministerio reiteró que el plazo para la liquidación del Convenio 1082 de 2022, venció el 10 de febrero de 2024, por lo que están en mora de remitir la documentación.

Por otra parte el Ministerio recordó que el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción del proyecto por parte del Municipio debe ser suscrita por el alcalde y el Gerente de EDESO, por lo que el Ministerio remitirá oficio para que se cumpla con este requisito.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
Convenio CUR 800 de 2022			
1	Complemento del concepto de EDESO a Informe de la Interventoria Filtraciones.	EDESO	28/02/2025 21/03/2025 28/03/2025 07/04/2025
2	Respuesta formal del diseñador al municipio de Rionegro sobre la solución a las filtraciones.	SANEAR	28/12/2024 25/03/2025 04/04/2025
3	Definición del presupuesto para as obras complementarias o adicionales	EDESO M. Rionegro	17/03/2025 07/03/2025
4	Gestion para expedición CDP que respalde recursos para el cierre financiero de la solicitud de reformulación No. 2.	Municipio de Rionegro	10/04/2025
5	Radicación solicitud de Reformulación No. 2 del proyecto	EDESO M. Rionegro	10/04/2025
Convenio CUR 802 de 2022			
6	Informe Final de Interventoria contrato de obra	EDESO	Pendiente
7	Informe Finan de EDESO contrato de obra	EDESO	
8	Gestion ante la aseguradora por incumplimiento	EDESO	
9	Acto administrativo por incumplimiento	EDESO	
7	Solicitud de Suspensión del convenio	EDESO	04/04/2025
Convenio CUR 1082 de 2022			
7	Inicio de operación de obras sector al YEE	M. Rionegro	25/03/ 2025 07/04/2025
8	Liquidación contratación derivada obra e Interventoria	EDESO	10/02/2025 21/03/2025 Incumplido
9	Liquidación Convenio	EDESO- M Rionegro	Pendiente

Anexo: Asistencia a la reunión
 Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
 Fecha: 04/04/2025.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento y Control Convenios 800, 802 y 1082 de 2022 - 4-4-25

25:16

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción
Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR Jairo Alberto Gomez Riano

LP Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo)

V Veracruz (No comprobado)

LD Luisa Duque (No comprobado)

GA Grupo Ambiental (No comprobado)

Desactivar audio del micrófono (Ctrl+Shift+M)

por que Fijate que está pasando lo mismo con el 802 le dan gavelas y gabbellas y gabbellas a los contratistas y vean 802 cómo salió?

Mal ese tipo lo hizo, sino tomar del pelo para que a la final una decisión que haya sido de la gerencia.

Se hubiera tomado en el 2023 y estamos en el 2025 y vea cómo les hizo el contratista para que ustedes se den cuenta de que le dan mucha gana a los contratistas. Hay que apretarlos porque no puede ser este señor del 800 iba muy.

Bien.


Pero, pero lleva 7 meses tratando de solucionar una cimentación.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 11:25
Que él como experiencia debe saber qué pasa YYY dice llegué a la interventoría la interventoría es la que está en hora es la que se está dando cuenta qué es lo que

Búsqueda

ESP LAA 11:26 4/4/2025

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

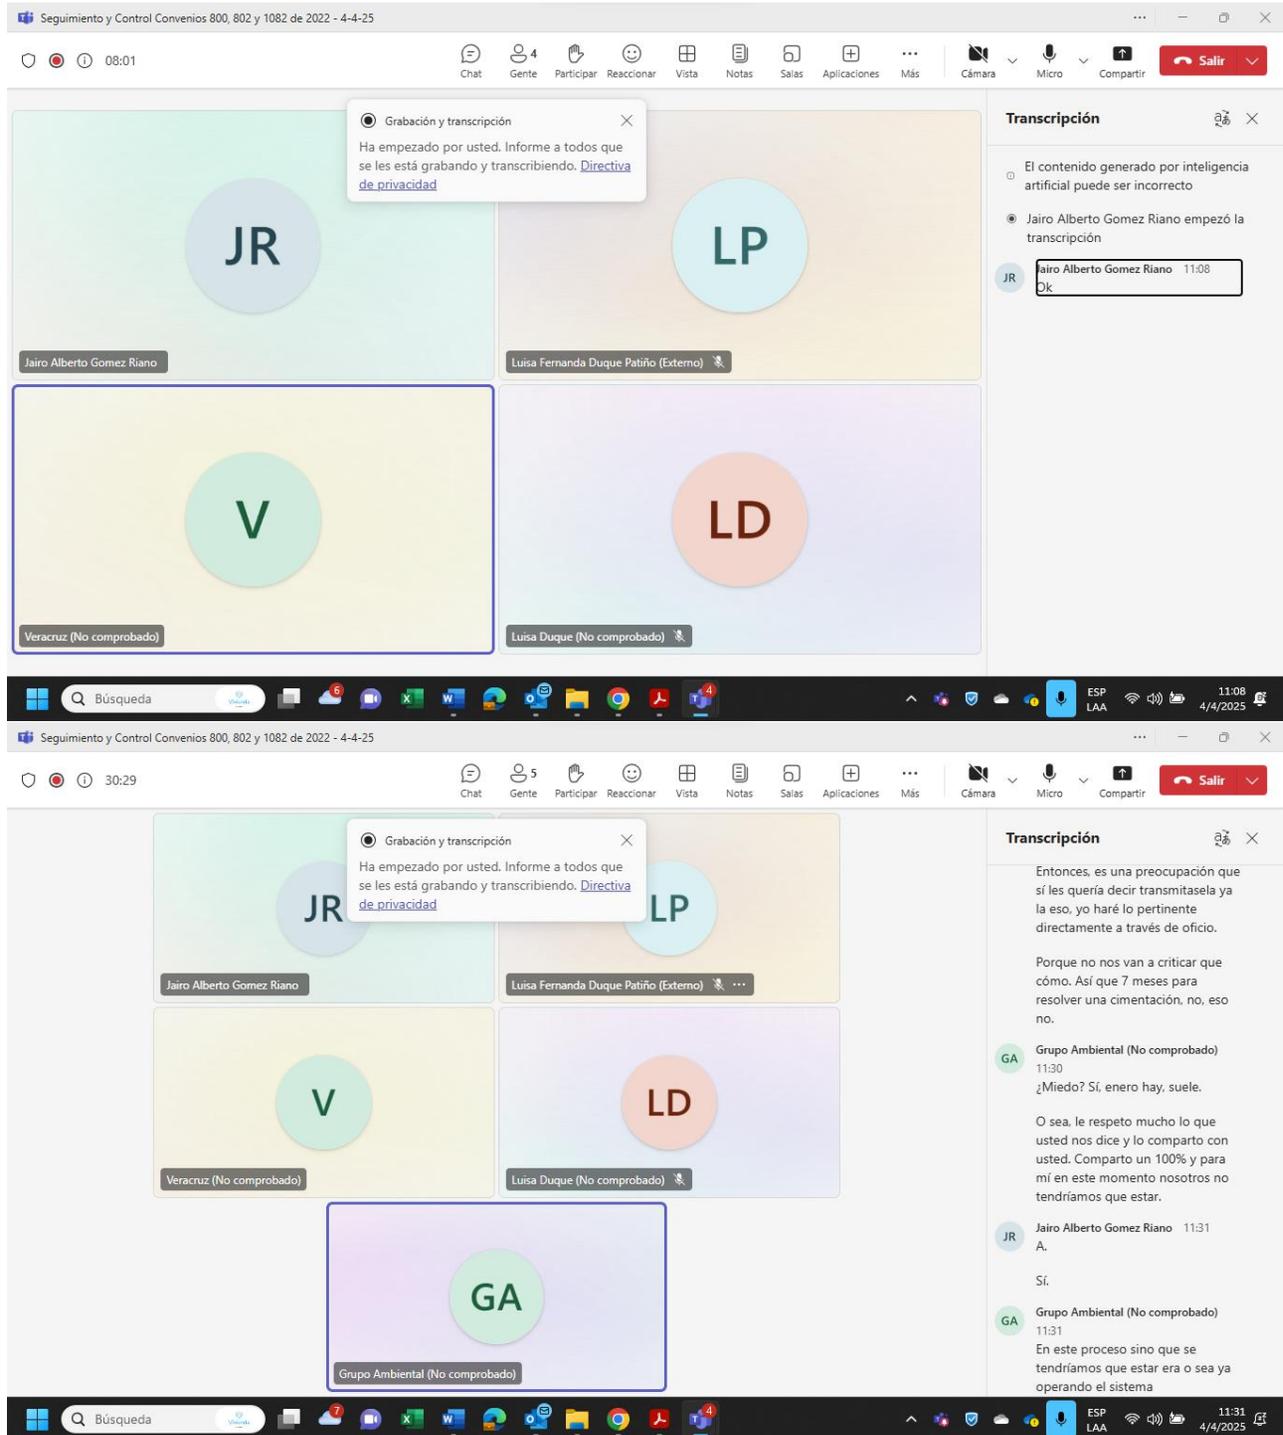

Seguimiento y Control Convenios 800, 802 y 1082 de 2022 - 4-4-25

08:01

Grabación y transcripción
 Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR LP

Jairo Alberto Gomez Riano Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo)

V LD

Veracruz (No comprobado) Luisa Duque (No comprobado)

Transcripción

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

Jairo Alberto Gomez Riano empezó la transcripción

JR Jairo Alberto Gomez Riano 11:08
Ok

Seguimiento y Control Convenios 800, 802 y 1082 de 2022 - 4-4-25

30:29

Grabación y transcripción
 Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR LP

Jairo Alberto Gomez Riano Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo)

V LD

Veracruz (No comprobado) Luisa Duque (No comprobado)

GA

Grupo Ambiental (No comprobado)

Transcripción

Entonces, es una preocupación que si les quería decir transmitasela ya la eso, yo haré lo pertinente directamente a través de oficio.

Porque no nos van a criticar que cómo. Así que 7 meses para resolver una cimentación, no, eso no.

GA Grupo Ambiental (No comprobado) 11:30
¿Miedo? Sí, enero hay, suele.

O sea, le respeto mucho lo que usted nos dice y lo comparto con usted. Comparto un 100% y para mí en este momento nosotros no tendríamos que estar.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 11:31
A.

Sí.

GA Grupo Ambiental (No comprobado) 11:31
En este proceso sino que se tendríamos que estar era o sea ya operando el sistema



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento y Control Convenios 800, 802 y 1082 de 2022 - 4-4-25

01:09:12

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción

Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR Jairo Alberto Gomez Riano

LP Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo)

V Veracruz (No comprobado)

LD Luisa Duque (No comprobado)

GA Grupo Ambiental (No comprobado)

Transcripción

ingenieras e ingeniero. Yo no tengo más puntos, ustedes tienen otro punto que haya que discutir en ese proyecto que haya que tener en cuenta.

GA Grupo Ambiental (No comprobado) 12:09
¿Bueno, que podamos ir avanzando y que que los contratistas nos ayuden, porque es que es muy complicado, verdad? Ya se vuelven un desgaste, ya es mi canción.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 12:09
No.

Sí, de los complicadísimos, sí, correcto. Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo, por atenderme y les deseo. Buena tarde y buen fin de semana.

GA Grupo Ambiental (No comprobado) 12:09
A usted igualmente muchas gracias

LP Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo) 12:09
Gracias

Búsqueda

ESP LAA

12:09 4/4/2025
