

Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en liquidación 	EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ
	ESP EN LIQUIDACIÓN
	ACTA DE REUNIÓN DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyecto: OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Lugar: Reunión Virtual

Hora Inicio: 10:15am **Hora Final:** 12:10m

Moderador: Karen Live Arguello


Relator: Yencith Torres Allin

Fecha: 24 de abril de 2020

PARTICIPANTES

La reunión contó con ocho (8) asistentes distribuidos entre funcionarios y/o contratistas de CODECHOCO, Empresas Públicas de Quibdó en Liquidación – EPQ, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Plan Departamental de Aguas y Alcaldía de Quibdó referenciados a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	CARGO
Edwin Márquez Blandón	CODECHOCO	Profesional Especializado
Yencith Torres Allín	EPQ E.S.P EN LIQUIDACION	Profesional Ambiental
Harry Alexander Escobar	CODECHOCO	Subdirector de Calidad y Control Ambiental
Carlos Alberto Parra	EPQ E.S.P EN LIQUIDACION	Coordinador Técnico
Karen Live Arguello	EPQ E.S.P EN LIQUIDACION	Coordinadora Administrativa
Fabián Rincón	Min Vivienda Ciudad y Territorio	Profesional Especializado
Héctor Emilio Mosquera	Plan Departamental de Aguas - PDA	Coordinador Área Técnica
Heiler Berrio	Alcaldía de Quibdó	Profesional Secretaria de Medio Ambiente

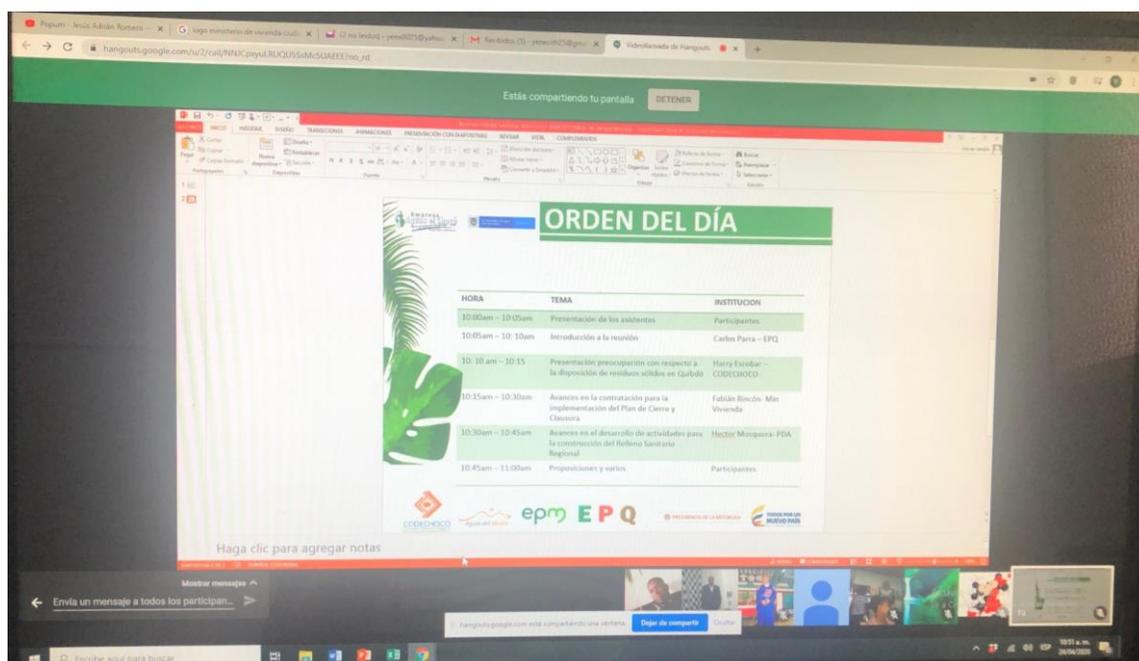

Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en liquidación 	EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ
	ESP EN LIQUIDACIÓN
	ACTA DE REUNIÓN DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyecto: OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Lugar: Reunión Virtual

Hora Inicio: 10:15am **Hora Final:** 12:10m

Moderador: Karen Live Arguello

Relator: Yenecith Torres Allin

Fecha: 24 de abril de 2020

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Identificar los avances en la implementación del plan de cierre y clausura del sitio de disposición final marmolejo del municipio de Quibdó y en la construcción del relleno sanitario regional

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN

1. Presentación de los asistentes a la reunión
2. Presentación preocupación con respecto a la disposición de residuos sólidos en Quibdó
3. Avances en la contratación para la implementación del Plan de Cierre y Clausura
4. Avances en el desarrollo de actividades para la construcción del Relleno Sanitario Regional
5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN

La reunión inicia a las 10:15am después de completar el número de ocho (8) funcionarios y/o contratistas de CODECHOCO, Empresas Públicas de Quibdó en Liquidación – EPQ, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Plan Departamental de Aguas y Alcaldía de Quibdó.

Carlos Alberto Parra realiza la presentación del orden del día, y da la bienvenida a cada uno de los participantes a la reunión

2. PRESENTACIÓN PREOCUPACIÓN CON RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN QUIBDÓ

Harry Alexander Escobar expresa su preocupación debido a la disposición actual de los residuos sólidos en el botadero Marmolejo, aun cuando la aeronáutica civil objeta la ubicación del botadero por encontrarse 1.5 km dentro del cono de aproximación del aeropuerto.

Posteriormente hace un bosquejo de los antecedentes del botadero; indica que Marmolejo contó con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO, mediante Resolución No. 0124 de 2008; para el cierre del botadero y construcción de un relleno regional donde además de los residuos

Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en liquidación 	EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ
	ESP EN LIQUIDACIÓN
	ACTA DE REUNIÓN DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyecto: OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Lugar: Reunión Virtual

Hora Inicio: 10:15am **Hora Final:** 12:10m

Moderador: Karen Live Arguello

Relator: Yenecith Torres Allin

Fecha: 24 de abril de 2020

sólidos generados en Quibdó se pudieran disponer los generados por la población de los municipios cercanos Atrato y Lloró.

Continua expresando que a pesar de lo anterior, en 2009 la Aeronáutica civil objetó el proyecto por encontrarse 1.5 km dentro del cono de aproximación del aeropuerto (la norma indica como mínimo 13km), por lo cual CODECHOCO derogó la licencia ambiental otorgada en 2008.

Teniendo en cuenta lo anterior, es perentorio que se construya a la menor brevedad posible el relleno sanitario regional y se ejecuten las obras necesarias para el cierre y clausura del botadero Marmolejo.

Harry Escobar indica además, que la Corporación ha estado muy al tanto de lo relacionado con la construcción del relleno regional, apoyó las visitas a diferentes terrenos en Cértegui para la escogencia del predio donde se construirá el Relleno y ha participado en las diferentes reuniones que se han citado; expresa además, que la Corporación continua atenta con el ánimo de colaborar en todo lo que sea posible.

3. AVANCES EN LA CONTRATACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA

Fabián Rincón expresa que el proyecto denominado "Optimización en la prestación del servicio de aseo en el perímetro urbano de la ciudad de Quibdó", fue aprobado técnica y financieramente por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio; entidad que adjudicó alrededor de 13 mil millones de pesos para: **1.** Construcción de un vaso de contingencia **2.** Desarrollo de las actividades de Cierre y Clausura y **3.** Compra de maquinaria para la operación de Marmolejo e implementación del Plan de Cierre

El representante del Ministerio aclara, que si bien el relleno sanitario es una solución más adecuada y regional para el manejo de residuos, el municipio de Quibdó a partir del inicio de operaciones de un vaso de contingencia contará con una alternativa adecuada que permitirá no solo cumplir los requerimientos ambientales, sino también iniciar el proceso para el cobro de tarifa de disposición final.

Continúa indicando, que el ejecutor de estos recursos es FINDETER, entidad que ha venido realizando todo el proceso para la contratación de la firma constructora y la interventoría. Expresa que desde FINDETER se ha abierto el proceso para la contratación de las obras (constructor) en varias ocasiones, pero se han presentado diferentes dificultades en el proceso de contratación; en una ocasión por los costos del contrato, los cuales no cumplían con las expectativas de los proponentes, en otra ocasión porque las propuestas no cumplían con el rigor técnico requerido, entre otras. Finalmente, el mes de diciembre se adjudicó la obra al

Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en liquidación 	EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ
	ESP EN LIQUIDACIÓN
	ACTA DE REUNIÓN DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyecto: OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Lugar: Reunión Virtual

Hora Inicio: 10:15am **Hora Final:** 12:10m

Moderador: Karen Live Arguello

Relator: Yenecith Torres Allin

Fecha: 24 de abril de 2020

proponente SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PRIVADO – SERVIGENERALES S.A. E.S.P. Con relación a la interventoría, el contrato se adjudicó, pero el proponente seleccionado declinó de la suscripción del contrato, por lo que fue necesario abrir una nueva convocatoria para contratar a la interventoría de obras y maquinaria.

Se vienen realizando los esfuerzos necesarios para que en el transcurso de 2020 se contrate la construcción del Vaso de contingencia. En este momento el MVCT está atento a que FINDETER envíe los nuevos términos de referencia para abrir la nueva convocatoria con la que se contratará la interventoría. Una vez se adjudique la interventoría, se suscribirán los contratos y el acta de inicio de obra.

Con relación a la compra de maquinaria para el Plan de Cierre, el MVCT solicitó una reformulación del proyecto. Cabe anotar que estos son los equipos necesarios para operar el vaso de contingencia y los recursos están asignados.

Con el Fondo Todos Somos Paszcifico - FTSP el MVCT y la EPQ, han venido apoyando la formulación de un proyecto para la Formalización de los Recicladores del Botadero Marmolejo, este proyecto será financiado por el BID y deberá contar con la aprobación del MVCT; por lo anterior, la semana del 13 de abril fue presentada a esta entidad y se encuentra en ajuste para su viabilización.

Harry Escobar considera que antes de iniciar el desarrollo de las diferentes obras se deberán realizar ante la Corporación los diferentes trámites ambientales a que haya lugar, como es el caso de Permiso de Aprovechamiento Forestal Único, debido a que algunos árboles posiblemente serán extraídos para construir el vaso.

Carlos Parra indica que desde la EPQ se realizarán los trámites de su competencia y solicitará a la entidad competente, la solicitud de los trámites que no sean soporte de la empresa.

Edwin Márquez expresa que en caso de realizar obras adicionales a las establecidas en el Plan de Cierre y Clausura se deberán llevar a cabo, previamente, los diferentes trámites ambientales a que haya lugar en la Corporación. Fabián Rincón responde que las obras a construir en el plan de cierre y clausura ya fueron aprobadas por la Corporación mediante la Resolución 0341 de 2016.

Harry Escobar pregunta sobre los tiempos del proceso de contratación y de la construcción del nuevo vaso; Fabián Rincón responde que el proceso de contratación podría tardar en promedio 45 días desde el inicio del mismo; y el tiempo de construcción se estima en 18 meses contados a partir del inicio de las obras; inicio que podría tardar aproximadamente 15 días después de finalizar con el proceso de contratación, tiempo necesario para organizar

Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en liquidación 	EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ
	ESP EN LIQUIDACIÓN
	ACTA DE REUNIÓN DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Lugar: Reunión Virtual

Hora Inicio: 10:15am **Hora Final:** 12:10m

Moderador: Karen Live Arguello

Relator: Yenecith Torres Allin

Fecha: 24 de abril de 2020

cronograma y realizar los acercamientos necesarios con diferentes entidades del orden nacional, regional y local.

4. AVANCES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL

Hector Emilio Mosquera inicia comentando, que para la Elaboración de los Estudios y Diseños, que permitieran la posterior construcción del Relleno Sanitario Regional, donde Quibdó podrá disponer sus residuos sólidos; se contrató la firma denominada CASIA limitada; sin embargo, dicho contrato fue suspendido en 2016, debido a que a pesar de los esfuerzos, para la Alcaldía de Cértegui no fue posible llegar a acuerdos con las comunidades, que permitieran la sección del predio para la construcción del Relleno.

Continua expresando que en 2017, la Alcaldía de Cértegui realizó nuevamente acercamientos con el Consejo Comunitario de Cértegui, dicho acercamiento permitió que se recibiera carta de intención para la construcción del Relleno Sanitario Regional, sin embargo, esta carta no es suficiente para continuar con los Estudios y Diseños para la construcción del Relleno; debido a que se requiere que la Alcaldía y el Consejo Comunitario de Cértegui se articulen para la sección del predio mediante un Usufructo.

Harry Escobar indica que para continuar con el proceso se podría hacer una preconsulta con la comunidad, de tal forma que se protocolicen los diseños y así se pueda contar con una garantía jurídica que permita dar continuidad al proyecto.

Seguidamente, Héctor Mosquera indica que a la fecha el terreno seleccionado está ubicado en el sector Casa Quemada del municipio de Cértegui, por lo tanto, es soporte de la Alcaldía de Cértegui la adquisición del predio, sin embargo, es necesario que este ente cuente con el apoyo de las diferentes Alcaldías de los municipios que dispondrán de sus residuos sólidos en el relleno regional.

Fabián Rincón considera que es necesaria una reunión presencial con los Alcaldes de los municipios que dispondrán residuos en el futuro Relleno Sanitario Regional con el objetivo de poder llegar a los acuerdos a que haya lugar, sin embargo, Heiler Berrio considera que debido a que se desconoce la extensión de las medidas de restricción debido a la pandemia del COVID 19, se podría realizar una reunión de manera virtual. Carlos Parra indica que la reunión virtual sería de acercamiento con los Secretarios de Ambiente de las diferentes Alcaldías, con el objetivo que conozcan el proceso y puedan "llevar el mensaje a sus Alcaldes y demás funcionarios de las Alcaldías".

Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en liquidación 	EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ
	ESP EN LIQUIDACIÓN
	ACTA DE REUNIÓN DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Lugar: Reunión Virtual

Hora Inicio: 10:15am **Hora Final:** 12:10m

Moderador: Karen Live Arguello

Relator: Yenecith Torres Allin

Fecha: 24 de abril de 2020

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

Carlos Parra hace una presentación resumen de las obras de contingencia que se han venido construyendo en el botadero Marmolejo; indica que los documentos fueron enviados a los correos cca@codechoco.gov.co con copia a haescobar@codechoco.gov.co, emarquez@codechoco.gov

Edwin Márquez expresa su preocupación con respecto a los residuos hospitalarios que debido a la emergencia actual, pueden estar siendo dispuestos de manera inadecuada en el botadero Marmolejo, indica que con la secretaría de Medio Ambiente del municipio de Quibdó y con la empresa PRESERVEC encargada de la disposición adecuada de estos residuos; se ha venido haciendo seguimiento a las diferentes entidades de salud; sin embargo requieren del apoyo de los operadores de Marmolejo en este caso EPQ ESP en Liquidación para controlar la disposición (hasta donde sea posible) de estos residuos en el botadero.

La reunión finaliza a las 12:10m con los siguientes compromisos:

Compromiso	Encargado	Fecha límite	Estado
Enviar avances del proceso de contratación de las obras e interventoría para la construcción del vaso de contingencia en el marco del Plan de Cierre y Clausura de Marmolejo	MVCT	08/05/2020	
Convocar la reunión virtual con los secretarios de ambiente y de planeación con el objetivo que conozcan el proceso y puedan "llevar el mensaje a sus Alcaldes y demás funcionarios de las Alcaldías".	PDA Secretaría de ambiente de Quibdó	30/05/2020	
Pago de Facturas relacionadas con el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental (Plan de Cierre y Clausura – Resolución 0341 de 2020)	Alcaldía de Quibdó (La Secretaría de Ambiente deberá realizar el trámite)	08/05/2020	
Revisión de los documentos enviados relacionadas con Obras de Contingencia a construir en el botadero Marmolejo previas al inicio de las obras de construcción del vaso de contingencia	Subdirección de Calidad y Control Ambiental – CODECHOCO	15/05/2020	
Reunión virtual para socializar las obras de contingencia a construir en Marmolejo previas a la implementación del Plan de Cierre y recibir recomendaciones y/o sugerencias por parte de CODECHOCO*	EPQ ESP en Liquidación – CODECHOCO	30/05/2020	
Envío vía Email de documento que muestre los avances con relación a la disposición de residuos sólidos en Quibdó (corto, mediano y largo plazo), con sus respectivos anexos a las entidades con incidencia en el tema y que hacen parte de la Mesa de Aseo de Quibdó	EPQ ESP en Liquidación	15/05/2020	

Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en liquidación 	EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ
	ESP EN LIQUIDACIÓN
	ACTA DE REUNIÓN DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyecto: OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Lugar: Reunión Virtual

Hora Inicio: 10:15am **Hora Final:** 12:10m

Moderador: Karen Live Arguello

Relator: Yenecith Torres Allin

Fecha: 24 de abril de 2020

Reunión virtual con incidencia en el tema y que hacen parte de la Mesa de Aseo de Quibdó con el objetivo de mostrar los avances con relación a la disposición de residuos sólidos en Quibdó (corto, mediano y largo plazo)	EPQ ESP en Liquidación	30/05/2020	
--	------------------------	------------	--

*La revisión de estos documentos y las actividades posteriores ligadas a esta actividad, dependen del pago de las facturas por servicio de seguimiento de la resolución 0341 de 2016
