

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de febrero de 2021		
HORA:	De 8:00am a 9:00am		
LUGAR:	Virtual		
ASISTENTES:	MINISTERIO DE VIVIENDAS CIUDAD Y TERRITORIO	Luis Hernán Torres Suárez	ltorres@minvivienda.gov.co
	AGUAS DEL HUILA S.A E.S. P	Esperanza Ortiz Martínez	subgerenciatecnica@aguasdelhuila.gov.co
	CONSULTOR	Mario Muñoz	proyectos.incolsam@gmail.com
	ALCALDÍA	Lorenzo Velásquez	planeacion@garzon-huila.gov.co
			renso123072@gmail.com
			leonarvale@hotmail.com
INVITADOS:	NA		

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para revisar los ajustes al proyecto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo con la participación de Aguas de Huila, el municipio de Garzón, el consultor y los especialistas del MVCT en los temas de topografía y geotecnia con la coordinación del evaluador líder del proyecto con el objetivo de hacer seguimiento al estado del proyecto según la ultima mesa de trabajo donde se estableció como fecha de entrega a los ajustes el proyecto el pasado 20 de enero de 2021.

Según lo anterior se da la palabra a la ingeniera esperanza Ortiz subgerente técnica de Aguas del Huila y al ingeniero Mario muñoz como consultor para que informen el estado del proyecto y se defina la fecha definitiva de radicación.

De acuerdo a lo anterior, se informa por las partes que el compromiso de topografía ya está ajustado y se encuentra a la espera que la revisión por parte del ingeniero Juan Alejandro Garzón quien se compromete a dar su concepto el próximo viernes.

De igual forma se menciona por parte del consultor que el componente de geotecnia esta pendiente de programar el trabajo de campo la próxima semana con el objeto de adelantar cuatro apiques mas pero que es conveniente que el especialista por parte del

MVCT de su aprobación si con estos es suficiente para subsanar las observaciones en el tema geotécnico, para lo cual se concreta con el apoyo del ingeniero Diego Sorza que si y que estos deben estar debidamente descritos además de hacer todos los ajustes solicitados en mesas anteriores.

De la misma manera el ingeniero Luis Hernan Torres Suarez menciona que los demás componentes que fueron objeto de observaciones no se ha tenido información y que estos deben ser abordados según los requerimientos hechos en los componentes, hidráulico, estructural, eléctrico y presupuestal con el fin de poder llevar el proyecto al comité técnico del MVCT.


Según esto se pregunta cuanto tiempo se estima para la entrega del proyecto de manera definitiva con todos los ajustes solicitados a lo cual el consultor expresó que necesita de 45 días para la entrega final.

COMPROMISOS (Si aplica)

se establece como compromiso revisar y reducir estos tiempos de entrega a lo cual el consultor y Aguas del Huila, se compromete a revisar y entregar el proyecto lo más pronto posible, debido a la urgencia en la entrega del proyecto se estable como fecha de seguimiento a los avances el día 13 de marzo de 2021.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Meas de trabajo para seguimiento a los ajustes	MVCT	13/03/2021

FIRMAS:

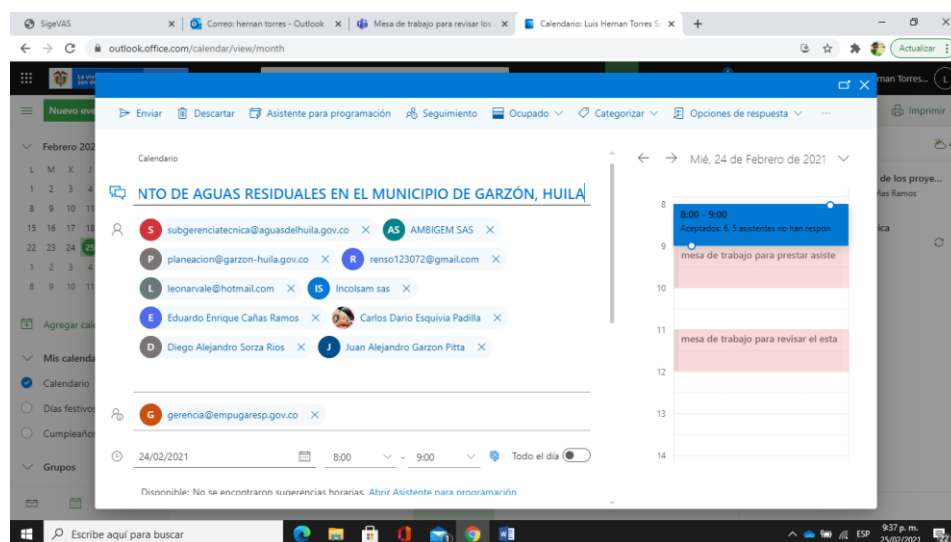

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
Fecha: 24-02-21
