




PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
OPTIMIZACIÓN Y
COMPLEMENTARIAS DEL
RELLENO SANITARIO REGIONAL
LA CORTADA DE PAMPLONA-
NORTE DE SANTANDER

1. Antecedentes

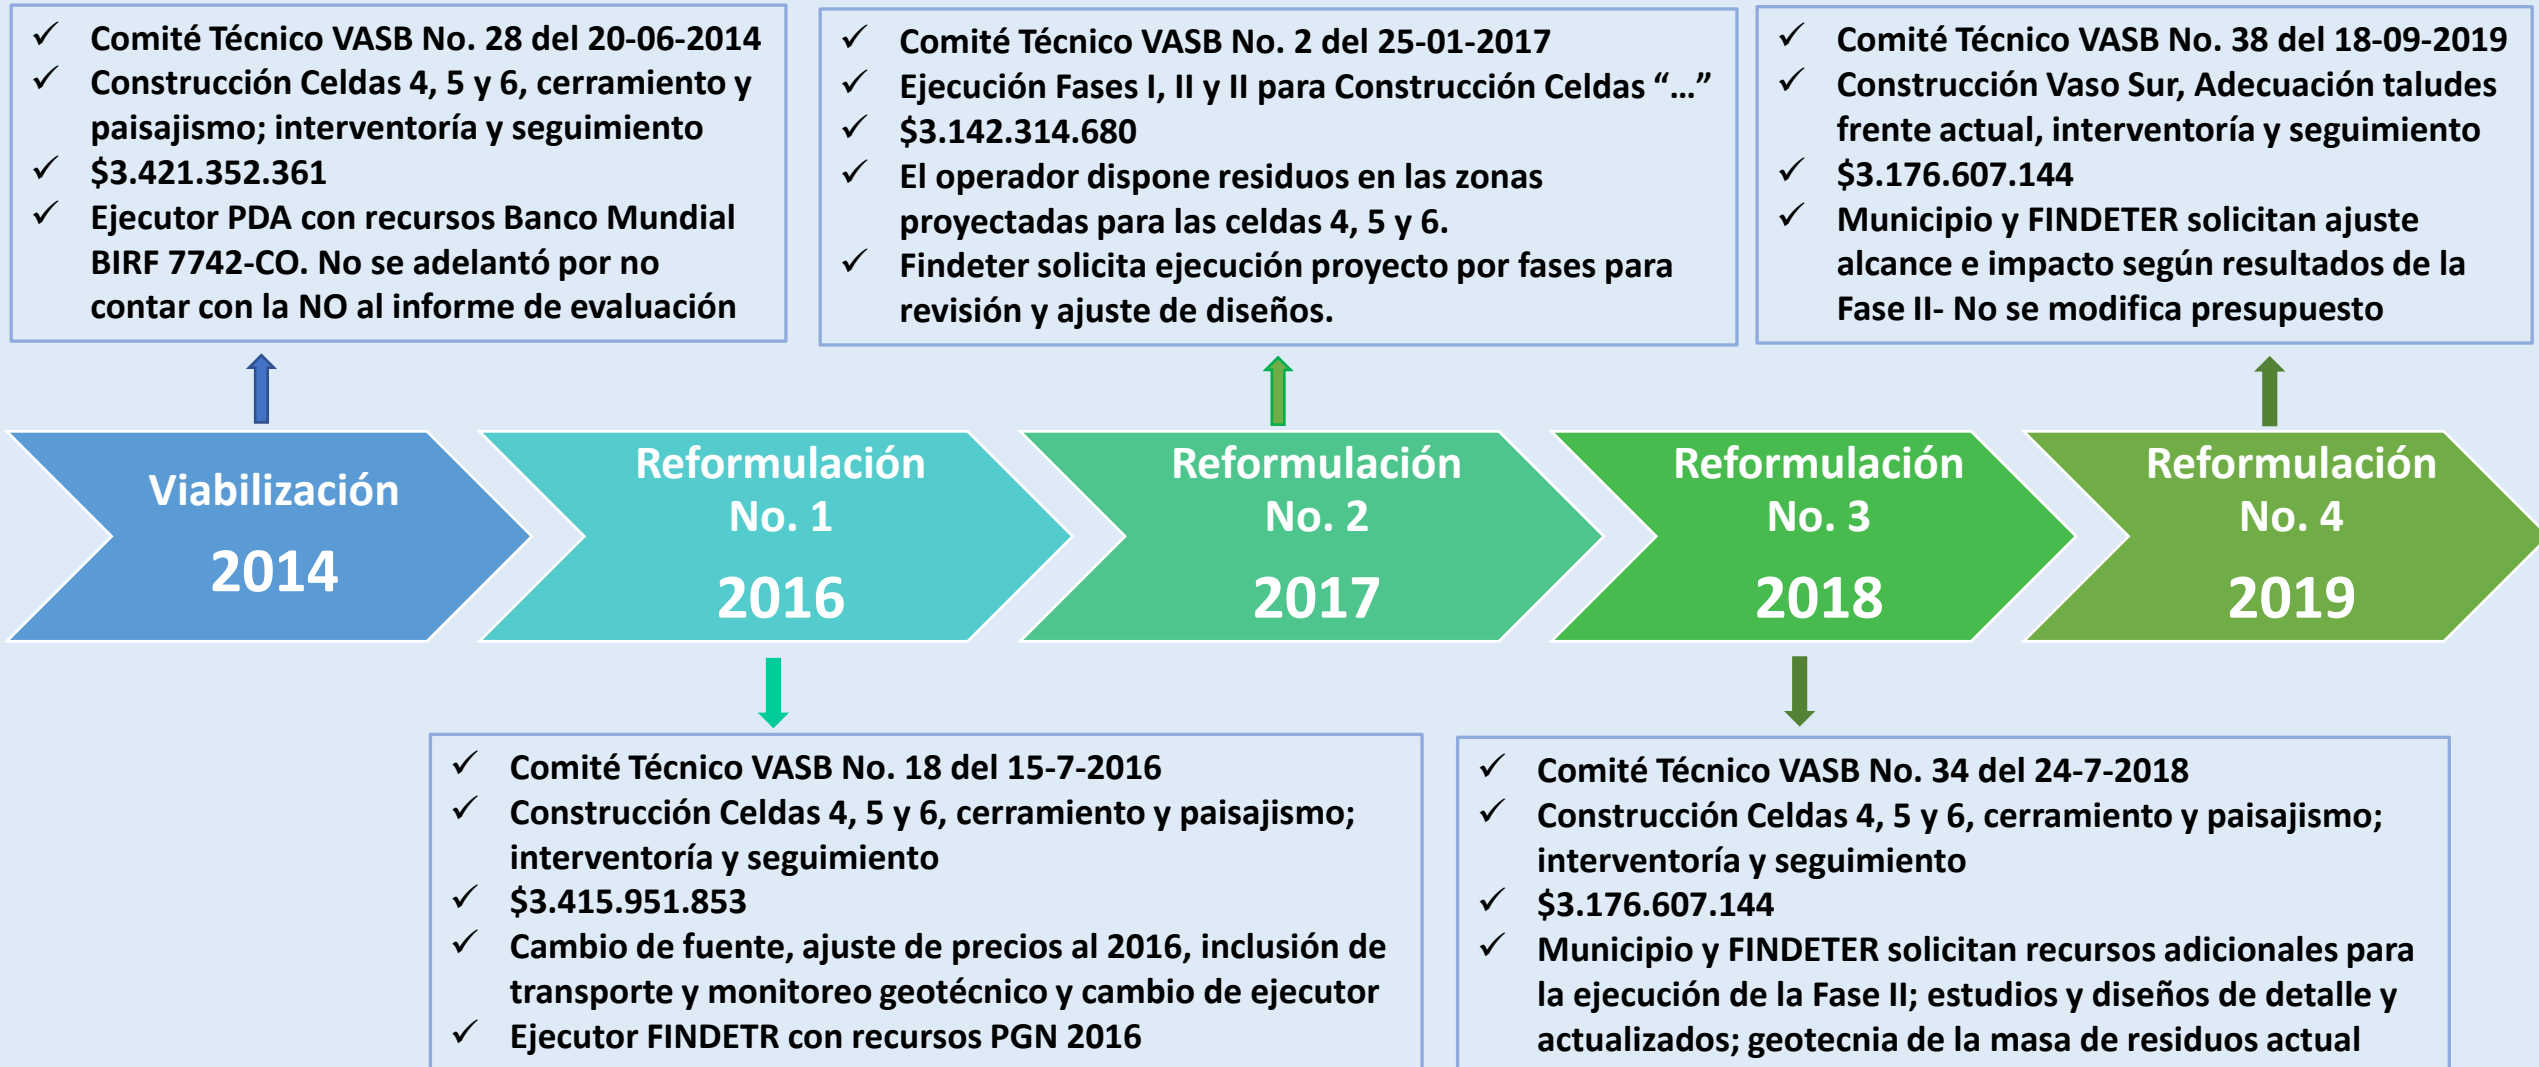

2. Ejecución Fases Proyecto





Construcción de obras de optimización y complementarias del relleno sanitario regional la cortada de Pamplona- Norte de Santander

50

Ton/día

9

Municipios atendidos incluido
1 de Santander

2022

Vida útil actual con el
nuevo vaso

2023

Vida útil con muro de
contención (Reformulación 5)

VALOR PROYECTO

✓ \$ 4.300.249.654 (98,5% recursos nación; 0,8% Mpio, 0,7% Operador)

ESTADO ACTUAL

✓ En ejecución Fase III – Construcción del muro de contención
Avance: 80%

IMPACTOS ESPERADOS A FUTURO CON REFORMULACIÓN

- ✓ Ampliar vida útil en 2,4 años
- ✓ Beneficiar a más de 100.000 habitantes
- ✓ Contar con el tiempo justo para estructurar sitio a largo plazo para la disposición final adecuada



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 • 2021




Avance del Proyecto


1. Construcción de la Celda No. 1 Zona Sur



2. Construcción de pozos de extracción de lixiviados y gases – 3 Un Prof. Prom= 27 m

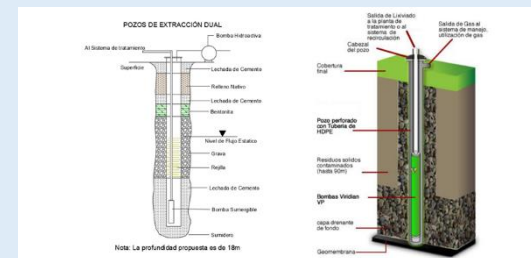


4. Construcción de canales perimetrales y cunetas intermedias

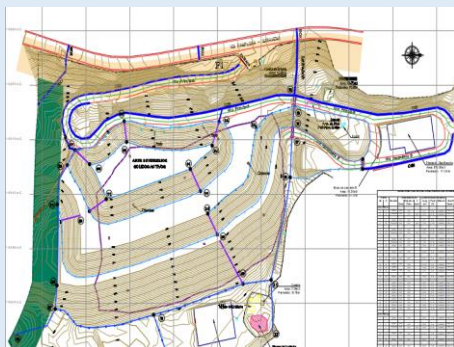

5. Instrumentación Geotécnica



6. Construcción Muro en tierra armada reforzado

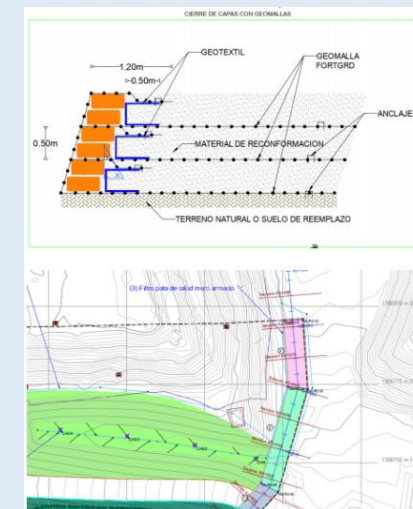

Obras Terminadas
A noviembre de 2020



Obras en Ejecución
A terminar en mayo de 2021





Valla del Proyecto



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

En **Pamplona**, se construyen
las obras de optimización y
complementarias del Relleno
Sanitario Regional La Cortada

Financiador:
Minvivienda

Ejecutor:
Findeter

Plazo: 10 meses

Contratista:
Consorcio Optimización La Cortada III 2017

Interventoría:
German Ballestas Berdejo

Beneficiarios: 101.425 habs.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



Avance Fotográfico del Proyecto



Excavación del nuevo vaso de DF



Excavación y adecuación del fondo del nuevo vaso de DF



Avance Fotográfico del Proyecto



Instalación de geotextil y geomembrana





Avance Fotográfico del Proyecto



**Excavación de filtros para
manejo de lixiviados**



Instalación de geotextil y geomembrana

