

|   |                                    |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO:</b> ACTA               | Versión: 4.0      |
|   | <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 10/09/2019 |
|   |                                    | Código: GDC-F-01  |

## ACTA No. 07

**FECHA:** Bogotá, 19 de abril de 2021

**HORA:** De 10:00 pm - 11:00 am

**LUGAR:** Teleconferencia

**ASISTENTES:** Jose Joaquín Monzo Avendaño - Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare  
 Yuri Lizeth Chaparro Duarte - Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare  
 Iván Ballesteros – Subgerencia técnica - Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare  
 Aura Patricia Leon Boton . Grupo de Residuos Solidos del VASB  
 Ruby Chamorro B, Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

### ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de proyectos de residuos solidos
2. Estado del convenio marco
3. Estado – Documento diagnostico
4. Estado – Matriz de inversiones
5. Compromisos

### DESARROLLO:

Mediante videoconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Casanare en lo que corresponde al componente ambiental, en este sentido, se trataron los siguientes puntos:

#### 1. **Revisión de proyectos de residuos solidos**

Sobre este asunto, se envió con anterioridad a la Ing. Patricia Leon del Grupo de Residuos Sólidos del VASB los proyectos que el PDA incluyó en la matriz de inversiones relacionados con el tema de residuos sólidos, a los que la Ing. realizo los siguientes comentarios:

| No | PROYECTO  | VALOR TOTAL      | Observaciones MVCT   |
|----|---|------------------|--|
| 1  | Proyecto para aprovechamiento de los residuos sólidos producidos en el área urbana del municipio de Chameza | \$ 80.000.000    | <p>Para este tipo de proyectos es recomendable lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definir el alcance: ¿Es un proyecto de consultoría?, es un para la construcción de infraestructura para aprovechamiento, adquisición de equipos?</li> <li>2. En caso de ser un proyecto de infraestructura para el aprovechamiento: Hay censo de recicladores?, se tiene desarrollado el programa de aprovechamiento del PGIRS del municipio de Chameza, que permita establecer que la actividad de aprovechamiento es viable?</li> <li>3. ¿Se tiene organizada selección en la fuente y ruta selectiva?</li> <li>4. Se recuerda que estos proyectos deben ser presentados al mecanismo de viabilización sea por ventanilla regional o del MVCT</li> </ol>  |
| 2  | Construcción, adecuación y repotenciación de la planta de residuos sólidos del municipio de Maní            | \$ 1.800.000.000 | <p>Para este tipo de proyectos es recomendable lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se entendería que es un proyecto para aprovechamiento? o tratamiento?. Se tiene desarrollado el programa de aprovechamiento del PGIRS del municipio de Maní, que permita establecer que la actividad de aprovechamiento es viable?</li> <li>3. ¿Se tiene organizada selección en la fuente y ruta selectiva? - Este aspecto es muy importante, debido a que esas antiguas plantas de residuos fallaron porque hacían separación mediante tolvas y bandas transportadoras, lo cual hace que los costos operativos sean tan altos que no son viables desde el punto de vista financiero. Pues los costos operativos deben ser cubiertos vía tarifa y no con recursos del SGP.</li> <li>4. Se recuerda que estos proyectos deben ser presentados al mecanismo de viabilización sea por ventanilla regional o del MVCT</li> </ol> |
| 3  | Optimización y ampliación de la planta integral de residuos sólidos de Orocué                               | \$ 5.000.000.000 | Idem que para el proyecto anterior   |

|   |  |                   |   |
|---|--|-------------------|---|
| 4 | Construcción y adecuación trinchera 10 y 11 y obras complementarias como medidas de optimización y mejoramiento de la operación del relleno sanitario regional el cascajar del municipio de Yopal departamento de Casanare | \$ 17.933.272.018 | Este proyecto ya se contrató y está en ejecución. Fue viabilizado por ventanilla regional y considero que no hace parte del Plan Ambiental sino del componente de infraestructura.  |
| 5 | Estudio de factibilidad y diseños de ingeniería de detalle para la construcción del nuevo sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos de orden regional en el municipio de Yopal                        | \$ 2.400.000.000  | ¿Este proyecto es el mismo que se ha venido gestionando en cumplimiento a un fallo del tribunal del Casanare? Se tenía entendido que el estructurador del proyecto era el Departamento de Casanare y los recursos serían de la Nación por obligación del fallo del Tribunal de Casanare. Se está a la espera de la presentación de ese proyecto al MVCT por parte del Departamento. |

Estas observaciones fueron enviadas al equipo del PDA para que sean revisados y dar la respectiva respuesta en la presente reunión, es así como en esta reunión y luego de que el ing. Joaquín Monzo respondiera algunas de las inquietudes manifestadas por la ing. Patricia, se realizan los siguientes comentarios:

- a) Para los proyectos 1, 2 y 3 se requiere dar claridad al alcance técnico de los proyectos, se debe corroborar si la actividad de aprovechamiento se encuentra incluida en el PGIRS, así mismo que este enmarcado en la normatividad vigente para el tema, como el decreto 1077 de 2015, decreto 596 de 2016 y su resolución 276 de 2016, verificar si existe alguna estructura que funcione o sus condiciones, tener claro el diagnóstico y además verificar la fuente de financiación y la disponibilidad de recursos.
- b) Para el proyecto 4, la ing. Patricia manifiesta que el mismo ya fue contratado por el PDA, por lo que se sugiere verificar si el mismo fue contratado en la vigencia 2020- 2023 y la fuente de financiación, si corresponde a recursos de infraestructura se deberá incluir el proyecto, sin embargo el valor deberá ser registrado únicamente en la casilla de observaciones con el objetivo que no se duplique el presupuesto.
- c) Para el proyecto 5, este proyecto está enmarcado en el cumplimiento de un fallo del tribunal del Casanare, de acuerdo a la información de la ing. Patricia el mismo ha sido mencionado en los comités de seguimiento de este fallo y se ha informado que será presentado al Ministerio para que sea financiado con recursos de la Nación, teniendo en cuenta que en la matriz de inversiones se señala que este proyecto será financiado con recursos del PDA – Gobernación, se solicita se verifique esta información y sea corregida en la matriz.
- d) Se evidencia falta de conocimiento y de información sobre la justificación técnica de los proyectos, así como también de los recursos que serán destinados para su financiación, se hace necesario realizar acercamientos con los municipios y obtener la información necesaria, se sugiere realizar mesas técnicas las cuales podrán ser acompañada por el Viceministerio.

## 2. Estado del convenio marco

La ing. Lizeth Chaparro informa que a la fecha no se tiene ninguna respuesta por parte de Corporinoquia

## 3. Estado – Documento diagnostico

La ing. Lizeth Chaparro informa que Corporinoquia remitió información para la actualización del documento, se enviara una nueva versión.


## 4. Estado – Matriz de inversiones

A la fecha no se ha enviado una nueva versión actualizada, nuevamente se sugiere revisar detalladamente los proyectos incluidos, el alcance, la viabilidad técnica, la fuente de financiación, la disponibilidad de recursos y valores. Se enviará una nueva versión.

Con respecto a la concertación de proyectos con Corporinoquia se sugiere alcanzar en la revisión del plan de acción de la Corporación y proyectar el acta de concertación en una versión borrador con el fin de agilizar el proceso.

## 5. Compromisos

| Compromiso   | Responsable                 | Fecha limite de cumplimiento |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Envío del documento diagnostico ajustado   | Yuri Lizeth Chaparro Duarte | 30 de abril de 2021          |
| Envío de la matriz ajustada  | Jose Joaquín Mozo Avendaño  | 30 de abril de 2021          |
| Programar mesas técnicas con los municipios para revisión de proyectos de Residuos Sólidos | Jose Joaquín Mozo Avendaño  | 26 de abril de 2021          |
| Enviar acta de concertación para diligenciamiento por el PDA                               | Ruby Chamorro               | 26 de abril de 2021          |

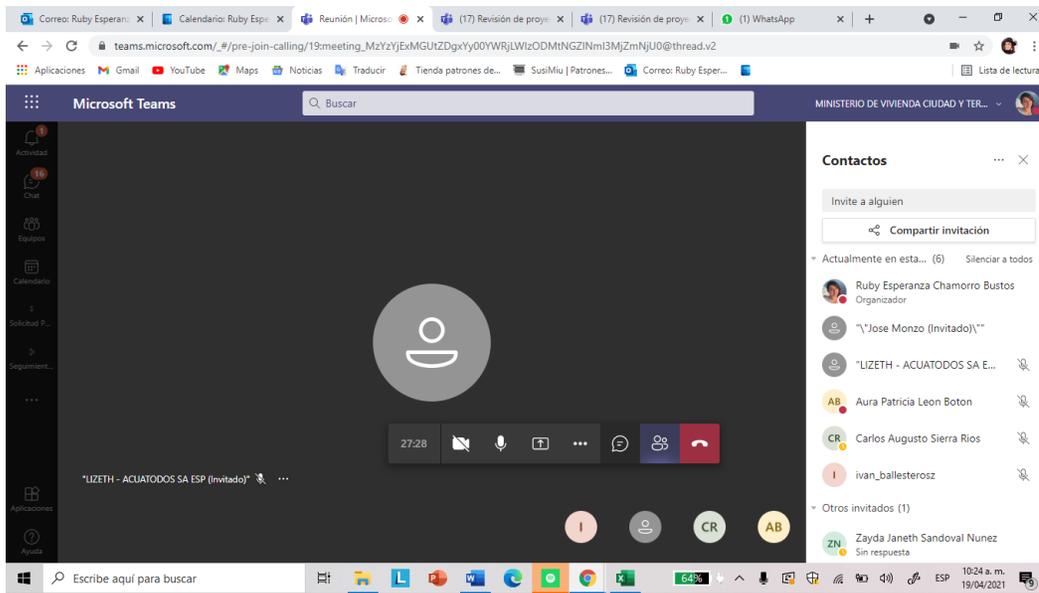

Elaboró: Ruby Chamorro Bustos  
Fecha: abril de 2021
