

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 29 de julio de 2021
HORA:	De 14:30 a 15:30 horas
LUGAR:	Virtual (Microsoft Teams)
ASISTENTES:	<p>Carlos Jair Forero, Consultoría del proyecto</p> <p>Víctor Lopera, Supervisor del Contrato de Consultoría Admon. Temporal Guajira PDA.</p> <p>Juan Alejandro Garzón, Contratista Especialista en Topografía SDP VASB MVCT</p> <p>Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista SDP VASB MVCT</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Antecedentes
3. Objeto de la reunión: Seguimiento a los avances a los ajustes solicitados. Proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA, OPTIMIZACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN "METESUSTO", OPTIMIZACIÓN PTAP "EL POZO" Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA) EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA (Nota: el nombre sujeto a verificación por observación y exclusión de unos de los componentes inicialmente considerados.
4. Conclusiones y Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes
2. Antecedentes
3. Objeto de la reunión: Seguimiento a los avances a los ajustes solicitados.

a. Representantes del formulador de proyecto exponen que sobre los avances se realizaron atenciones a las observaciones de la lista de chequeo remitida por evaluador líder del MVCT y la interventoría del proyecto.

Actualmente se encuentra pendiente a revisión de los documentos del proyecto por parte de la interventoría, quienes actualmente cuentan con el contrato suspendido y se espera la reanudación en la semana del 2 al 6 de agosto de 2021. Posterior a que se reanude en contrato, se espera se realice la revisiones ya probaciones pertinentes por parte de la interventoría a los ajustes solicitados por estos.

La topografía se encuentra en proceso de ajustes y verificaciones, actualmente labores de campo y oficina. Sobre estos ajustes, que fueron solicitados por especialista del MVCT, se ha mantenido contacto entre el topógrafo y el funcionario del ministerio para el seguimiento y consultas sobre los avances.

b. Se menciona por parte del consultor del proyecto, que la Administración Temporal Gestionó los respectivos permisos para la Estación Elevadora, y se aclaró sobre titularidad del tanque. Se menciona que no se requieren de más trámites con propietarios dado que las demás obras se realizarán sobre servidumbres constituidas o espacio público.

c. Previo a la presentación de los ajustes a evaluadores del MVCT, estos serán objeto de verificación y aprobación por parte de las interventorías.

d. El evaluador líder del proyecto, recuerda que con los ajustes del proyecto, deben atenderse las recomendaciones del comité técnico que a continuación se resumen a continuación:

- No se considera pertinente el componente de optimización El Pozo, dado que no se cuenta con la justificación técnica, la concesión de aguas se encuentra vencida, no es claro la capacidad de la fuente de abastecimiento y no corresponde a una optimización puesto que no hay ampliación del sistema, sino reemplazo de unos de los módulos y mantenimientos que no objeto de financiación con recursos de la nación en caso que este sea la fuente de los mismos.
- Sobre la estación elevadora, se recomienda la inclusión de sistemas de control de caudal y presión, y medición en línea de conformidad con lo requerido por la normativa técnica.
- Incluir informe ejecutivo en el proyecto del asunto, sobre proyecto complementario a presentarse ante el MVCT, que incluye acciones y controles a implementarse sobre la conexiones ilegales, además del análisis técnico que corresponda.
- Se solicita claridad sobre las fuentes de financiación sobre la infraestructura existente construida y se aporte los certificados que correspondan. Adicionalmente se aclare sobre la fuente de financiación del proyecto considerado y del asunto.

Representantes del formulador del proyecto respecto a lo anterior, menciona lo siguientes:

- Sobre la exclusión del componente que no se considera pertinente, este fue excluido del proyecto de acuerdo a las recomendación del comité técnico.
- Se incluirá informe ejecutivo, sobre proyecto complementario presentado en el MVCT (Barrancas), sobre la inclusión de las acciones y controles a implementarse sobre la conexiones ilegales, además del análisis técnico que corresponda.
- Sobre la claridad solicitada respecto a las fuentes de financiación de la infraestructura existente, se menciona que esto aún estar por cumplirse debido a que se está consultando y buscando la información requerida al nuevo operados (Veolia), y a la fecha pendiente de entrega.

c. El evaluador líder recuerda que el proyecto fue radicado por etapas, surtida la verificación de evaluación preliminar (Etapa 1) y presentación ante del comité técnico de esta verificación (Etapa 2), por la recomendaciones de este organismo, y los ajustes solicitados. Entregados los ajustes se verificará el cumplimiento de lo solicitado y se ingresará nuevamente a comité para las instrucciones pertinentes sobre el proceso de evaluación del proyecto.

Nota: Las observaciones, se encuentran ampliamente detalladas en los correos enviados al formulador mediante correos electrónicos de fechas 13/11/2020, 01/12/2020, 14/12/2020, 07/02/2021, 09/02/2021 y 10/02/2021, que son de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial.

4. Conclusiones y Cierre de la reunión.


Se proyecta que se realice reunión de seguimiento a los ajustes de topografía y a los demás solicitados por evaluador líder del MVCT en lista de chequeo y los realizados por la interventoría, para el día 12 de agosto de 2021.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión de seguimiento y presentación de avance de los ajustes solicitados al proyecto del asunto	Carlos Jair Forero, Consultoría del proyecto Víctor Lopera, Supervisor del Contrato de Consultoría Admon. Temporal Guajira PDA. Juan Alejandro Garzón, Contratista Especialista en Topografía SDP VASB MVCT Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista SDP VASB MVCT	12/08/2021
2			
3			

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	7/29/2021, 2:30:05 PM
Juan Alejandro Garzon Pitta	Unido	7/29/2021, 2:30:16 PM
Victor Raul Lopera Rendon	Unido	7/29/2021, 2:59:32 PM
CARLOS FORERO (Invitado)	Unido	7/29/2021, 3:03:37 PM

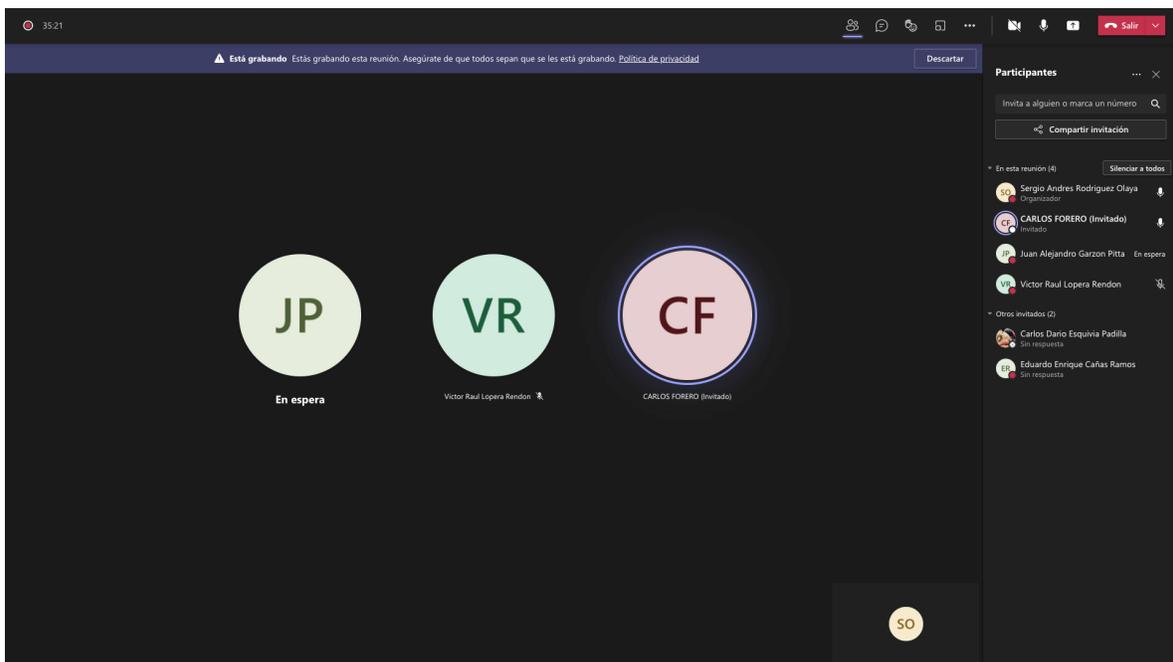

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista MVCT
Fecha: 29-07-2021
