

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 08

### DATOS GENERALES

FECHA:	03 de agosto de 2021
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 a.m. horas
LUGAR:	<b>Sesión virtual</b>
ASISTENTES:	Ing. Sildy Johana Herrera / Municipio Calima Darién Ing. Martha Bedoya / Consultoría Ing. Gabriel Valencia / Consultoría Ing. Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N.A.

### ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el formulador de proyectos, para hacer seguimiento a los compromisos de los diferentes componentes del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA Y EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE CALIMA”.

1. Contextualización
2. Seguimiento a los compromisos por componentes.
3. Conclusiones y compromisos.

### DESARROLLO:

#### 1. Contextualización

Se realiza presentación de los participantes de la reunión y se indica que se hará seguimiento a los diferentes compromisos vigentes de cada componente del proyecto en cuestión.

#### 2. Seguimiento a los compromisos por componentes.

Se indica al formulador, que el proyecto se encuentra en evaluación por requerimientos y presenta observaciones en todos los componentes, dando esto lugar a la revisión de los compromisos como se muestra a continuación:

Componente predial: se recuerda al formulador que la entrega de esta información predial debe hacerse una vez este toda la documentación completa según el alcance del proyecto. Para esto el formulador indica que ya se tienen todas las servidumbres diligenciadas y la solicitud ante la agencia con radicado, por lo que manifiestan que harán entrega de la información hoy 03/08/21.

Componente técnico

Estudio topográfico: el consultor manifiesta que se encuentran trabajando en los postprocesos, ya realizaron el trabajo de campo y se tienen los archivos rinex. Solicitan mesa de trabajo de seguimiento con el ingeniero Juan Garzón el próximo 05 de agosto del 2021.

Estudio de geotecnia: el formulador manifiesta que la ingeniera Luisa Veloza salió del país y por tanto se contrató a otro ingeniero para que finalizó el trabajo de geotecnia. Este último manifiesta que ya se hicieron las perforaciones y se tomaron las muestras, las cuales se encuentran en el laboratorio y se estima que el estudio de suelos se tenga en 3 semanas aproximadamente. Se solicita mesa de trabajo para el 24 de agosto del 2021.

Diseño eléctrico: Se pregunta al formulador sobre las observaciones de este componente y este indica que se colocaran en el proceso de contactar al ingeniero diseñador para tomar las correcciones dadas por el MVCT.

Diseño hidráulico: el formulador manifiesta que el alcance del proyecto en la parte de redes de distribución se reducirá, debido a que en último recorrido se percataron en una de las zonas contempladas en el proyecto, se realizó la construcción de una pequeña planta que ya surte el agua potable en la vereda. Debido a lo anterior, se entregará nuevamente la documentación del componente hidráulico con los ajustes requeridos.

Diseño estructural: la última entrega de documentación, se encuentra en revisión por parte del especialista del MVCT.

Componente institucional: la última entrega de documentación, se encuentra en revisión por parte del especialista del MVCT.

### **3. Conclusiones y compromisos**

Se recuerda que se hará acompañamiento del proyecto de parte del MVCT.

Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.

La mesa de trabajo fue realizada por medios virtuales.


Se puntualizaron fechas de compromiso para entrega de la documentación pendiente como se muestra a continuación

#### **COMPROMISOS**

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo topografía	Todos	05/08/21
2	Entrega documentación predial	Formulador	03/04/21
3	Mesa de trabajo Geotecnia	Todos	24/08/21
4	Entrega de diseño hidráulico	Formulador	05/08/21

**FIRMAS:**

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Johana (Invitado)	Se unió antes
неигуыи -	Se unió antes
ANDRES (Invitado)	Unido
Carlos b (Invitado)	Unido
Gabriel Valencia (Invitado)	Unido
Martha Bedoya (Invitado)	Unido
Adriana Hincapie (Invitado)	Unido

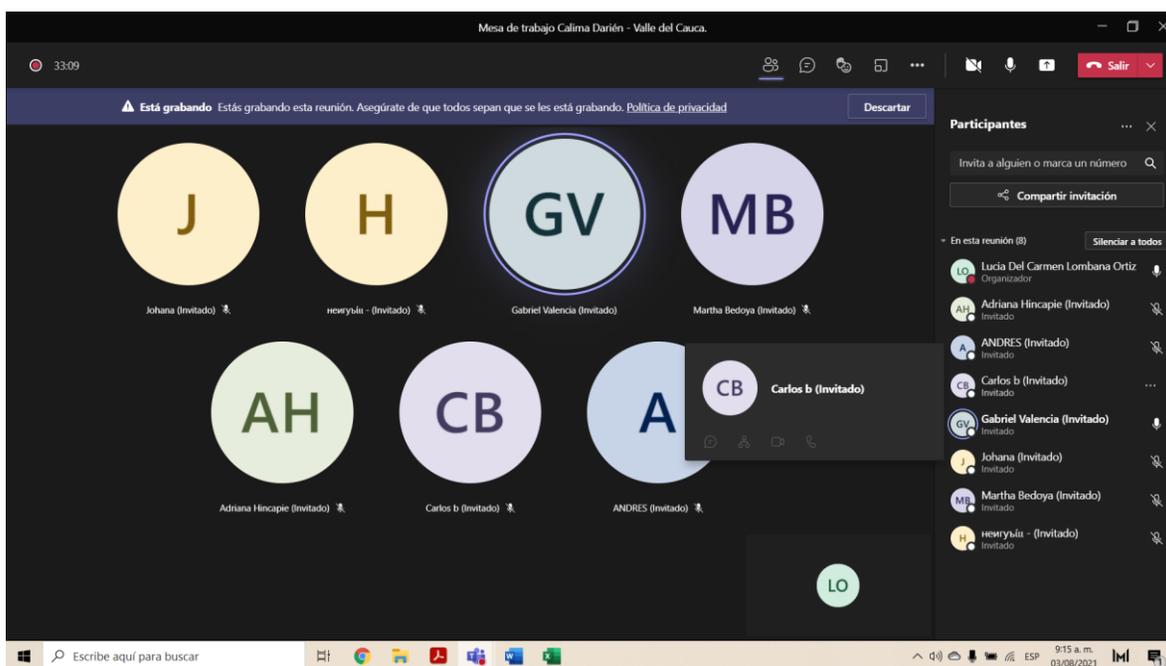

Elaboró: Lucía Lombana Ortiz / Contratista MVCT

Fecha: 03-08-2021
