

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

FECHA: Bogotá – Inírida (Guainía), 25 de octubre de 2021

HORA: De 10:00 am - 10:30 am
0 pm

LUGAR: Teleconferencia Meets

ASISTENTES:

Zayra Lara – Gerente ESCALAR - Gestora PDA Guainía
 Adolfo Rodriguez - profesional ambiental ESCALAR – PDA Guainía
 Ruby Chamorro B, Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de la matriz de seguimiento
2. Compromisos

DESARROLLO:

Mediante teleconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Guainía en lo que corresponde al seguimiento de la ejecución del Plan Ambiental cuatrienio 2020-2023, en este sentido, se trataron los siguientes puntos:


1. Revisión de la matriz de seguimiento

Se realizó la revisión de la matriz de seguimiento con la información consignada por el PDA, se realizan los siguientes comentarios:

1. Verificar los valores aprobados de los proyectos que se encuentran registrados en la matriz de inversiones del plan ambiental, pues algunos proyectos en la matriz de seguimiento tienen valores diferentes.
2. En los proyectos de la CDA existe una diferencia representativa en cuanto al valor aprobado y el valor comprometido, la razón se debe a que el valor aprobado inicialmente en el plan ambiental corresponde a la inversión definida para los departamentos de jurisdicción de la Corporación que son Guainía, Guaviare y Vaupés, sin embargo una vez definido el proyecto específicamente para Guainía el valor se reduce, es importante incluir esta observación en la casilla respectiva, además se recomienda realizar una actualización al plan ambiental una vez se cuente con la totalidad de los proyectos de la CDA en ejecución, lo anterior se requiere para que la evaluación de la ejecución del plan no se presenten estas diferencias.
3. Para el proyecto “ Apoyo en la elaboración de estudios técnicos soporte acorde a los términos de referencia para el licenciamiento ambiental y complemento para los estudios y diseños de la construcción del relleno sanitario del municipio de Barrancominas y ANM San Felipe, departamento de Guainía” se presenta una situación especial, pues la Gobernación de Guainía se encuentra adelantando el incumplimiento de una consultoría y se requiere finalizar este proceso y definir los productos que se deberán contratar en nuevo proyecto aprobado en el plan ambiental, la gerente de Escalar manifiesta que se ha realizado mesas técnicas con el acompañamiento del Grupo de Residuos Solidos del Viceministerio y la Gobernación para avanzar en el tema.
4. Se evidencia un porcentaje alto de cumplimiento del plan ambiental, los cuadros complementarios muestran los siguientes resultados:

Estado	# proyectos	%
En ejecución	9	82%
Terminado	0	0%
No ejecutado	2	18%
En contratación	0	0
Sin información	0	0%
Suspendido	0	0%
TOTAL	11	


INVERSION POR LINEA ESTRATEGICA			
LINEA	VALOR APROBADO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO
Planeación	\$ 2.572.969.409	\$ 509.300.000	\$ 133.873.143
Conservación	\$ 1.861.442.276	\$ 116.384.462	\$ 48.881.474
Saneamiento	\$ 132.200.000	\$ 132.200.000	\$ 52.880.000

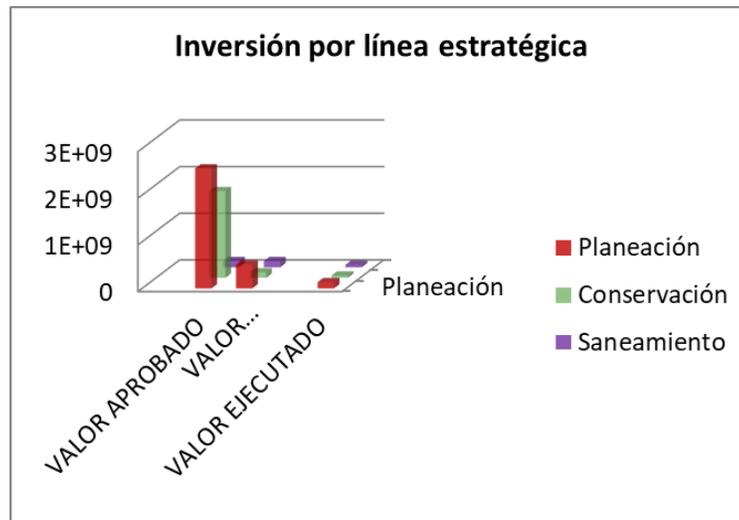

AREA DE INFLUENCIA	# proyectos	%
Rural	3	27%
Urbano	3	27%
Rural y Urbano	5	45%
Sin información	0	0%
Total	11	100%

2. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Realizar ajustes en la matriz de seguimiento	Adolfo Rodriguez	29 de octubre de 2021



Elaboró: Ruby Chamorro Bustos
Fecha: octubre de 2021
