

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de febrero de 2022
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Jorge Enrique Motta – Banco de Proyectos</p> <p>Luis Fernando Valenzuela – Consultoría del Proyecto</p> <p>Nixon Díaz – Secretaría de vías e infraestructura</p> <p>Andrés Fierro – Interventoría del proyecto</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco del seguimiento al avance en los ajustes al proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco del seguimiento al avance en los ajustes al proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS URBANIZACIÓN VILLAS DEL TESORO I Y II, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, solicitando se realice una explicación de los avances del proyecto. Indica que solamente hace falta por parte del evaluador líder, remitir los resultados de la evaluación del componente estructural del proyecto.
 - El Ingeniero Nixon Díaz, explica que la consultoría tiene conocimiento de las subsanaciones a realizar sobre el proyecto. Se hizo una mesa de trabajo, dónde se evaluaron las diferentes observaciones que se tienen para el proyecto. Se están haciendo correcciones al presupuesto, actualizaciones en el A.P.U, rendimientos en manos de obra, cotizaciones. Se realizaron solicitudes acerca de las escombreras y canteras del proyecto. Se actualiza información sobre concretos y actividades de excavación. En el transcurso de la semana, se tendrá el

presupuesto actualizado. Se ajustó el factor multiplicador y el A.I.U para el proyecto conforme a la solicitud del evaluador del componente presupuestal.

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, pregunta cómo va el avance del tema documental, ambiental, institucional y predial del proyecto. Indica que sobre el tema presupuestal, podría hacer cambios conforme a los ajustes técnicos que se observen para el proyecto.
- El Ingeniero Luis Fernando Valenzuela, comenta que se ha estado revisando el tema. Hay algunos puntos que se han estado revisando. El punto donde se va a ubicar el proyecto, es muy plano. Se pide que entre la batea de entrada y de salida de un pozo inicial, debe haber una diferencia de 20 centímetros. Se pide que debe haber correcciones a las intensidades mencionadas en el estudio hidrológico. Se considera que no va a ser fácil, acudir a esas observaciones. Comenta que hay una conexión a alcantarillado existente y que las observaciones de la hidrología son con relación a la descarga.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que sobre el componente hidrológico, se solicita información sobre caudales medios, estaciones meteorológicas y precipitaciones. De igual manera, las firmas de interventoría, consultoría y supervisión del proyecto. Recomienda la atención a las observaciones. De igual manera comenta sobre la observación acerca de la diferencia de 20 centímetros entre cota batea inicial y cota batea final de un pozo de inspección inicial, que es una recomendación del comité técnico de proyectos, la cual debe ser atendida.
- El Ingeniero Luis Fernando Valenzuela indica que de corregir la diferencia entre cota batea inicial y cota batea final, depende otra observación sobre la distancia de cota clave al terreno, la cual corresponde a Resolución 0330 de 2017 y que son difíciles de corregir para el proyecto. Se va a volver a revisar el proyecto, para realizar las correcciones correspondientes. Es un proyecto largo, y se realizaron varias iteraciones para obtener el diseño.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, invita a programar una mesa de trabajo en el dado caso que se verifique la no posibilidad de hacer los ajustes a las cotas bateas en los pozos de inspección. Indica que el Viernes 25 de febrero, se estará remitiendo la evaluación del componente estructural del proyecto.
- El Ingeniero Luis Fernando Valenzuela, indica que sobre los demás componentes del proyecto, no se tienen dudas.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, solicita se realice una subsanación final del proyecto. Los documentos deben estar firmados por supervisor, interventor y consultor.
- El Ingeniero Luis Fernando Valenzuela asume el compromiso de remitir las subsanaciones del proyecto para el 15 de Marzo de 2022.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero realiza la aclaración de que cada uno de los informes contenidos para la integralidad del proyecto, deben tener su fecha actualizada a la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda.
- El Ingeniero Luis Fernando Valenzuela, pregunta si se tuvo acceso a las memorias de cálculo.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que se tuvo acceso a las memorias de cálculo y por tanto, se realizaron las observaciones correspondientes a los cálculos numéricos. De igual manera, recomienda se aporte un documento aclaratorio de cada una de las correcciones realizadas a las observaciones realizadas por el evaluador líder y los evaluadores de apoyo.

- Explica que las intensidades, serán aclaradas en el documento aclaratorio.
- El Ingeniero Jorge Motta, indica que se está trabajando en certificaciones del municipio, para prontamente entregarlas al Ministerio de Vivienda. Comenta que se busca financiar el proyecto con recursos de CORMARGDALENA.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, reitera sean atendidas a las observaciones del componente predial e institucional.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de la evaluación del componente estructural del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	25/02/2022
2	Envío de las subsanaciones finales del proyecto	Luis Fernando Valenzuela - Consultoría del Proyecto	15/03/2022

FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Jaime Alberto Fuentes Romero	14/2/2022, 8:00:02	14/2/2022, 9:00:32	1 h	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Jaime Alberto Fuentes Romero	14/2/2022, 9:47:52	14/2/2022, 9:48:02	10 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
NIXON DIAZ (Invitado)	14/2/2022, 8:12:51	14/2/2022, 9:00:36	47 min 45 s		Moderador	
Adolfo Andrés Fierro (Invitado)	14/2/2022, 8:19:29	14/2/2022, 9:47:59	1 h 28 min		Moderador	
Jorge Motta (Invitado)	14/2/2022, 8:19:35	14/2/2022, 9:00:37	41 min 2 s		Moderador	
Jorge Enrique Motta Carvajal	14/2/2022, 8:22:22	14/2/2022, 8:22:39	17 s		Moderador	
Luis F. Valenzuela (Invitado)	14/2/2022, 8:25:44	14/2/2022, 9:00:40	34 min 56 s		Moderador	

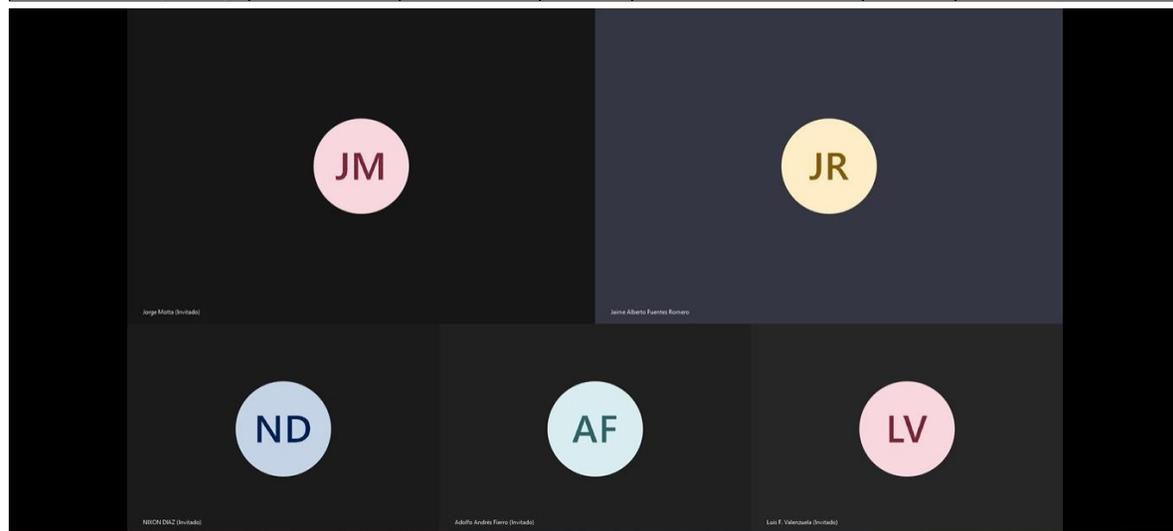

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 14-02-2022
