

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 18

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 16 de marzo de 2022
HORA:	De 14:00 a 14:38 horas y de 14:43 a 14:56 horas
LUGAR:	Virtual (Microsoft Teams)
ASISTENTES:	<p>Carlos Jair Forero, R.L. Consultoría del proyecto (ingjair938@gmail.com / aguasguajira2019@gmail.com)</p> <p>Oscar Romero, Profesional de ESEPGUA (PDA - gerenciaesepgua@gmail.com)</p> <p>Olga Celeste Mendoza, Profesional de ESEPGUA (PDA - gerenciaesepgua@gmail.com)</p> <p>Juan José Daza Marín, Profesional de ESEPGUA (PDA - gerenciaesepgua@gmail.com)</p> <p>Juan Carlos Peláez, Secretario de Planeación Municipio de Hatonuevo Departamento de La Guajira (se conectó a las 14:43* - secretariadeplaneacion@hatonuevo-laguajira.gov.co)</p> <p>Gustavo Adolfo Rambauth Ibarra, Profesional dirección de política y regulación VASB MVCT (GRambauth@minvivienda.gov.co)</p> <p>Jorge A. Beltrán Calvo, Profesional del grupo de seguimiento de proyectos Líder SDP DIDE VASB MVCT (JCBeltran@minvivienda.gov.co)</p> <p>Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder SDP DIDE VASB MVCT (srodriguez@minvivienda.gov.co)</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Antecedentes
3. Objeto de la reunión
4. Conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes. Se cuenta con asistencia de representantes de ESEPGUA (PDA), la Consultoría, evaluador del proyecto y profesionales del MVCT.

Nota: terminada la reunión se conectó el Ing. Juan Carlos Peláez de parte de la Secretaría de Planeación del Municipio de Hatonuevo La Guajira, a quien se le comentó el resultado de la reunión.

2. Objeto de la reunión: Seguimiento a los avances a los ajustes solicitados de los proyectos del asunto.

3. Intervención de los asistentes

a. El ingeniero Sergio Rodríguez cita a la reunión para solicitar información respecto a los avances del proyecto del asunto. Se procede a realizar recuento del proceso que ha surtido el proyecto a la fecha respecto al proyecto **CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA**, donde se destacó lo siguiente:

- El proyecto fue radicado por etapas, surtida la verificación de evaluación preliminar (Etapa 1) y presentación ante del comité técnico de esta verificación (Etapa 2). Este organismo autorizó continuar con la Etapa 3 (verificación detallada de los diseños), sin embargo dejaron recomendaciones y solicitudes respecto a particularidades que tiene este proyecto; el comité técnico de proyectos solicitó se tenga en cuenta y se de claridad sobre lo siguiente: La viabilidad del proyecto del asunto debe ir de la mano y ser coherente con el proyecto **OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO- BARRANCAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUO AL MUNICIPIO DE BARRANCAS**, que busca regular y legalizar las conexiones que se presentan a lo largo de la conducción y que se presente plan, acciones a corto y largo plazo, y cronograma del operador sobre acciones tendientes a identificar, solucionar y controlar la problemática sobre conexiones irregulares.
- Resultado de la verificación detallada del proyecto en septiembre de 2021 se solicitaron ajustes al proyecto y se anexaron listas de evaluación y de chequeo.
- Se han realizado mesa de trabajo donde realiza exposición de observaciones, revisiones y pendientes, al igual que se han remitido correos electrónicos al respecto.
- En últimas conversaciones con representantes de la consultoría y de la Administración Temporal quien estaba a cargo en ese entonces del proyecto, se menciona que esta pendiente la verificación por parte de la interventoría que a la fecha persiste y se desconoce cuando se realice esta; previo a la entrega y/o radicación de ajustes es necesario que los proyectos cuenten con la verificación y aprobación de la interventoría.

c. Interviene el Ing. Carlos Jair Forero (Director de la consultoría), quien expresa que las atenciones de la observaciones se han realizado y que está pendientes la verificación y que cuenta con aprobación parcial de parte de la interventoría.

d. Solicita el evaluador del proyecto al PDA que se informe respecto al estado de los contratos de interventoría.

e. Respecto al proyecto de Barrancas, que es complementario al de Hatonuevo, se comentó que por parte de la consultoría y del evaluador del proyecto que el día anterior se acompañó a reunión de seguimiento de ajustes solicitados ese (**OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO- BARRANCAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUO AL MUNICIPIO DE BARRANCAS**), y que en dicho espacio el municipio de Barrancas informó sobre la intención de financiar el proyecto con regalías del municipio y manifestaron la intención de retirar el proyecto de la ventanilla del MVCT; a lo anterior el PDA y Municipio deberán claridad al respecto, puesto que el proyecto de Barrancas debe ser aprobado para garantizar la funcionalidad del de Hatonuevo, principalmente referente a la construcción de la estación elevadora. Complementa el Ing. Carlos Jair Forero (Consultoría), que es el entendido que la intención de financiar el proyecto de conexiones irregulares en la línea de conducción de Hatonuevo incluye la construcción de la estación elevadora; sobre lo anterior también se solicitó al PDA claridad al respecto.

f. El ingeniero Sergio Rodríguez (Evaluador del proyecto) expresa que no ha recibido radicación del proyecto integral en cumplimiento de lo solicitado por la normativa. Sugiere el evaluador del proyecto a representantes del PDA que se averigüe sobre el estado de los pendientes y ajustes con que cuenta el proyecto, razón se remitirá la lista de chequeo del proyecto al PDA mediante correo electrónico.

4. En la reunión no se concreta respecto a entrega de pendientes de los proyectos del asunto, sin embargo se pretende se realice reunión de seguimiento para el día 23 de marzo de 2022.

El proyecto cuenta con observaciones de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial.

Deberá tenerse en consideración las recomendaciones realizadas por el comité de proyectos respecto a la funcionalidad del sistema.

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento a los ajustes del proyecto (Nota: a la fecha el formulador NO se ha comprometido con ajustes solicitados al proyecto)	ESEPGUA PDA, Municipio de Hatonuevo, Consultoría, interventoría, y evaluador del proyecto MVCT	23/03/2022
2	Envío de la lista de chequeo a representantes de ESEPGUA PDA	Evaluador líder del proyecto	16/03/2022

3			
---	--	--	--

FIRMAS:

Resumen de la reunión						
Número total de participantes	8					
Título de la reunión	SEGUIMIENTO A LOS AVANCES Y AJUSTES DEL PROYECTO - CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO					
Hora de inicio de la reunión	3/16/2022, 2:00:22 PM					
Hora de finalización de la reunión	3/16/2022, 2:38:22 PM					
ID. de reunión	04dfd28e-2775-4886-913d-e2676055ae43					
Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Sergio Andres Rodriguez Olaya	3/16/2022, 2:00:22 PM	3/16/2022, 2:38:22 PM	38 min	SRodriguez@minvivienda.gov.co	Organizador	SRodriguez@minvivienda.gov.co
Jorge Andres Beltran Calvo	3/16/2022, 2:00:29 PM	3/16/2022, 2:37:45 PM	37 min 16 s	JCBeltran@minvivienda.gov.co	Moderador	JCBeltran@minvivienda.gov.co
Gustavo Adolfo Rambauth Ibarra	3/16/2022, 2:00:48 PM	3/16/2022, 2:37:47 PM	36 min 59 s	GRambauth@minvivienda.gov.co	Moderador	GRambauth@minvivienda.gov.co
olga celeste mendoza	3/16/2022, 2:02:18 PM	3/16/2022, 2:35:11 PM	32 min 53 s		Moderador	
CARLOS JAIR FORERO MORALES	3/16/2022, 2:05:09 PM	3/16/2022, 2:37:28 PM	32 min 19 s		Moderador	
Oscar Romero EsepGua	3/16/2022, 2:12:24 PM	3/16/2022, 2:27:24 PM	15 min		Moderador	
ING. Juan José daza marin	3/16/2022, 2:18:36 PM	3/16/2022, 2:37:57 PM	19 min 20 s		Moderador	
Aguas Guajira 2019 (Invitado)	3/16/2022, 2:19:44 PM	3/16/2022, 2:37:48 PM	18 min 4 s		Moderador	

Resumen de la reunión						
Número total de participantes	3					
Título de la reunión	SEGUIMIENTO A LOS AVANCES Y AJUSTES DEL PROYECTO - CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO					
Hora de inicio de la reunión	3/16/2022, 2:43:13 PM					
Hora de finalización de la reunión	3/16/2022, 2:56:26 PM					
ID. de reunión	9147413e-bdb6-4143-9839-a7c24bac708d					
Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Sergio Andres Rodriguez Olaya	3/16/2022, 2:43:13 PM	3/16/2022, 2:56:26 PM	13 min 12 s	SRodriguez@minvivienda.gov.co	Organizador	SRodriguez@minvivienda.gov.co
Gustavo Adolfo Rambauth Ibarra	3/16/2022, 2:43:14 PM	3/16/2022, 2:43:19 PM	4 s	GRambauth@minvivienda.gov.co	Moderador	GRambauth@minvivienda.gov.co
Juan Carlos Pelaez -sec Planeacion	3/16/2022, 2:43:20 PM	3/16/2022, 2:56:23 PM	13 min 2 s		Moderador	

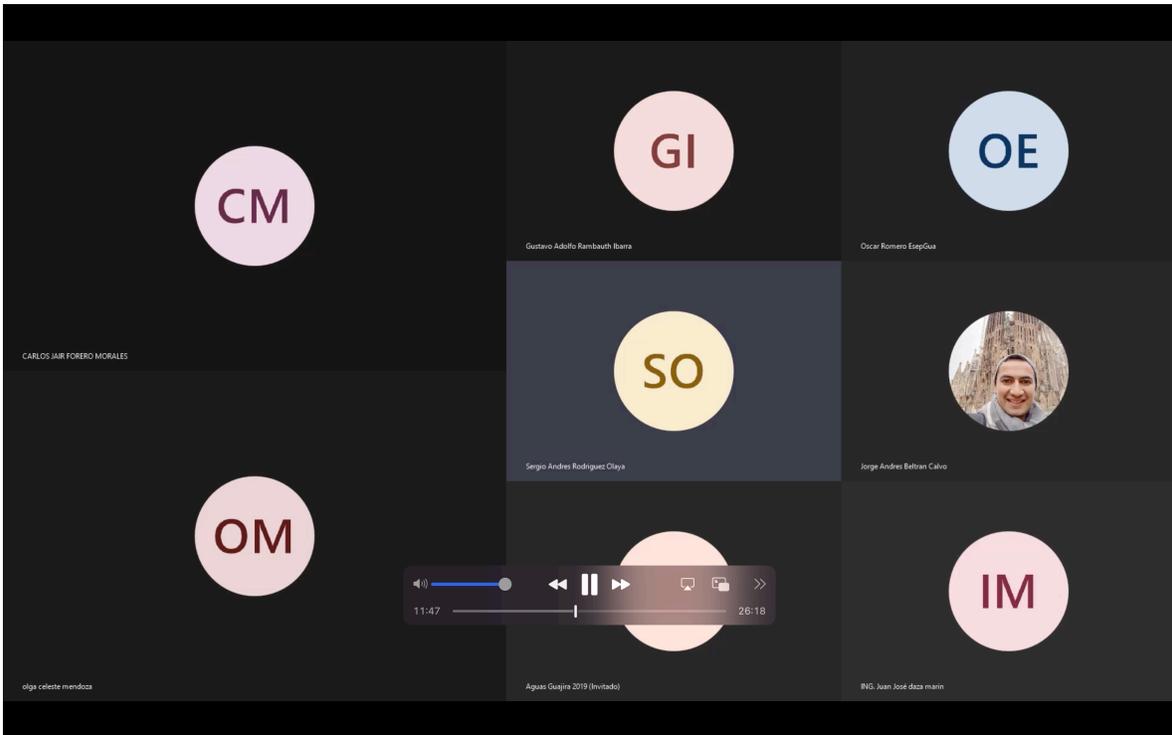

Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder SDP DIDE VASB MVCT
 Fecha: 16-03-2022
