

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO: ACTA | Versión: 6.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11/02/2022 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | Bogotá, 18 de mayo de 2022 |
| HORA: | De 10:00 a.m. a 10:30 a.m. horas |
| LUGAR: | Sesión virtual |
| ASISTENTES: | Ing. Nelcy Molano / Banco de proyectos Ing. Giovanni Romero / director de planeación Arq. Marcela Pineda / Dirección estratégica EPC Ing. Angy Baquero / ingeniera de apoyo EPC Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT |
| INVITADOS: | N/A. |

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el formulador, para informar ajustes realizados al trazado y alcance del proyecto; “CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MESA”.

1. Contextualización.
2. Ajustes y cambios en alcance del proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

El proyecto “CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MESA”, se encuentra en evaluación por requerimientos, y debido a que el proyecto no cuenta con la documentación ajustada y completa de todos los componentes, se está a la espera de que la entidad formuladora indique que se cargó la documentación ajustada para proceder con la evaluación de cada componente. En la presente mesa de trabajo se aclarará el alcance del proyecto y se indicará que información se encuentra ajustada para su posible revisión.

2. Seguimiento a compromisos.

La ingeniera Lucia Lombana, inicia mesa de trabajo indicando que el objetivo de la reunión es socializar los ajustes y alcance del proyecto por parte de la entidad formuladora EPC, para así poder seguir con el proceso de evaluación del proyecto del municipio de La Mesa Cundinamarca.

De acuerdo con lo anterior, la Arq. Marcela Pineda manifiesta que procederán con la proyección de un plano general del proyecto, y que, debido a condiciones prediales con la

comunidad de la zona, se realizaron varios cambios con el objeto de reducir las servidumbres y/o autorizaciones de paso necesarias para el trazado del proyecto.

La ing. Angy B. procede con la presentación del plano del trazado final del colector a construir en el sector el cucharal. A su vez la Arq. Marcela P. va indicando los ajustes realizados al trazado del colector, al cual se le eliminaron dos ramales ubicados en predios de futura expansión, puesto que serán tenidos en cuenta en una segunda fase del proyecto junto con el sector La Carbonera (el cual a la fecha tiene complicaciones prediales), dejando claro de esta manera que el alcance del proyecto se limita solo al colector sanitario principal del sector El Cucharal en el municipio de la Mesa Cundinamarca, el cual inicia en un pozo nuevo y finaliza en un pozo de inspección existente, conectándose de esta forma a la red de alcantarillado del casco urbano del municipio. Además, se indica la zona donde estará ubicado el paso elevado y los 3 predios implicados en esta zona del proyecto.

Por otro lado, el formulador indica que no se tiene aun el presupuesto del proyecto finalizado y por tanto no se han diligenciado los formatos nuevamente. La ing. Lucia L., indica que el presupuesto se dejará de ultimo con la parte documental, mientras se puede ir adelantando la evaluación de los demás componentes del proyecto. La Arq. Marcela P., manifiesta que el presupuesto ya había sido evaluado por la ing. Mayra M. del MVCT en el año 2020, para lo cual la ing. Lucia L. indica que debe ser revisando nuevamente debido al cambio en el alcance del proyecto y el cambio de año de vigencia.

En cuanto al componente predial, EPC manifiesta que se está en el proceso de consecución de la documentación predial faltante, entre estas los certificados de tradición y libertad, el formato 8 y las autorizaciones de paso. De estas últimas el ing. Giovanni Romero del municipio informa que ya las tienen en sus manos y estas serán remitidas a EPC para su entrega al MVCT.

En cuanto al componente técnico, la ing. Angie B, manifiesta que el estudio de geotecnia y la topografía ya que encuentran ajustados y cargados en el One drive del proyecto listos para su revisión. En cuando al diseño hidráulico la Arq. Marcela P, solicita se haga la revisión de la documentación cargada, teniendo en cuenta la eliminación de los 2 ramales, puesto que esto esta pendiente por eliminar de dicha documentación. Por último, del diseño estructural hacen falta las memorias de pozos de inspección, por tanto, esta información deberá ser entregada para poder ser revisada por el especialista del MVCT.

Por último, con relación al componente ambiental, el formulador manifiesta que ya fue cargaron el PSMV aprobado por la autoridad ambiental, por tal razón no se tiene inconvenientes, al igual que la documentación del componente institucional que fue cargada al One drive del proyecto y puede ser compartida al especialista para su revisión.

3. Conclusiones y compromisos

Se concluye que la información predial ajustada será entregada el próximo 19 de mayo de 2022 y la documentación del diseño estructural de los pozos el 23 de mayo de 2022.

Se realizarán mesas de trabajo de seguimiento al estudio geotécnico y al diseño hidráulico con los especialistas, una vez sea revisada dicha información.


Se recuerda que se hará acompañamiento del MVCT en el proceso de evaluación del proyecto. La mesa de trabajo se realizó por los medios virtuales disponibles.


COMPROMISOS

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | Entrega de información predial | EPC | 19/05/22 |
| | Entrega de información estructural | EPC | 23/05/22 |
| 2 | Mesa de trabajo. | Todos | Fecha abierta. |

FIRMAS:

| Nombre completo | Acción del usuario | Marca de tiempo |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Lucia Del Carmen Lombana Ortiz | Unido | 18/5/2022, 10:00:18 a. m. |
| Nasly Yaritza Morales Rey | Unido | 18/5/2022, 10:00:19 a. m. |
| Planeación La Mesa (Invitado) | Unido | 18/5/2022, 10:00:19 a. m. |
| NELSY MOLANO (Invitado) | Unido | 18/5/2022, 10:00:19 a. m. |
| MARCELA PINEDA (Invitado) | Unido | 18/5/2022, 10:00:37 a. m. |

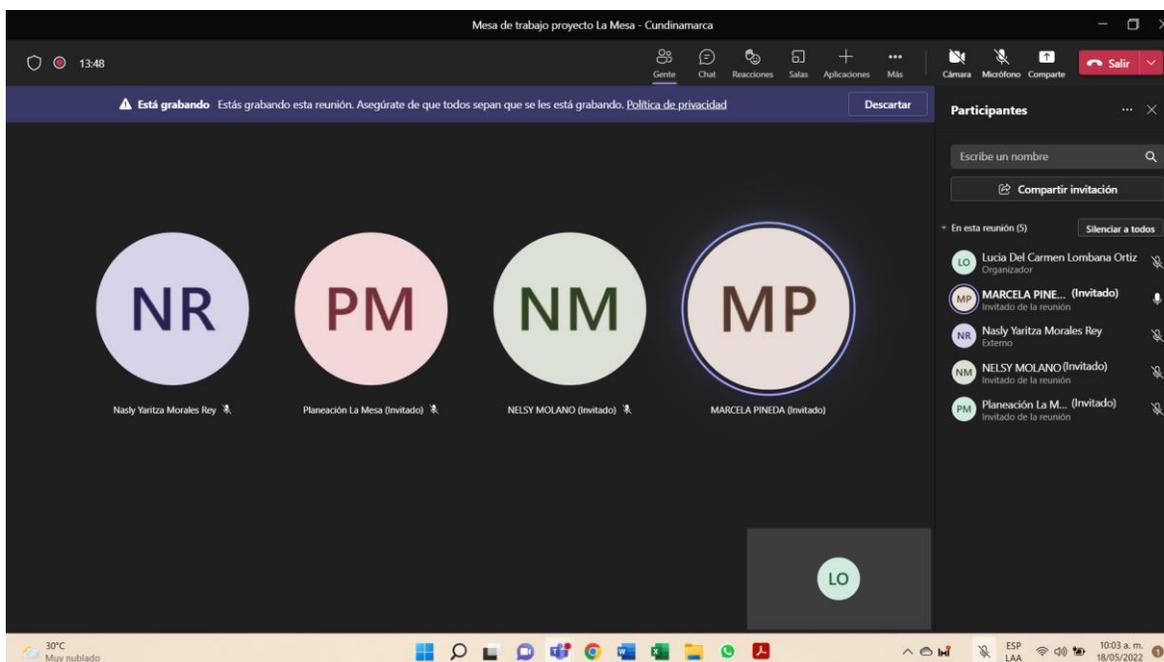

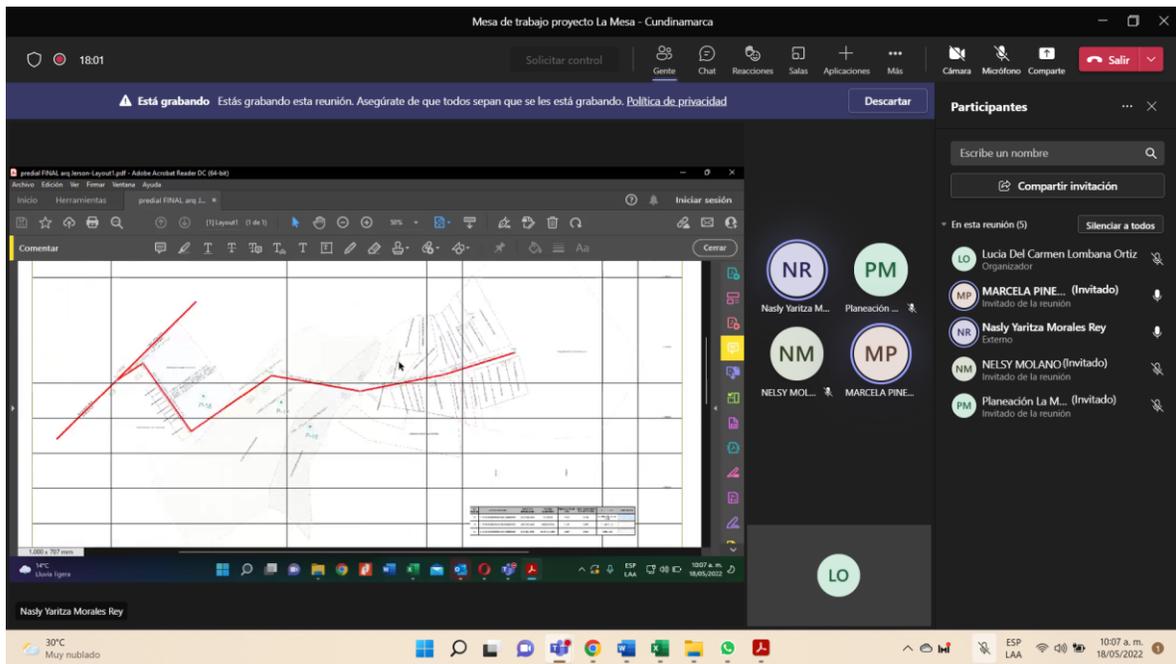

DATOS DEL CONSULTOR

Nombre: Empresas públicas de Cundinamarca EPC

Contacto: Arq. Marcela Pineda

Cel. 316 4533485

Correo: Marcela.pineda@epc.com.co

Elaboró: Lucía Lombana Ortiz / Contratista MVCT

Fecha: 18-05-2022
