

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 08 de noviembre de 2022
HORA:	De 10:00 a.m. a 10:40 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Angelica Ricardo Chejne / secretaria de planeación y obras públicas. Yuberney Romero / Consultoría Sebastián Yepes / Consultoría Ing. Lucia Lombana Ortiz / profesional VASB MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para realizar seguimiento al proyecto; *“CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS MATA DE CAÑA, RONDO, COREA Y CAÑO PESCADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL, CÓRDOBA”*.

1. Presentación y contextualización.
2. Seguimiento al proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Presentación y contextualización

Se recuerda al ente formulador que los proyectos “CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS MATA DE CAÑA, RONDO, COREA Y CAÑO PESCADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL, CÓRDOBA”, se encuentra en evaluación por etapas y tiene requerimiento de ajustes desde el mes de abril del 2022, por tanto, se solicitó la mesa de trabajo para realizar seguimiento al avance pues no se han recibido ajustes al proyecto.

2. Seguimiento al avance del proyecto.

La ing. Lucia Lombana evaluadora líder del proyecto, inicia la mesa de trabajo manifestando que el objeto de esta es realizar seguimiento al avance del proyecto, ya que a la fecha no se han recibido ajuste y/o subsanaciones, y la entidad formuladora cuenta con las observaciones de la evaluación preliminar etapa 1 desde el mes de abril del presente año.

Además, se hace un pequeño recuento de las observaciones más relevantes dadas al municipio en la última mesa de trabajo realizada. Por otro lado, se consulta a la secretaria de planeación del municipio de Ayapel, cuales han sido los avances en los componente predial, ambiental, técnico e institucional. Para lo cual la ing. Angelica secretaria del

municipio informa que, en cuanto al componente predial, el municipio NO cuenta con los predios legalizados a su nombre, puesto que estos son terrenos rurales y se debe hacer el proceso de titulación de estos a través de la Agencia Nacional de Tierras ANT. La ing. Lucia pregunta si necesitan asistencia de alguno de los abogados del MVCT para sacar adelante el componente, para lo cual la ing. Angelica manifiesta que hará la consulta a los jurídicos del municipio en informará sobre el tema. La ing. Lucia Lombana Propone mesa de trabajo de seguimiento al tema el próximo 22/11/22.

En cuando a los ajuste del componente técnico, el ing. Yuberney R. de la consultoría, informa que ya se tienen ajustado la información de horizonte de diseño del proyecto, diseños del pozo, estudio geo-eléctrico del pozo y el diseño hidráulico. La entrega la harán hoy 08/11/22.

Por otro lado, en cuanto a los permisos ambientales, la ing. Angelica indica que se solicitaran a la CVS una vez se tenga la parte técnica del proyecto ajustada. La ing. Lucia L., informa que todos los proyecto deben tener aprobados por la autoridades ambientales componentes los permisos ambientales que cada proyecto requiera, para poder obtener ya sea concepto favorable sin financiación o viabilidad.

Por último, en cuando al componente institucional, la ing. Angelica indica que serán unas juntas de acción comunal las que asuman la operación del sistema planteado, por tanto, se les solicita la entrega de la documentación relacionada a estas juntas.

Nota: se informa a la entidad formuladora, que la documentación ajustada debe ser radicada ante el MVCT y se enviará correo electrónico con el enlace de radicación.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Se realizará mesa de seguimiento el 22 /11/22 (temas: predial, institucional y permisos ambientales).

Entrega de información hidráulica ajustada el 08/11/22.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.

Se enviará nuevamente enlace One drive al formulador para el cargue de la última versión del proyecto.


La mesa técnica se realizó por los medios virtuales disponibles.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de documentación hidráulica	Municipio / consultor	08/11/22
2	Mesa de trabajo de seguimiento	Todos	22/11/22

FIRMAS

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	8/11/22, 10:07:32 a. m.	8/11/22, 10:36:31 a. m.
SEBASTIAN YEPESG	8/11/22, 10:19:07 a. m.	8/11/22, 10:36:23 a. m.
Angelica Richardo Chejne- Planeacion Ayapel	8/11/22, 10:21:10 a. m.	8/11/22, 10:29:13 a. m.
Yuberney Romero	8/11/22, 10:28:35 a. m.	8/11/22, 10:36:25 a. m.

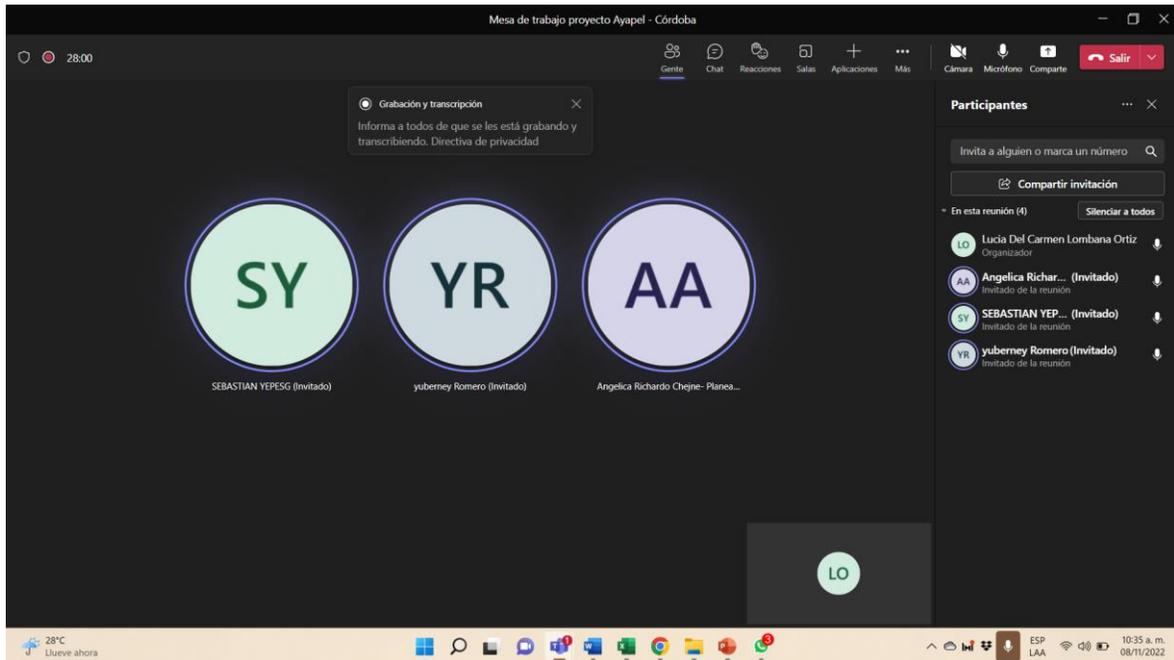

DATOS DEL CONSULTOR

Nombre: Yuberney Romero

Correo: yuberney7896@hotmail.com - syepesg@hotmail.com

Cel: 3104487032

Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT

Fecha: 08-11-2022
