

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 15

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 05 de diciembre de 2022
HORA:	De 10:00 a.m. a 10:45 a.m.
LUGAR:	Sesión virtual.
ASISTENTES:	Ing. Sebastián González /director de Proyectos y Planificación estratégica de la Secretaría de Planeación Municipal Ricaurte. Ing. Mónica Garzón / EPC. Ing. Mayra Martínez / Evaluadora de presupuestos - VASB Ing. Jonh Marroquín / Evaluador de presupuestos - VASB Ing. Lucía Lombana / VASB - Líder de Evaluación
INVITADOS:	Sin invitados

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada, para socializar observaciones del presupuesto del proyecto; *“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA”*.

1. Contextualización.
2. Observaciones presupuestales.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización y alcance del proyecto.

El objetivo de la reunión es socializar observaciones del presupuesto del proyecto *“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA”*.

2. Observaciones presupuestales.

La evaluadora líder inicia la mesa de trabajo indicando que el objetivo es revisar puntualmente una observación de la última versión del presupuesto que se deben aclarar para que se pueda otorgar el visto bueno al componente y proceder con la presentación del proyecto ante el comité técnico de proyectos del VASB.

Se procede con la presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, tanto de parte del ministerio, como del municipio y EPC.

Seguidamente se inicia con la socialización de las observaciones por parte de la ing. Mayra Martínez, como se relacionan a continuación:

Alcance del proyecto: Inicialmente se aclara a la ing. Mayra M., el alcance del proyecto, donde se indica que este contempla línea de impulsión, redes principales de distribución, un tanque de almacenamiento y la optimización de la estación de bombeo.

Acometidas: La ing. Mayra M., pregunta si el proyecto contempla acometidas en su alcance, para lo cual el ing. Sebastián G., indica que con este proyecto se esta solo gestionando la inversión de la optimización de la red principal, indicando entonces que la acometida la garantizaría la empresa prestadora del servicio Acuagyr S.A.

Lo anterior, porque el proyecto consiste en cambiar diámetros y material de la red matriz existente de PVC a PEAD, se informa que a este red están conectados los suscriptores actuales. Debido a esto la ing. Mayra M., indica que, si es importante que se contemplen las acometidas en el proyecto, ya que esto garantiza la funcionalidad y finalidad del proyecto. El ing. Sebastián manifiesta que el tema se ha hablado con el gerente de Acuagyr S.A., sin embargo, si se debe tener en cuenta en el presupuesto, no se tiene inconveniente en agregarlo.

La ing. Mayra recomienda realizar consulta, por tanto, la Ing. Lucia L., realiza llamada al ing. Eduardo para consultar sobre el tema. Como respuesta a la consulta, la ing. Lucia L., manifiesta que se deben ingresar las acometidas al presupuesto, ya que el proyecto debe contemplarlo para evitar futura complicaciones de varios contratistas y garantizar la funcionalidad del sistema.

Por otro lado, la ing. Mayra M., se consulta sobre el acceso al proyecto, el ing. Sebastián manifiesta que el proyecto lleva mucho tiempo y se empezó a reestructurar, por tanto, se indica que en su momento el proyecto fue revisado con el ing. Jonh M., y se ajustó. Por tanto, no se requiere otro tipo de transporte y no se tienen problema de accesibilidad.

Accesorios: la ing. Mayra manifiesta que se tienen en el presupuesto aproximadamente 1000 millones en uniones y accesorios, y si es por termofusión no se requiere. EL ing. Sebastián indica que exactamente no se requieren estos tipos de accesorios. Se llega a la conclusión de que se eliminaran estos ítems del presupuesto.

El ing. Jonh M., manifiesta que se va a modificar el presupuesto por parte del MVCT. Con el fin de agilizar se deben identificar el número de usuarios para agregar el número de acometidas. El ing. Sebastián indica que son 2.235 usuarios conectados a la red actualmente.

Entibados: se pregunta si se necesita el entibado contemplado. El ing. Sebastián manifiesta que se va al ras entre los linderos y el borde de las vías y se contemplaron para evitar problemas con las vías, manifiesta que se eliminaron una parte de entibados.

Perforación horizontal: se indica que son para la tubería de 63 mm, se indica que esta corta la descripción. Se debe hacer sobre vía concesionada y por tanto no se puede hacer zanja.

Certificaciones: Se entrega certificación de escombreras ubicada en melgar a 35 km. Se solicita revisar si se tienen las certificaciones.

Lista de precios y Cotizaciones: el ing. Sebastián manifiesta que no ha podido obtener las cotizaciones faltantes, ya que se han realizado antes y en esta ocasión no responden los proveedores. Las cotizaciones que se tienen son del año 2021. Faltan las cotizaciones de los accesorios nuevos. La ing. Mayra indica que si se necesitan las cotizaciones de los materiales pétreos. El ing. Sebastián indica que esas se pueden tener hoy mismo.

3. Conclusiones y compromisos

El municipio conseguirá las cotizaciones faltantes al presupuesto.

Se realizarán los ajustes necesarios al presupuesto.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.



La mesa técnica se realizó de forma virtual.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de cotizaciones actualizadas.	Ing. Sebastián del Municipio	06/12/22

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida
Mayra Alejandra Martínez Lopera	5/12/22, 10:01:26 a. m.	5/12/22, 10:39:53 a. m.
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	5/12/22, 10:01:45 a. m.	5/12/22, 10:40:01 a. m.
Sebastián González	5/12/22, 10:02:14 a. m.	5/12/22, 10:39:50 a. m.
Mónica Garzón B (Invitado)	5/12/22, 10:02:52 a. m.	5/12/22, 10:39:53 a. m.
Jonh Jair Marroquín Saavedra	5/12/22, 10:12:28 a. m.	5/12/22, 10:28:04 a. m.
Jonh Jair Marroquín Saavedra	5/12/22, 10:33:46 a. m.	5/12/22, 10:39:44 a. m.
Mónica Garzón	5/12/22, 10:30:15 a. m.	5/12/22, 10:37:07 a. m.

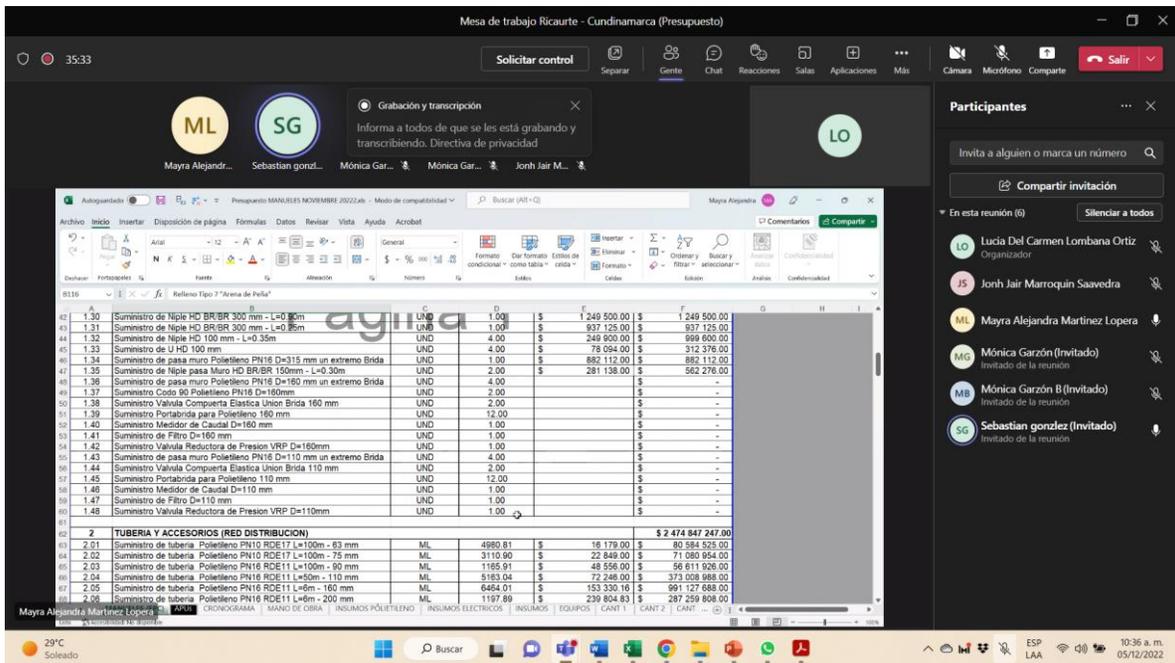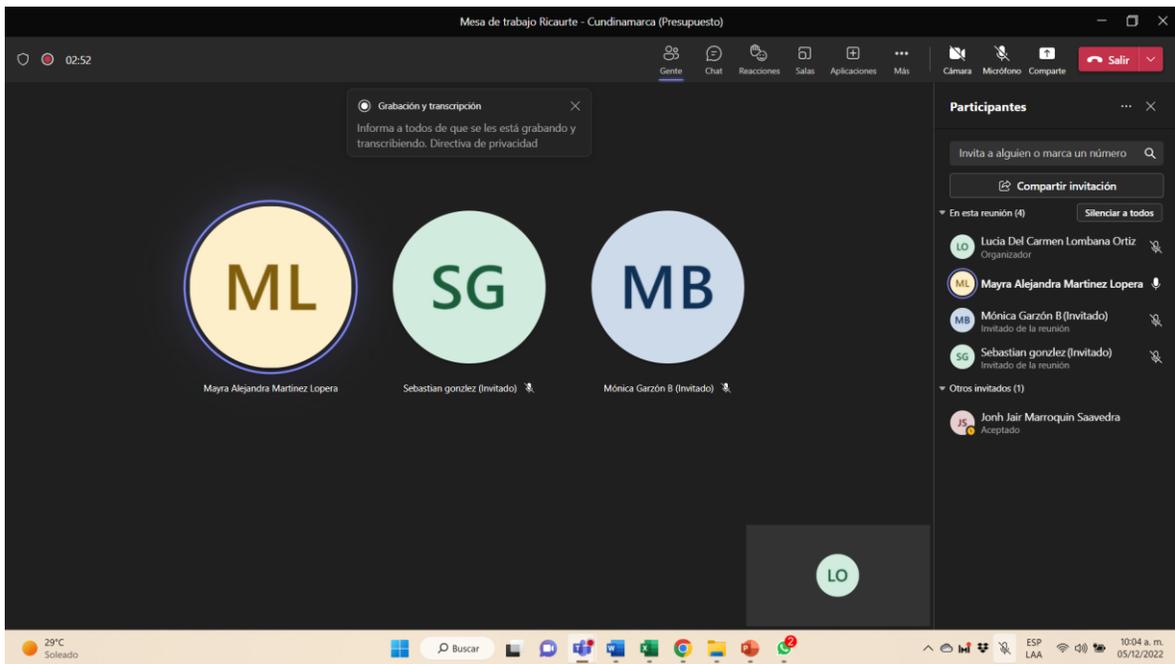

Elaboró: Lucía Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 05-12-2022
 Anexos: ninguno.
