

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE SEGUIMIENTO 09/12/2022

DATOS GENERALES

FECHA:	9 de diciembre de 2022
HORA:	De 2:00 pm a 3:30 pm 1 ½ horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>Maria Fernanda Cortes Salguero, Despacho del Viceministro de Agua. MVCT.</p> <p>German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT</p> <p>Herlin Mosquera - Alcalde del Río Quito</p> <p>Jhon Freddy Palacios Rodríguez, Secretario de Infraestructura y Obras, Municipio De Rio Quito, infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co, jhonfregar@gmail.com, 3206537560</p> <p>Marisol Rodríguez, Asesora del Alcalde, Municipio De Rio Quito, maro_r_p@hotmail.com, 3164622379</p> <p>Darwin Desay Palacios Rodríguez, Municipio De Rio Quito, desay98@gmail.com, 31272728064.</p> <p>Yossi Arley Santos Santos, Municipio De Rio Quito, yossisantos92@gmail.com, 3137984168.</p> <p>José Noel Palacios</p> <p>Luis López</p> <p>Denice Martínez Mena</p> <p>Andoni Garcia</p>
INVITADOS:	<p>desay98@gmail.com</p> <p>yossisantos92@gmail.com</p> <p>infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co</p> <p>wilmer.gomez@epm.com.co</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento de acuerdo a los compromisos del Viceministro para revisar los avances de los proyectos: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE VILACONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO-CHOCÓ y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL

CORREGIMIENTO DE VILACONTO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO –
CHOCO, con la asistencia de la Alcaldía y su equipo formulador.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el viernes 9 de diciembre de 2022, iniciando a las 2:00 p.m., con la finalidad de observar el estado de los proyectos CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE VILACONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO-CHOCÓ y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE VILACONTO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO - CHOCO.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes por parte de la Asesora del Viceministro la Doctora Cortes, quien manifiesta que estos proyectos son prioritarios para el MVCT, por lo cual se quiere observar el desarrollo de los mismos y realizar seguimiento sobre ellos.

Posteriormente el Ingeniero Naranjo presenta el estado de los proyectos los cuales al momento se encuentran en evaluación sobre los que ya se han presentado observaciones que están siendo atendidas por la Entidad Territorial, se comenta las dificultades para la consecución de profesionales en topografía y geotecnia que realizaran las actividades de complementación a los diseños para el cumplimiento normativo, ante lo que la Entidad Territorial manifiesta que ya fueron contratados y están elaborando los estudios correspondientes. Se comprometen en remitir la información correspondiente a Topografía subsanada para la semana del 16 de diciembre, y la geotecnia para el 20 de diciembre ya ambas con el aval de la interventoría.

Sobre el componente predial manifiestan que ya se entregaron subsanaciones, el Ingeniero Naranjo reporta que ya están en posesión de la Especialista del MVCT y se espera la siguiente semana presentar las observaciones.

Sobre el componente Institucional manifiestan que están pendientes de definiciones técnicas para su terminación, pero que están trabajando de manera paralela a los demás componentes y que lo presentarían la próxima semana, para el 16 de diciembre, quedando pendiente la coordinación de una mesa de trabajo.

Sobre los componentes de hidráulica y estructuras que requieren los estudios de suelos y geotecnia para su desarrollo indican que estos demorarían unos 10 a 30 días en ser remitidos luego de la entrega de geotecnia, lo que darí como fecha estimada el 20 de enero de 2023.

Sobre el componente presupuestal se entregaría una semana después de tener los vistos buenos de los componentes técnicos, ya terminando enero y la parte documental una semana después del visto bueno de presupuestos.


Por ultimo el Señor Alcalde indica que se comprometen a remitir la información en el menor tiempo posible, con lo que se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las subsanaciones de topografía.	Entidad Territorial	16/12/2022
2	Remitir las subsanaciones de geotecnia	Entidad Territorial	20/12/2022
3	Remitir las subsanaciones de hidráulica y estructuras	Entidad Territorial	20/01/2023
4	Coordinar mesa de trabajo Institucional	Entidad Territorial	16/12/2022

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunion evidenciando la presencia de los asistentes:

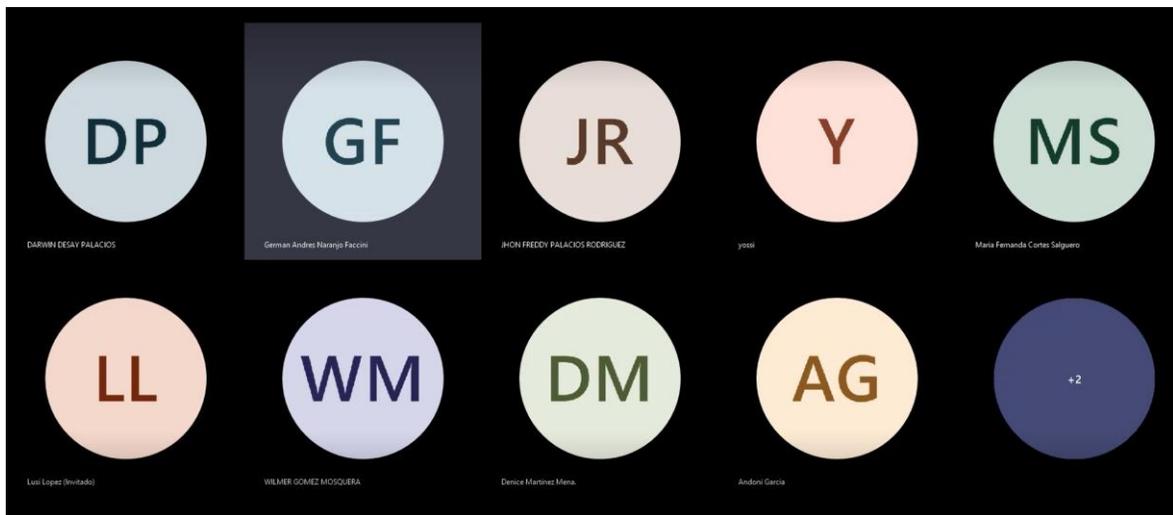

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 20-12-2022
