

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE SEGUIMIENTO 20/01/2023

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de enero de 2023
HORA:	De 2:00 pm a 4:00 pm 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT</p> <p>Darwin Desay Palacios Rodríguez, Municipio De Rio Quito, desay98@gmail.com, 31272728064.</p> <p>Yossi Arley Santos Santos, Municipio De Rio Quito, yossisantos92@gmail.com, 3137984168.</p> <p>José Noel Palacios</p> <p>Pablo Velásquez</p> <p>Denice Martínez</p> <p>Jorge Danis Escobar Lloreda</p>
INVITADOS:	<p>desay98@gmail.com</p> <p>yossisantos92@gmail.com</p> <p>infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co</p> <p>jorge-escobar3@upc.edu.co</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento para revisar las fechas programadas de entrega de los proyectos: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE VILLACONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO-CHOCÓ y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE VILLACONTO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCO, con la asistencia del equipo formulador.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 14 de febrero de 2023, iniciando a las 2:00 p.m., con la finalidad de revisar el estado de las entregas según los compromisos definidos por la Entidad Territorial responsable de los proyectos CONSTRUCCIÓN DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO-CHOCÓ y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE VILLAGONTO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO - CHOCO.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes por parte del Ingeniero Naranjo, quien indica que ya se han entregado subsanaciones de los componentes de suelos e institucional, los cuales están en proceso de revisión. manifiesta que estos proyectos son prioritarios para el MVCT, por lo cual se quiere observar el desarrollo de los mismos y realizar seguimiento sobre ellos. Se realiza la solicitud por parte de los formuladores de programar una mesa de trabajo con la especialista del MVCT una vez esta analice la entrega realizada, lo cual se coordinará en su momento.

Posteriormente el Ingeniero Naranjo indica que los compromisos de entrega no se han cumplido, ante lo que el formulador indica que los componentes de hidráulica, topografía, eléctricas, serán remitidos al MVCT el 17/02/2023, en esta fecha también se comprometen a indicar la fecha en que se entregaría los componentes de estructuras y presupuestos, el cual se considera que con una semana posterior a estructuras se entregaría.

Sobre el componente predial el formulador indica que al momento no se ha recibido respuesta del oficio remitido al IGAC, se continua en espera de esta información.


Con lo cual se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las subsanaciones de los componentes de: hidráulica, energía, topografía.	Entidad Territorial	17/02/2023
2	Informar cuando se entregan las subsanaciones de estructuras y presupuestos	Entidad Territorial	17/02/2023
3	Coordinar mesa de trabajo Suelos	MVCT	17/02/2023

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:

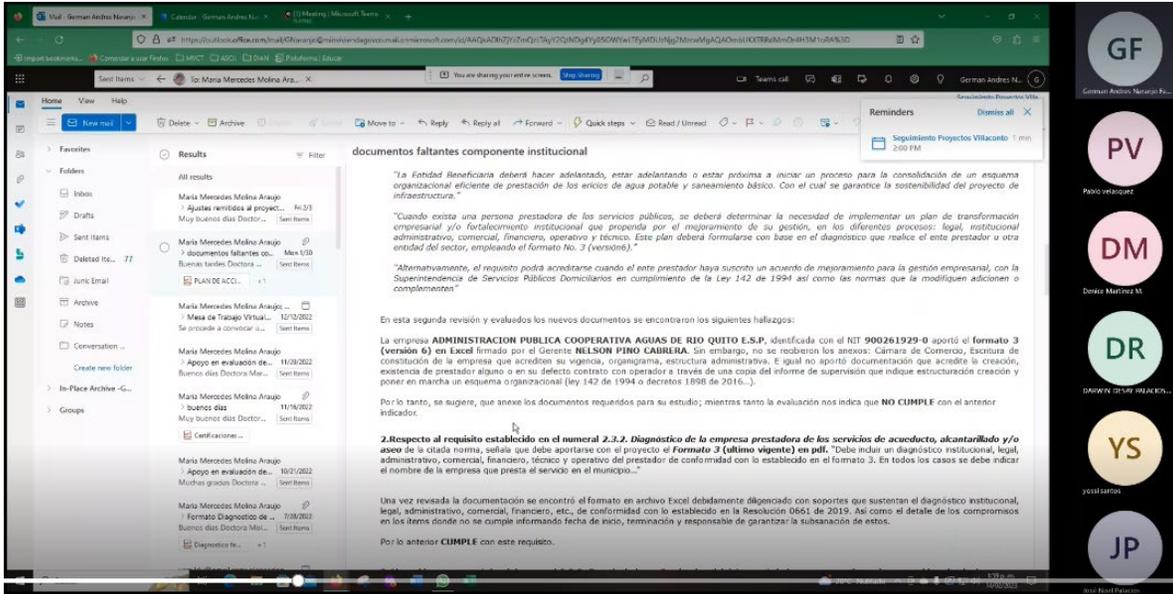

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 15-02-2023
