

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 17 – Seguimiento General

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de febrero de 2023
HORA:	De 2:00 pm a 4:00 pm, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo F. Evaluador Líder, Grupo de Evaluación MVCT.</p> <p>Gloria C. Palacios, Alcaldesa del Municipio de Tibasosa.</p> <p>Efraín Arias G., Gerente E.M.T. Municipio de Tibasosa.</p> <p>Hector Matamoros, Consultor, Especialista Hidráulico del proyecto</p> <p>Silvana Combita, Ingeniera, Ambiotec, Consultoría del Proyecto, AMBIOTEC MCHC.</p>
INVITADOS:	<p>secobraspublicas@tibasosa-boyaca.gov.co</p> <p>alcaldia@tibasosa-boyaca.gov.co</p> <p>hector.matamoros@matamoroscharry.com</p> <p>gerenciaambiental@ambiotec.co</p> <p>jorgecaro1@hotmail.com</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de seguimiento sobre el estado actual del ajuste y complementación al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA” para la revisión del avance del proceso de ajuste por parte de la Entidad Territorial responsable del proyecto.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 22 de febrero de 2023, iniciando a las 2:00 p.m. Esta mesa tiene la finalidad de realizar el seguimiento al estado de avance al proceso de subsanación de las observaciones presentadas por el MVCT al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA”, con la asistencia de la Alcaldesa, el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos y la consultoría del proyecto.

La reunión inicia con el saludo a los asistentes, luego de lo cual se procede a revisar el estado de cada componente del proyecto, iniciando por el componente de energía que había quedado el compromiso de entrega el 16/02/2023 (cotizaciones y especificaciones) la consultoría informa que no ha podido terminar y se compromete a entregar el 24/02/2023. Continúa el componente de suelos del cual el MVCT el 22/02/2023 remitió observaciones al componente y del cual aun esta pendiente el plano de localización de sondeos, se coordina durante la mesa una reunion especifica de este componente el

23/02/2023 iniciando a las 10:00 am; sobre el componente de estructuras queda pendiente para ver si se afecta luego de la mesa del 23/02/2023 de suelos, pendiente aun de entrega. Sobre los componentes de Topografía, Hidráulica, Predial e Institucional se indica que a mas tardar el 23/02/2023 serán entregados al MVCT. Sobre el componente documental este queda pendiente del visto bueno sobre el presupuesto. Tanto la Alcaldía como el Ministerio solicitan a la Consultoría que no mueva mas las fechas de entrega.


Se deja el compromiso de hacer una mesa de seguimiento el 1 de marzo de 2023, con lo cual se da por terminada la reunión. Dejando la nota de que cualquier duda se pueden comunicar directamente con el Ingeniero Naranjo para tener el tratamiento oportuno.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la información ajustada del componente de energía.	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	24/02/2023
2	Entregar la información ajustada de los componentes de Topografía, Hidráulica, Predial, Institucional.	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	23/02/2023

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.

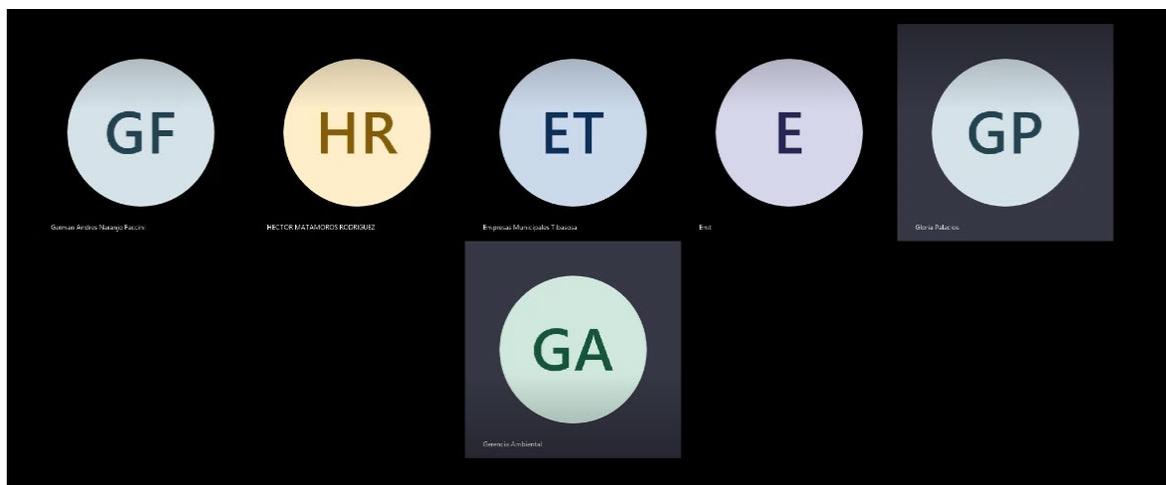

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 22-02-2023
