

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC- F-01

## ACTA No. 07

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de marzo del 2023
HORA:	De 03:00 p.m. a 03:40 p.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Roberto Reino Vargas / Ingeniero Consultor. Ing. Jorge Córdoba / secretario de obras públicas. Ing. Lucia Lombana Ortiz / evaluadora VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

### ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para realizar seguimiento al avance y compromisos del proyecto; *“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”*.

1. Contextualización.
2. Seguimiento al proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

### DESARROLLO:

#### 1. Contextualización

Se indicó al formulador que el proyecto *“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”* está siendo revisado según lo indicado en la Resolución 0661 de 2019, y que en la presente mesa de trabajo se realizará seguimiento al avance del proyecto y a los compromisos vigentes.

#### 2. Seguimiento al proyecto

La ing. Lucia Lombana evaluadora líder del proyecto, inicia la mesa de trabajo indicando que el objetivo de esta es realizar seguimiento al avance y compromisos del proyecto *“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”*, como se menciona a continuación.

- i. Diseño hidráulico: se pregunta al consultor y municipio como van con los ajustes que se deben realizar al diseño hidráulico del proyecto, con relación a los diámetros de diseño de 8” y 10” y caudales de diseño, puesto que las relaciones  $y/D$  y  $Q/Q_0$  son muy bajas, según el diseño hidráulico presentados del proyecto. Además se recuerda a la entidad formuladora allegar los planos de diseño completos y firmados, a nivel de ingeniería de detalle. Para esto el consultor se compromete a entregar la documentación completa el próximo 23

de marzo de 2023. Se recomienda a la entidad formuladora entregar los planos a nivel de detalle de ingeniería con toda la información de las cotas de los pozos.

- ii. Interventoría: se consulta al municipio como han avanzado el tema de la interventoría del proyecto, ya que a la fecha no se tiene con un aval de interventoría a los diseños del proyecto, para lo cual el ing. Jorge secretario del municipio de Sahagún manifiesta que en 15 días se tiene respuesta sobre la contratación de esta interventoría.
- iii. Institucional: la ing. Lucia L., manifiesta que se hace necesario que la entidad formuladora allegue la información institucional lo mas pronto posible, para que esta pueda ser evaluada por los especialistas del componente. El ing. Jorge manifiesta que hará la solicitud de la información a las personas encargadas de la entidad prestadora del servicio.
- iv. Suelos: se indica a la entidad formuladora que se deben allegar los ajustes del estudio de suelos y geotecnia del proyecto ajustado a las ultimas observaciones enviadas a la entidad. El ing. Roberto R., de la consultoría, manifiesta que harán llegar hoy mismo la información, puesto que esta ya se tiene.
- v. Topografía: se indica a la entidad formuladora que se deben allegar los ajustes de la topografía de acuerdo con las últimas observaciones entregadas a la entidad. El consultor se compromete a entregar la topografía del proyecto el próximo 23 de marzo de 2023.
- vi. Estudio eléctricos: se indica a la entidad formuladora que a la fecha no se han entregado los diseños eléctricos de las 2 estaciones elevadoras contempladas en el proyecto. El ing. Roberto Reino manifiesta que no se tienen los diseños que se trabajaran en ellos para poder dar una fecha de entrega de estos.
- vii. Diseño estructural: se indica a la entidad formuladora que a la fecha no se han entregado los ajustes del diseño estructural. Para lo cual el ing. Roberto R., manifiesta que se trabajaran en estos para poder dar una fecha de compromiso de entrega.
- viii. PSMV: se manifiesta al municipio que el PSMV allegado no se encuentra actualizado, por tanto se solicita se entregue el documento actual y vigente. El ing. Jorge C., manifiesta que buscará la documentación.


### Conclusiones y compromisos

- I. La entidad formuladora se compromete a entregar los ajustes del diseño hidráulico y la topografía el próximo 23 de marzo de 2023.
- II. Queda pendiente la fecha de compromiso de entrega de los diseños estructural y eléctrico.
- III. La mesa técnica se realizó por los medios virtuales disponibles.

### COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de diseño hidráulico y topografía ajustados.	Municipio / consultoría	23/03/23
2	Estudio de suelos ajustado	Consultor	14/03/23

## FIRMAS

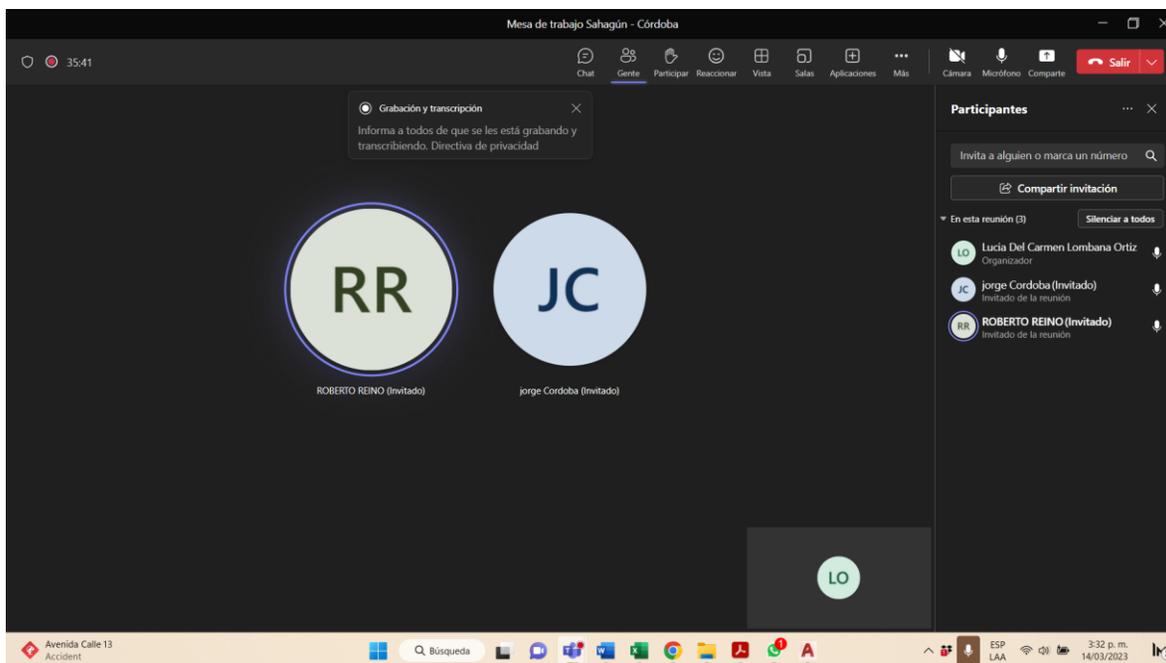

Consultor: Roberto Reino Vargas  
Correo: [ing.robertoreino28@gmail.com](mailto:ing.robertoreino28@gmail.com)  
Elaboró: Lucía Lombana Ortiz / Contratista MVCT  
Fecha: 14-03-2023
