

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 19

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de marzo de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Yasmid Calderón, Aqualia</p> <p>William Méndez, Alcaldía de Flandes</p> <p>Johana Reinoso, Consultoría del proyecto</p> <p>Jessica Lozano, Consultoría del proyecto</p> <p>Javier Guayara, Empresa de Servicios Públicos ESPUFLAN</p> <p>Ivonne Barragán, Alcaldía de Flandes</p> <p>Claudia Patricia Arredondo Giraldo, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación institucional del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.

2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación institucional de los proyectos
OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES

3. Comentarios de los asistentes

- El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indica que en las últimas reuniones no ha asistido la entidad territorial. Indica que hay muchos insumos que necesita la consultoría por parte de la entidad territorial. Indica que queda una semana para cumplir la meta.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que sobre los componentes técnicos que competen, para el componente presupuestal no se pudo avanzar por motivos de fuerza mayor. El presupuesto se estará radicando el día 24 de marzo de 2023, para ambos proyectos. Solicita mesa de trabajo para el 24 de marzo de 2023 sobre componente hidráulico de alcantarillado, para realizar aclaraciones. Sobre la documentación predial, la consultoría se había comprometido de realizar entrega parcial para acueducto, dicha entrega se realizó el 17 de marzo de 2023. En relación al componente predial de alcantarillado, se está a la espera que municipio remita documento editable con cédula y acta de posesión del alcalde.
- El Ingeniero Jaime Fuentes solicita que se trate de darle cumplimiento al componente presupuestal de los proyectos. Pregunta el estado de atención a las subsanaciones del componente estructural. Solicita que en reunión del 24 de marzo de 2023, se revise el tema estructural. Indica que son muchos los pendientes por subsanar y menciona: componente estructural de acueducto, componente hidráulico de acueducto, componente predial de acueducto y alcantarillado y componente institucional de acueducto y alcantarillado. Indica que por parte del MVCT hace falta remitir evaluación de topografía de acueducto y alcantarillado, componente estructural de alcantarillado y componente eléctrico de acueducto. Pregunta cuándo se entregará subsanaciones al componente predial de los proyectos.
- El doctor William Méndez indica que se está solucionando tema predial del proyecto de acueducto. El predio aparece a nombre de Empresas de Aguas del Tolima, que ya está liquidada y se convirtió en la EDAT. Se llevan dos semanas en la gestión del tema predial, solicitando oficio firmado por el representante legal, donde se ceda propiedad del predio, para posteriormente radicar en instrumentos públicos. Indica que la información se entregaría a la consultoría el día 29 de marzo de 2023.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que es mucho tiempo, teniendo en cuenta que es mucho tiempo, teniendo en cuenta que el proyecto está programado para mesa de trabajo del 31 de marzo de 2023.
- El Ingeniero Javier Guayara solicita que la EDAT certifique que el predio está a cargo de ellos, para que haya la tranquilidad de que el predio no es privado.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que se puede radicar la información como lo recomienda el Ingeniero Javier Guayara.


- La doctora Yasmid Calderón indica que ya cuenta con la información del componente institucional y que la va a remitir el día 24 de marzo al municipio. Indica que la información reportada en el diagnóstico es con la que cuenta Aqualia. Con relación a los indicadores, teniendo en cuenta los costos operacionales de la entidad, se remitan las informaciones de Aqualia y de ESPUFLAN.
 - El Ingeniero Javier Guayara, indica que promediar los indicadores de Aqualia y ESPUFLAN no es lo mejor, sin embargo se podría ponderar la información.
 - La doctora Claudia Arredondo, solicita que para validar los ingresos actuales, se tome la información de Aqualia. Con la información de Octubre a Febrero.
 - El Ingeniero Javier Guayara indica que no hay un nuevo estudio tarifario. No se va a formular nueva tarifa porque no hay metodología para hacer nuevo estudio tarifario.
 - La doctora Claudia Arredondo indica que en días anterior se validó información puntual del formato de diagnóstico. Solicita se finalice el documento y se envíen los soportes.
 - La Ingeniera Ivonne Barragán solicita que la subsanación institucional sea primero remitida a ellos, para que el día 27 de marzo, sea remitida al MVCT.
 - La Ingeniera Jessica Lozano, solicita que cuando el municipio remita la documentación institucional al MVCT, también lo remita a la consultoría del proyecto.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de subsanaciones definitivas del componente presupuestal de los proyectos OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.	Jessica Lozano, Consultoría del proyecto	24/03/2023
2	Agendamiento de mesa de trabajo relacionada con la evaluación hidráulica del proyecto OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE,	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	24/03/2023

	ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES. y la estructural del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I		
3	Radicación de subsanaciones definitivas del componente predial de los proyectos OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.	William Méndez, Alcaldía de Flandes	29/03/2023
4	Radicación de subsanaciones definitivas del componente institucional de los proyectos OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.	Ivonne Barragán, Alcaldía de Flandes	27/03/2023

FIRMAS:

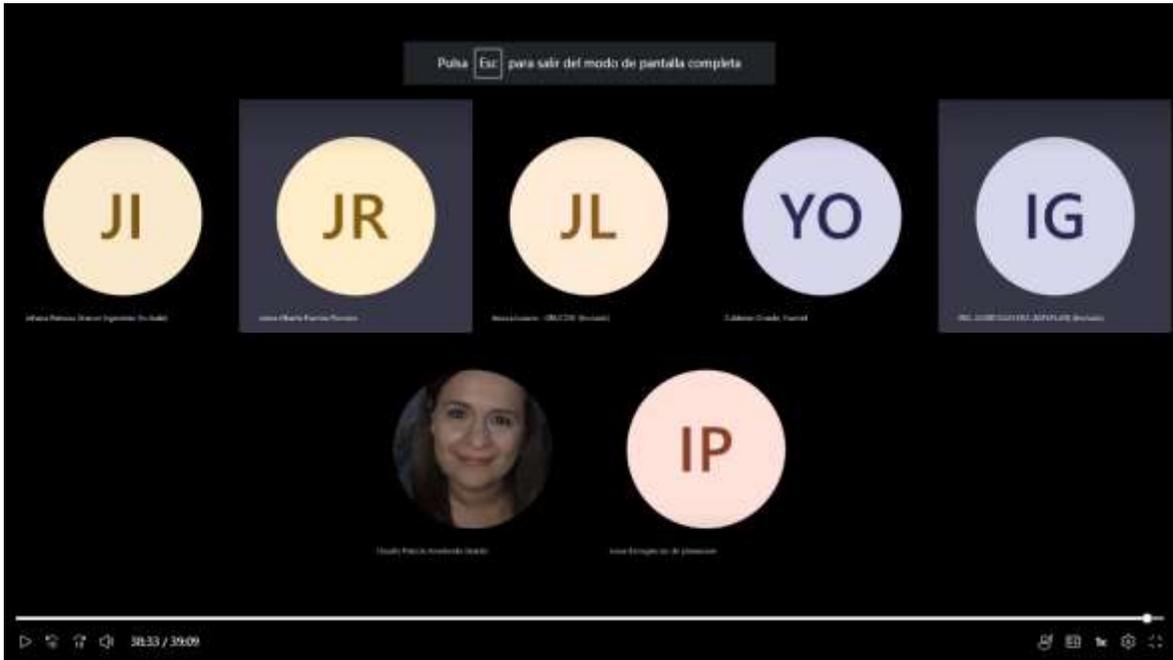

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	23/3/23, 10:01:43	23/3/23, 10:46:11	44m 27s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Calderon Oviedo, Yasmid	23/3/23, 10:02:03	23/3/23, 10:46:10	44m 7s	yasmid.calderon@aqualia.com	Moderador
Johana Reinoso Grucon Ingenieria (Invitado)	23/3/23, 10:02:40	23/3/23, 10:46:08	43m 28s		Moderador
Jessica Lozano - GRUCON (Invitado)	23/3/23, 10:06:46	23/3/23, 10:46:04	39m 17s		Moderador
ING. JAVIER GUAYARA (ESPUFLAN) (Invitado)	23/3/23, 10:08:47	23/3/23, 10:46:04	37m 16s		Moderador
Claudia Patricia Arredondo Giraldo	23/3/23, 10:12:12	23/3/23, 10:46:10	33m 57s	CArredondo@minvivienda.gov.co	Moderador
William Méndez-Flandes (Invitado)	23/3/23, 10:12:41	23/3/23, 10:44:14	31m 32s		Moderador
ivone Barragán sec de planeacion	23/3/23, 10:19:18	23/3/23, 10:46:06	26m 48s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 23-03-2023
