

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 20 – Seguimiento General

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 3 de mayo de 2023
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am, 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.</p> <p>Gloria C. Palacios, Alcaldesa del Municipio de Tibasosa.</p> <p>Efraín Arias G., Gerente E.M.T. Municipio de Tibasosa.</p> <p>Jorge Caro, Interventoria del Proyecto.</p> <p>Diana Espinosa, Directora, Ambiotec, Consultoría del Proyecto, AMBIOTEC MCHC.</p>
INVITADOS:	<p>secobraspublicas@tibasosa-boyaca.gov.co</p> <p>alcaldia@tibasosa-boyaca.gov.co</p> <p>gerenciaambiental@ambiotec.co</p> <p>jorgecaro1@hotmail.com</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de seguimiento sobre el estado actual del ajuste y complementación al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA” para la revisión del avance del proceso de ajuste por parte de la Entidad Territorial responsable del proyecto.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 3 de mayo de 2023, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de realizar el seguimiento al avance al proceso de subsanación de las observaciones presentadas por el MVCT al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA”, con la asistencia del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos, la Interventoria y la consultoría del proyecto.


La reunión inicia con el saludo a los asistentes, luego de lo cual se procede a revisar el estado de cada componente del proyecto, iniciando por el componente de documental el cual debe ser ajustado una vez se cuente con el visto bueno del componente presupuestal; se indica que el componente institucional ya cuenta con visto bueno, y se continua con el componente técnico, donde para topografía la consultoría se compromete

a presentar al MVCT los planos debidamente firmados y con el visto bueno de la Interventoría para el 04/05/2023 al igual que el componente predial; en el componente de geotecnia, la Consultoría Informa que se ha debido realizar trabajos de campo complementarios contratando al Ingeniero Cipriano Beltrán para que complemente el estudio sobre las obras lineales, indican que aún no se encuentra lista y se comprometen a entregar hasta el 15/05/2023, sobre estructuras se comprometen a entregar los ajustes aprobados por la interventoría el 09/05/2023; el componente de presupuestos junto con energía deberá ser trabajado en paralelo y se comprometen a entregar el 15/05/2023, El Municipio nuevamente pide a su consultoría cumplir con las entregas en los tiempos definidos. Con lo cual se da por terminada la reunión. Dejando la nota de que cualquier duda se pueden comunicar directamente con el Ingeniero Naranjo para tener el tratamiento oportuno.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la información ajustada con visto bueno de la interventoría de los componentes de topografía y predial.	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	04/05/2023
2	Entregar la información ajustada con visto bueno de la interventoría del componente de estructuras	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	09/05/2023
3	Entregar la información ajustada con visto bueno de la interventoría de los componentes: presupuestos, energía y suelos.	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	15/05/2023

FIRMAS: Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.

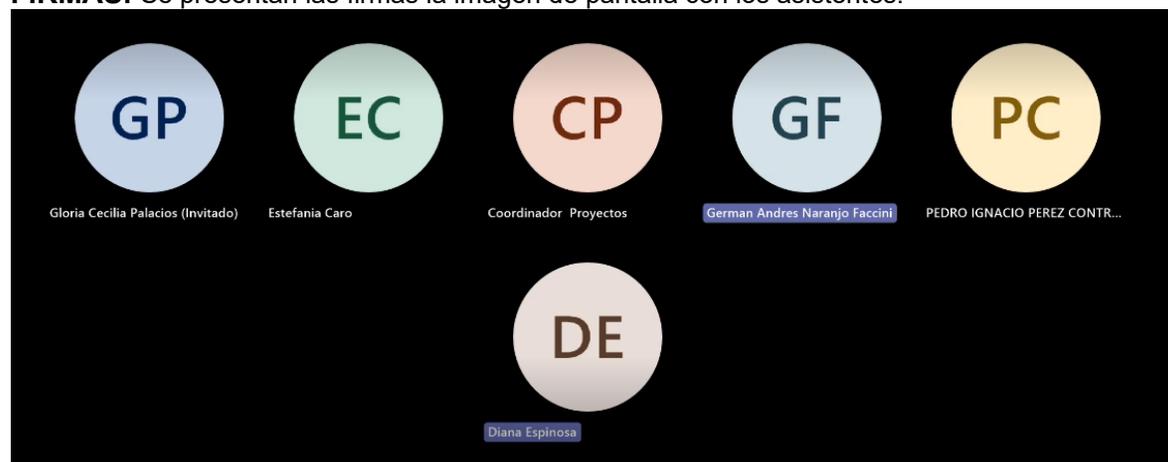

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 11-05-2022
