

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	08-05-2023
HORA:	De 10:00 a 11:30 AM
LUGAR:	PLATAFORMA TEAMS
ASISTENTES:	Eduardo Pérez Santos – Gerente PDA de Sucre Jorge Veloza – Ingeniero Ambiental PDA de Sucre Juan Pablo Chávez – Ingeniero – PDA de Sucre Karen Vergara – MVCT Jhon Marroquín – MVCT Mayra Martínez - MVCT
INVITADOS:	-

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del componente presupuestal del proyecto Relleno Sanitario Regional Mojana.

DESARROLLO:

Se da inicio la reunión con la presentación por parte del PDA del concepto de relleno sanitario definido en el proyecto regional Mojana. Se informa que este está comprendido en 2 fases las cuales aportan una vida útil del sitio de 15 años para disposición de los residuos sólidos de los municipios de Guaranda y Majagual en el departamento de Sucre y el municipio de Achí del departamento de Bolívar.

Estos 3 municipios que hacen parte del regional disponen actualmente sus residuos sólidos en botaderos a cielo abiertos, en los cuales a la fecha se realizan actividades de recuperación de materiales y quema de los residuos sólidos; por tanto este relleno sanitario es considerado de mucha importancia para brindar una solución a la inadecuada disposición de los residuos sólidos en la región.

De igual forma se espera que una vez construido el relleno sanitario lleguen a disponer sus residuos sólidos otros municipios del departamento de Córdoba, los cual es por su cercanía y cierre del relleno sanitario del municipio de Montería, vean como alternativa a disposición final el relleno sanitario de la Mojana.

Se presenta el presupuesto de proyecto el cual asciendo a 15 mil millones para la ejecución de la fase 1 del proyecto el cual se constituye en la construcción de la celda de la etapa 2 y obras complementarias; se igual forma contempla conforme a la política del gobierno Nacional una Fase 2 denominada valorización de los residuos sólidos previo a la disposición final, en el marco del programa basura cero, dicha fase a nivel de consultoría dentro del proyecto de fase 1.

Se realiza revisión de los items del presupuesto donde llama la atención la existencia de una tala la arboles, la cual no es financiada con recursos de la Nación y se solicita al PDA definir dentro de las especificaciones técnica y APU del proyecto el alcance de dicha actividad y se consulta sobre la inclusión o no en la solicitud de licenciamiento como aprovechamiento forestal.


Por parte del ingeniero ambiental del PDA, se informa que dicha actividad no esta incluida en la solicitud de licencia, toda vez que es una actividad que se realizará en la etapa constructiva del relleno, sin embargo si se incluyó el inventario de individuos arboreos a ser talados. Dicha actividad podría ser cofinanciada por el PDA conrecursos del SGP.

Se menciona de igual forma, que el item más representativo del proyecto corresponde a la construcción de diques de contención para la conformación de la celda, dicho item incluye gran adquisición de material en cantera certificada, compactación y estabilidad de taludes, por tal motivo asciende a los 3000 millones de pesos.

El ingeniero de presupuesto de la DIDE solicita le sean remitidos los planos para verificación de dicho items y cuantificación de las cantidades mencionadas.

De igual forma se informa, que dado que el sitio de implanción del proyecto se encuentra sobre vía nacional, se hace necesario la construcción de un box coulver paralelo a la vía de tal forma que se permita el ingreso de los vehículos al predio.

El ingeniero de presupuesto requiere información detalla de planos y memorias estructurales para verificación de dicho componente.

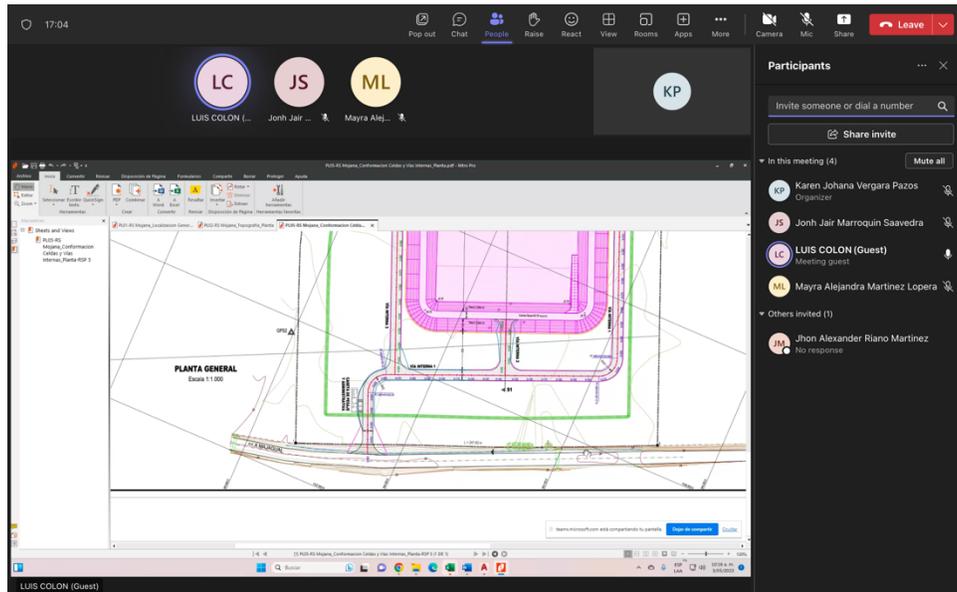

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir memoria de proyecto, planos y presupuesto al ingeniero Marroquín para su revisión detallada.	PDA	8-5-23

FIRMAS: como constancia de la reunión la siguiente captura de pantalla.

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting window with a Zoom meeting embedded. The Zoom meeting displays a spreadsheet titled "PRESUPUESTO BELLINO MOJANA.xlsx". The spreadsheet has the following columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, and VALOR PARCIAL. The rows list various construction items, such as preliminary work, excavation, and cell construction, with their respective quantities and values. The meeting interface shows participants LUIS COLON, Jonh Jair Marr..., Mayra Alej..., and KP. The Zoom window also shows a "Leave" button and a "Share" button.

Elaboró: Kvergara.
Fecha: 8-5-2023
