

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01 MIRANDA CAUCA
PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN Y RADICACIÓN
- **Proyecto acueducto interveredal rural**
- **Proyecto protección bocatoma rio el Desbaratado**

DATOS GENERALES

FECHA:	Viernes 21 de septiembre de 2023
HORA:	De 17:30 a 17:55 horas
LUGAR:	PLATAFORMA TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDc3Zjg3YTgtMTc1OS00MDdhLWI2ZGIYWY3ZmFiNWVmMjY3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22,%22Oid%22:%227060b445-9b30-4fa5-a8f6-f6281e93d0dc%22%7D
ASISTENTES:	MUNICIPIO DE MIRANDA EDINSON ENRIQUE MOSQUERA GONZALÍA Secretario de Planeación municipal MVCT NÉSTOR FABIÁN ROMERO - Grupo de Evaluación - Subdirección de proyectos - Líder del proyecto

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para el seguimiento al estado de avances del proceso de estructuración, radicación y mecanismo de viabilización de los perfiles de proyectos denominado: 1. ACUEDUCTO INTERVEREDAL RURAL; 2. ABORAS PROTECCIÓN BOCATOMA RIO EL DESBARATADO EN EL MUNICIPIO DE MIANDA CAUCA, derivado de la mesa conjunta entre el despacho del Viceministro y la Presidencia de la República.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

Se inicia la mesa con la presentación de los asistentes, la cual corresponde con el listado del encabezado. Toma la palabra el ingeniero Néstor Romero para resaltar el objeto de la mesa el cual es hacer un proceso de revisión del estado de los compromisos del municipio y el MVCT ante el despacho del viceministro y la dirección de proyectos especiales de la Presidencia de la República a los proyectos INTERVEREDAL y PROTECCIÓN BOCATOMA.

Se analizan en conjunto con el señor secretario de planeación de Miranda, cada uno de los compromisos así:

El 22 de agosto LA ALCALDÍA remitiría al MVCT los proyectos correspondiente a los proyectos: PROTECCIÓN BOCATOMA y sobre el ACUEDUCTO INTERVEREDAL

Con fecha 22 de agosto la entidad formuladora remite al MVCT documentación de soporte del proyecto de Protección, la cual se aloja en el enlace: <https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1dQ7bFkYsZcIE8DW7v4ZCvfRtYNxJSL-Y%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7Cnromero%40minvivienda.gov.co%7Ca3b0485029e7457f460808dba36944b1%7C59f8557228674480b111fc473309f9b3%7C0%7C0%7C638283444763053750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TMXzo95uvoACfKlB8VhZPJNPms8Tv79rnqVqUEwi8U%3D&reserved=0>

Con fecha 24 de agosto, mediante el mismo procedimiento, el municipio remite documentación técnica asociada al proyecto Interveredal, el cual se aloja en el enlace:

<https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1YjcpPkYxFlendjLoEbku0ze22j2Cncsm%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7Cnromero%40minvivienda.gov.co%7C5c1e5312cbc8403a208508dba4f84029%7C59f8557228674480b111fc473309f9b3%7C0%7C0%7C638285158388030938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2%2F1B722oKlsntTI9Bh%2F2VbaPrX4qwhypa1DF%2FFipfS0%3D&reserved=0>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Ambas documentaciones se reciben por parte del evaluador preliminar del grupo de evaluación ingeniero Andrés Felipe González y sirven de insumo para el desarrollo de las mesas de trabajo de asistencia y acompañamiento al proceso de estructuración y posible radicación ante el MVCT.

El 30 de agosto EL MVCT remitiría a la ALCALDÍA, emitiría la sugerencia del mecanismo de radicación del proyecto, por emergencia o por proyecto tradicional.

Para el efecto, el ingeniero Andrés Felipe González convocó a mesa de trabajo el día 05 de septiembre de 2023 en el que se aborda la pertinencia de entregar los documentos para el proyecto que finalmente se radicaría por **Emergencias** teniendo en cuenta la resolución 0661 de 2019, guía para la radicación de proyectos ante este Ministerio, de igual manera, se recomendó al municipio sea verificada toda la normativa del sector de agua y saneamiento básico vigente para el diseño del proyecto así como la NSR-10, en atención a que el proyecto se focaliza en la construcción de **un muro de contención** para la protección de la bocatoma y de estructuras dentro y cerca de la ronda hídrica del río El Desbaratado. El evaluador preliminar cuenta con varios productos del proyecto, por esto, en la referida mesa se mencionan los documentos faltantes teniendo en cuenta que se radicaría por Emergencias con valor mayor a 450 SMMMLV, se generan varias observaciones que luego de la reunión también son enviadas mediante correo electrónico el día 06 de septiembre de 2023. Se está a la espera de retroalimentación por parte del municipio.

El 8 de septiembre EL MVCT remitiría a la ALCALDÍA las sugerencias para la radicación del ACUEDUCTO INTERVEREDAL

En relación con este proyecto, mediante mesa de trabajo el día 21 de septiembre de 2023 se instruye al municipio sobre la pertinencia de entregar los documentos para el proyecto de Inversión teniendo en cuenta la normatividad vigente en el sector de agua potable, así como la NSR-10, ya que los estudios y diseños presentados data de los años 2013 y 2014 (estudio topográfico, estudio de suelos, diseño hidráulico y estructural, también presupuesto de obra que se deberá actualizar al año de presentación del proyecto), por ende, **se recomienda a la entidad territorial actualizar toda la información pertinente** para el proyecto avalado por un profesional idóneo en cada uno de sus componentes. Se generan varias observaciones y se relaciona toda la documentación faltante que luego de la reunión también es enviada mediante correo electrónico el mismo día 21 de septiembre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El 8 de septiembre el MVCT Y la ALCALDÍA adelantarán mesa de trabajo para verificar condiciones de la PTAP fase 1 y posible fase 2.

Esta mesa de trabajo no se ha desarrollado dado que el municipio ha solicitado un espacio de tiempo para reunir información de base con la empresa de servicios públicos, que permita contar con mejores elementos para definir el alcance y objeto de dicho posible proyecto. De igual manera el MVCT está en proceso de indagación con FINDETER para procurar recuperar el proyecto original de la PTAP municipal que se estructuró ante esa entidad en los años 2015 a 2017. En la mesa de trabajo que se desarrolle la semana del 28 de septiembre 2023, se revisará el estado de esta gestión y se definirá la fecha para cumplir este compromiso.

El 15 de septiembre TODAS LAS PARTES llevaríamos a cabo mesa de trabajo para verificar los avances de todos los proyectos (citación pendiente por parte del MVCT)

Esta mesa de trabajo aún no cuenta con una fecha definida para su desarrollo. Se espera en la mesa del 28 de septiembre 2023 proponer una fecha subsiguiente entre las partes, con base en los avances que se logren hasta ese momento.

Resultados de la mesa:


El municipio presentará para el proyecto de emergencias, la documentación faltante que pueda ajustar o conseguir y manifestará cual es la documentación de la que carece para analizar de manera conjunta entre MVCT y municipio las posibles soluciones a dicha situación.

De la siguiente manera se agota el orden del día, siendo las 17:55 horas del 21 de septiembre de 2023.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – Grupo de evaluación de proyectos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

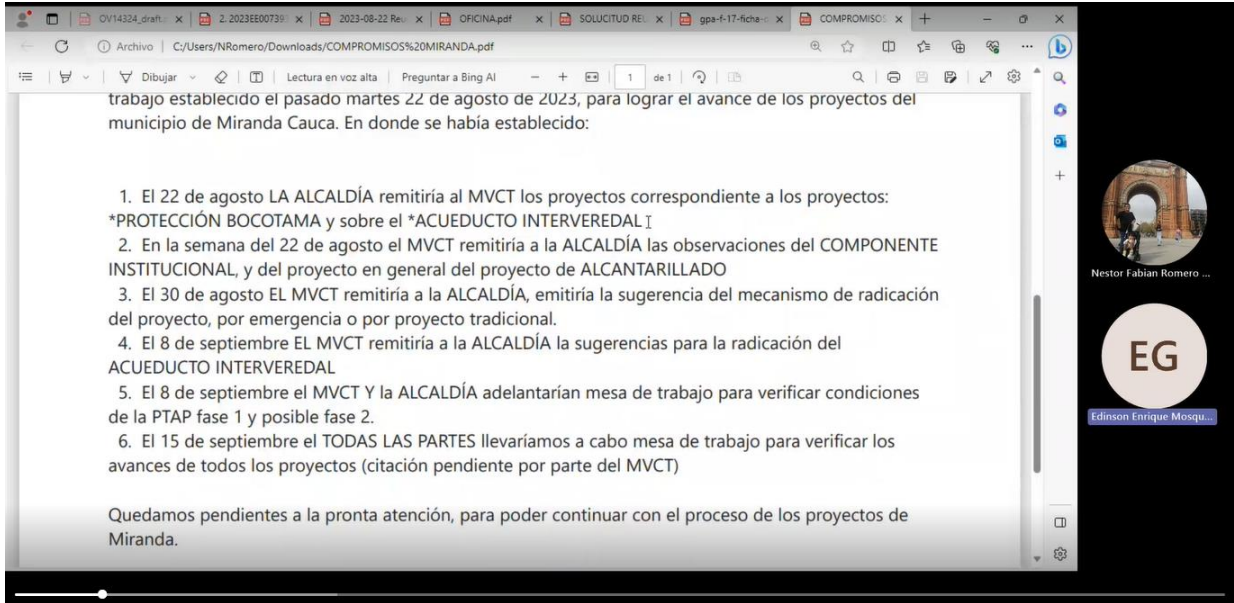

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The main window displays a document titled "COMPROMISOS%20MIRANDA.pdf" with the following text:

trabajo establecido el pasado martes 22 de agosto de 2023, para lograr el avance de los proyectos del municipio de Miranda Cauca. En donde se había establecido:

1. El 22 de agosto LA ALCALDÍA remitiría al MVCT los proyectos correspondiente a los proyectos: *PROTECCIÓN BOCOTAMA y sobre el *ACUEDUCTO INTERVEREDAL
2. En la semana del 22 de agosto el MVCT remitiría a la ALCALDÍA las observaciones del COMPONENTE INSTITUCIONAL, y del proyecto en general del proyecto de ALCANTARILLADO
3. El 30 de agosto EL MVCT remitiría a la ALCALDÍA, emitiría la sugerencia del mecanismo de radicación del proyecto, por emergencia o por proyecto tradicional.
4. El 8 de septiembre EL MVCT remitiría a la ALCALDÍA la sugerencias para la radicación del ACUEDUCTO INTERVEREDAL
5. El 8 de septiembre el MVCT Y la ALCALDÍA adelantarían mesa de trabajo para verificar condiciones de la PTAP fase 1 y posible fase 2.
6. El 15 de septiembre el TODAS LAS PARTES llevaríamos a cabo mesa de trabajo para verificar los avances de todos los proyectos (citación pendiente por parte del MVCT)

Quedamos pendientes a la pronta atención, para poder continuar con el proceso de los proyectos de Miranda.

On the right side of the Teams window, there is a vertical list of participant avatars. The top avatar is labeled "Nestor Fabian Romero ..." and the bottom avatar is labeled "EG" with the name "Edinson Enrique Mosquera" below it.

ENLACE DE LA GRABACIÓN

https://teams.microsoft.com/#/meetingrecap/19:meeting_NDc3Zjg3YTgtMTc1OS00MDdhLWI2ZGIyWY3ZmFiNWVmMjY3@thread.v2?ctx=chat
