

**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

## ACTA REUNIÓN

### DATOS GENERALES

|             |   |
|-------------|---|
| FECHA:      | Bogotá, 24 de octubre de 2023   |
| HORA:       | De 02:30 p.m. a 04:30 p.m.  |
| LUGAR:      | Plataforma Teams  |
| ASISTENTES: | Aura García – PDA de Bolívar<br>Gustavo Villa - PDA de Bolívar<br>Iliana Hernández - PDA de Bolívar<br>Ana Rojas – PDA Bolívar<br>Jorge Montes – MVCT<br>Karen Vergara – MVCT |
| INVITADOS:  |   |

### ORDEN DEL DIA:

Presentación de los participantes  
Avance proyecto aprovechamiento Mahates - Bolívar

### DESARROLLO:

En aras de realizar seguimiento a las actividades realizadas por el PDA de Bolívar con relación al proyecto de Mahates, se realiza reunión con el área técnica del PDA para la presentación de los avances en los planos y definición de la población y proyección de los residuos sólidos.

En este sentido, se brinda claridad al PDA informando que el primer paso a seguir en la estructuración de un proyecto es la identificación de las generalidades del municipio y el levantamiento de diagnóstico o línea base que presente la necesidad a atacar con el proyecto. Es así como se le solicita a la Sra. Ana Rojas se pueda identificar dicha información en el PGIRS municipal y Plan de Desarrollo del municipio de Mahates. Paralelo a ello, una vez se tenga la versión final de planos, proceder con la memoria de diseños y pasar a presupuesto y APU con sus respectivas especificaciones técnicas.

Se debe tener en cuenta que el proyecto será presentado ante el mecanismo de viabilización de este Ministerio para concepto técnico, por ende debe contener MGA, Ficha resumen y demás documento de que trata la resolución 661 de 2019.

Por parte del PDA se consulta por la cadena de valor del proyecto para la formulación de la MGA. Sobre el particular se informa que el proyecto debe contener dos (2) fases, una en

la cual se realizará por parte del consultor la revisión, verificación y ajuste a los prediseños para llevarlos a diseños definitivos incluyendo el diagnóstico de que haya lugar para ajuste a los diseños, como también la identificación de maquinaria y equipos, junto con el componente de aseguramiento y fortalecimiento institucional para para operación bajo el esquema de comunidades organizadas.

Conforme a la revisión del estudio de población, este Ministerio pudo verificar que no aplica el proyecto tipo DNP para la ECA toda vez que este proyecto aplica para municipios donde se tenga un aprovechamiento en ECA de 10 ton/día, mientras que conforme al análisis realizado para Mahates la producción o el aprovechamiento sería de 5 ton/día a horizonte de diseño.

Por tanto, se ve la necesidad de contar con una infraestructura menor, para lo cual se trabaja en los planos para que los profesionales del PDA puedan brindar en apoyo en los diseños estructura, eléctrico, hidrosanitario y presupuesto.


Se informa por parte de la Sra, Ana que ella no realiza proyecto sin que antes den los insumos por parte de los profesionales técnicos y se informa además que a la fecha no se tiene avance alguno en este.

Este Ministerio, agradece las gestiones que se puedan realizar para avanzar con el tema y se informa que se solicitó al municipio los certificados de tradición y libertad de los predios mencionados para su validación.

En este sentido, se tiene propuesta de cronograma, sobre el cual se espera retroalimentación por parte del PDA.

| CRONOGRAMA PROYECTO MAHATES - BOLÍVAR |  |                    |                          |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| ITEMS                                 | ACTIVIDAD  | RESPONSABLE        | FECHA DE CUMPLIMIENTO    |
| 1                                     | ENVÍO DE PLANOS ECA 108m2 Y 72m2   | MVCT               | Miércoles 24 de octubre  |
| 2                                     | Presentación de generalidades y diagnostico de proyecto  | PDA Bolivar        | Jueves 25 de octubre     |
| 3                                     | Presentación estudio de población y proyección de residuos   | PDA Bolivar        | Viernes 26 de octubre    |
| 4                                     | Envío de diseño estructural para revisión MVCT   | PDA Bolivar        | Miercoles 1 Noviembre    |
| 5                                     | Envío de diseño Hidraulico para revisión MVCT  | PDA Bolivar        | Miercoles 1 Noviembre    |
| 6                                     | Envío de diseño Electrico para revisión MVCT   | PDA Bolivar        | Miercoles 1 Noviembre    |
| 7                                     | Presentación memoria técnica diseños   | PDA Bolivar y MVCT | Miercoles 1 de Noviembre |
| 8                                     | Presupuesto, APU y Especificaciones técnicas de prediseños incluye maquinaria y equipos (cotizados por el municipio) | PDA Bolivar        | Viernes 3 de noviembrrre |
| 9                                     | Presentación Avance documento técnico (generalidades, diagnostico, prediseños)                                       | PDA Bolivar y MVCT | Viernes 3 de noviembrrre |
| 10                                    | Socialización documento asegurmaiento de la prestación   | MVCT               | Martes 7 de noviembre    |
| 11                                    | Definición de alcance, actividades y entregables llave en mano   | PDA Bolivar        | Viernes 10 de noviembre  |
|                                       | Presupuesto llave en mano obra e interventoría   | MVCT y PDA         | Viernes 17 de noviembre  |
| 12                                    | MGA, certificaciones, fichas acorde a la 661 de 2019   | PDA Bolivar        | Lunes 20 de noviembre    |
| 13                                    | Radicación de proyecto ante ventanilla   | PDA Bolivar        | Lunes 20 de noviembre    |

Como constancia de la reunión, se tiene el siguiente pantallazo:

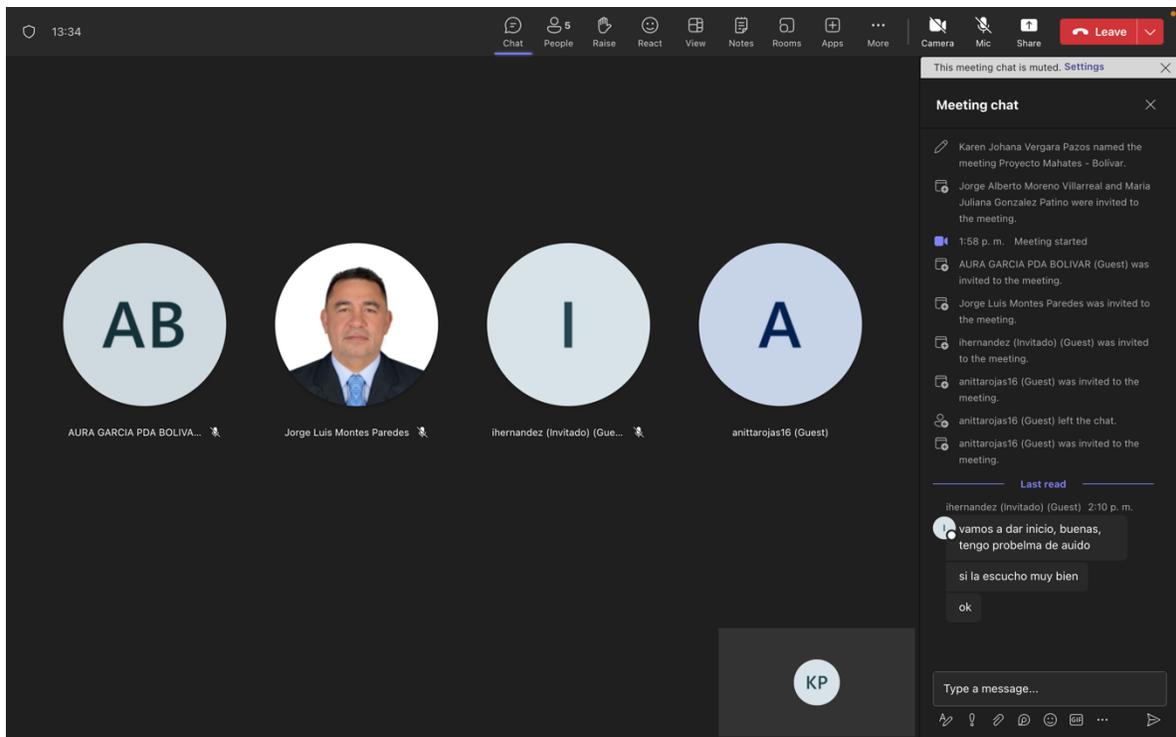

Elaboró: Karen Vergara – MVCT-VASB-DPR  
Fecha: Octubre de 2023
