

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 2

### DATOS GENERALES

FECHA:	08 de noviembre de 2023
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am
LUGAR:	<b>Aplicativo Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Pablo Chávez Acosta – Equipo de consultoría, jchavezacosta@gmail.com  Alvaro Marino – Equipo de consultoría, ingalvaromarin@yahoo.com  Jairo Figueroa – Secretario de planeación alcaldía del municipio de Corozal, ing.jairofigueroa63@hotmail.com  Harold García – profesional universitario secretaria de planeación del municipio de Corozal  Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Alcaldía municipal de Corozal

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento a la complementación del proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de Don Alonso, municipio de Corozal, departamento de Sucre".
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

El ingeniero Luis Carlos contextualiza la reunión, explicando que la presente mesa se citó para realizar seguimiento a la complementación del proyecto, en

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

marco del proceso de la evaluación del proyecto. La reunión N°1 fue realizada en el mes de junio y posteriormente se envió un requerimiento en el mes de agosto. Sobre el oficio con radicado 2023EE0074613 de fecha 04 de agosto de 2023, contiene las observaciones de cada uno de los componentes del proyecto como son documental, institucional, topografía, geotecnia, estructuras, hidráulico, presupuestal y predial. Por lo anterior, el ingeniero consulta en que estado se encuentran las observaciones enviadas y si se tienen dificultades, se pueden realizar mesas de cada uno de los componentes.

El Ing. Alvaro explica que ya han realizado los ajustes al componente hidráulico. Sobre la geotecnia se tiene la particularidad de tener un estrato rocoso en el sitio, por lo cual se debe realizar un rediseño de la estación de bombeo y de un paso elevado que se proyecta para las redes de alcantarillado. Por lo cual, solicita el apoyo al municipio de Corozal, para lograr los ajustes del diseño estructural.

Sobre el paso elevado, el Ing. Luis Carlos recomienda validar las condiciones de socavación y niveles máximos, realizando las validaciones hidrológicas, hidráulicas y geotécnicas, para garantizar la estabilidad del paso elevado. El ingeniero pregunta a quien corresponde la ejecución de estos diseños estructurales.

El Ing. Alvaro explica que el valor del contrato de consultoría no fue suficiente para la ejecución de estos diseños estructurales, por lo cual solicitan el apoyo del municipio de Corozal, con la consecución de estos recursos adicionales.

El Ing. Harold informa que no se ha recibido una solicitud formal de adición de recursos, por lo cual, solicita al Ing. Alvaro del equipo de consultoría, realizar las gestiones y justificaciones necesarias para lograr la mencionada adición. Además, explica que es nuevo en el proyecto, por lo cual se debe empapar de todo lo relacionado con la consultoría y su alcance.

El Ing. Alvaro manifiesta que se encuentran ajustando planos hidráulicos, por lo cual la próxima semana se presentará al municipio los ajustes requeridos por parte del MVCT.

El Ing. Luis Carlos explica que se tenían observaciones del tema predial, por lo cual, se debe prestar especial atención a dicho componente.

El Ing. Alvaro ratifica que el componente predial es de resorte del municipio de Corozal, por lo cual, se deben realizar las gestiones para la consecución de los dos predios requeridos en el proyecto.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ing. Harold explica que validará con el área jurídica del municipio, en que estado se encuentra la gestión predial del proyecto. Además, propone realizar una mesa de trabajo con el equipo de consultoría, para validar el estado del proyecto y cada uno de sus componentes.

El Ing. Luis Carlos recomienda que se tenga una correcta articulación entre municipio y consultoría, para lograr el éxito del proyecto.

El Ing. Harold pregunta si es suficiente con la intención o se debe tener la adquisición de los predios requeridos en el proyecto.

El Ing. Luis Carlos explica que para tener el concepto favorable / viabilidad del proyecto, se debe tener los predios a nombre del municipio. Sin predios solo se podría tener un concepto favorable condicionado. Las servidumbres si son obligatorias tenerlas conformadas para cualquiera de los dos conceptos.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Corozal. Además, explica que, durante el proceso de evaluación, se pueden realizar las mesas de trabajo que se ameriten o requieran por el municipio, en aras de resolver las inquietudes que existan y poder seguir adelante con el proyecto.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar la documentación actualizada y complementaria de los diferentes componentes del proyecto	Municipio de Corozal - Consultoría	De acuerdo con el avance que se tenga
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente



**FIRMAS:**

Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández  
Fecha: 08-11-2023


**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**Registro de asistencia**

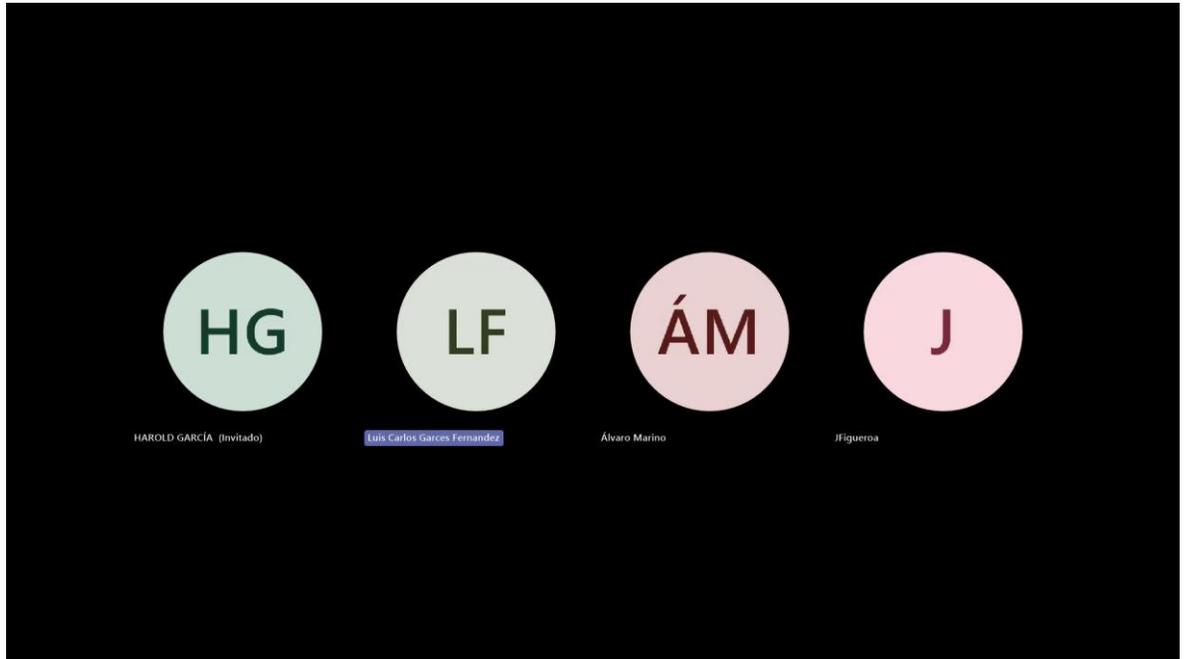

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

## Convocatoria



MESA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE DON ALONSO, MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE - Reu...

Luis Carlos Garces Fernandez  
Necesario | alcaldia@corozal-sucra.gov.co | jffimorero@hotmail.com | jhavesacosta@gmail.com | rafel.007@hotmail.com | ing.janfigueroa4@hotmail.com | ing.alvaromartino@yahoo.com

miércoles 8 de noviembre de 2023 10:00 a. m. | Reunión de Microsoft Teams

Señores  
ALCALDIA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE COROZAL

Cordial saludo,

De manera atenta citamos a mesa de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento a la complementación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE DON ALONSO, MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Fecha: miércoles 08 de noviembre de 2023  
Hora: 10:00 am  
Enlace de la reunión: [https://teams.microsoft.com/j/19%3ameeting\\_YT10MTA3ZjZlZmY0SjM0MDMm&lt;gMTgM8BWRZGFYVW0540threed.v2?context=67676221d6%22%3a%2259f8572-2867-4480-b111-f6473309f9b3%22%3a%225c364347-08f6-43ed-91f6-272da9e6cd93%22%7d](https://teams.microsoft.com/j/19%3ameeting_YT10MTA3ZjZlZmY0SjM0MDMm&lt;gMTgM8BWRZGFYVW0540threed.v2?context=67676221d6%22%3a%2259f8572-2867-4480-b111-f6473309f9b3%22%3a%225c364347-08f6-43ed-91f6-272da9e6cd93%22%7d)

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

 Profesional Especializado  
**Luis Carlos Garces Fernandez**  
Subdirección de proyectos  
[lgarces@minvivienda.gov.co](mailto:lgarces@minvivienda.gov.co)  
+50 (1) 332 3434  
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala  
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)
