

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de diciembre de 2023
HORA:	De 14:00 a 14:40 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Por parte de la Alcaldía: • Lina Lanziano, profesional Secretaria Infraestructura. Por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso Coservicios: • Marlén Pérez, Profesional de apoyo • Julio César Naranjo, Profesional Topografía Por parte de la Consultoría: • Anderson López, Topografía Por parte de la Interventoría: • Xiomara Alcantar, Dirección Interventoría Por parte del MVCT: • Alix Johanna González, Contratista Especialista Topografía Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB • Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación del municipio de Sogamoso, de la empresa prestadora de servicios públicos Coservicios, interventoría y profesional del MVCT.

2. Objetivo de la reunión.

El evaluador líder MVCT asignado al proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO-BOYACÁ"** convoca la mesa de trabajo para realizar seguimiento a los compromisos de entrega de pendientes y subsanaciones. En la sesión se tratará sobre avances en los estudios de topografía.

3. Desarrollo de la reunión.

- El proyecto cuenta con observaciones de tipo documental, legal, ambiental, técnico, financiero y predial, las cuales fueron remitidas formalmente al formulador mediante oficio 2023EE0094081 del 05/10/2023.
- Según fue comentado en mesa de trabajo anterior, el Ing. Sergio Rodríguez (MVCT) mencionó que, de acuerdo con comunicación recibida por parte de representantes de la interventoría (correo electrónico de 27 de octubre de 2023) se esperaba entrega de ajustes y subsanaciones para la primera semana de diciembre, lo cual no se cumplió. Lo anterior, debido a la cantidad de observaciones con que cuenta el proyecto, según fue expuesto por la interventoría, razón por la que se requiere de tiempo adicional.

En la mesa de trabajo anterior, la Ing. Alcantar (interventoría), mencionó que el estudio de topografía se encuentra subsanado, por lo que se acordó que en la presente mesa de trabajo se expondrían dichos ajustes a los profesionales del MVCT.

- De parte de la consultoría, el Ing. Anderson López, procede informando los avances de la consultoría, mencionando que ya cuentan con el informe, soportes y registros de campo, archivos, entre otros, y que dicho ejercicio

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

fue complementado con información por donde pasan los colectores proyectados. De igual manera, se mencionó que la topografía realizada se encuentra debidamente georreferenciada.

- El informe general y postproceso
- Registro fotográfico
- Corrección coordenadas Magna Sirgas
- Resumen GPS Magna Sirgas
- Resumen GPS origen único.
- Se mejoró la organización de las carpetas
- Carpetas con soportes de geodesia y puntos topográficos base
- Datos de salida de equipos y programas
- Hojas de campo con sus respectivas observaciones y datos obtenidos

El Ing. Rodríguez (MVCT), solicita a la consultoría presentar los planos, quienes manifiestan que de momento no se pueden hacer debido a inconvenientes con el software de diseño. Por lo anterior no se pudo observar los ajustes realizados sobre los planos, resultados de los estudios de topografía adelantados.

La Ing. Alix González (MVCT), pregunta si se desarrolló sobre la implantación y planos los colectores proyectados y, sobre lo identificado respecto de información topográfica faltante sobre algunas de las áreas del alcance del proyecto, si esta fue complementada. Sobre lo anterior, la consultoría menciona que se realizaron dichos ajustes.

- Sobre lo anterior, los ingenieros González y Rodríguez (MVCT), mencionaron que con la presentación realizada no se puede determinar el cumplimiento normativo para los estudios de topografía y que los mismos deberán presentarse completos para las respectivas verificaciones.

Solicitaron los profesionales del MVCT indicar fecha de entrega de la documentación, a lo que los profesionales de la consultoría e interventoría mencionaron que estos se entregarán para la respectiva revisión el 22 de diciembre de 2023 por medio de carpeta virtual.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Sobre la carpeta virtual, aclaró el Ing. Rodríguez (MVCT), que se puede trabajar con la información compartida por ese medio con el fin de adelantar las revisiones sobre los avances que se vayan presentando, sin embargo una vez de conformidad se deberá radicar el proyecto de manera oficial ante el MVCT. Por otro parte, cada vez se cargue información en la carpeta virtual, nueva y/o modificada, deberá notificarse al profesional del MVCT.

- Por parte de Coservicios, el Ing. Julio César Naranjo mencionó que realizada la exposición por parte de la consultoría, y en espera de la entrega de la documentación de los ajustes del estudio de topografía, se esperará las revisiones y observaciones por parte de los profesionales del MVCT.

La Ing. Marlen Pérez (Coservicios), menciona que estarán atentos a la entrega de ajustes y a la reunión a realizarse el 20 de diciembre de 2023, en la cual se espera se socialicen avances sobre ajustes y subsanaciones de los estudios hidráulicos del proyecto.

- En la mesa de trabajo a realizarse el 20 de diciembre de 2023, el Ing. Rodríguez (MVCT) solicitó a representante de la interventoría contar con la fechas de entrega de los demás ajustes solicitados al proyecto.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto cuenta con pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnico, financiero y predial. El componente institucional se encuentra de conformidad de acuerdo con la revisión realizada por profesional de la Subdirección de Gestión Empresarial del VASB MVCT.

Se esperaban las subsanaciones solicitadas al proyecto para la primera semana de diciembre de 2023, sin embargo no se cumplió compromiso.

En la presente sesión, se realizó reunión con representantes del formulador quienes presentaron avances sobre los ajustes realizados sobre el estudio de topografía y se espera entrega de la documentación para el 22 de diciembre de 2023 para la revisión de los profesionales del MVCT.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El 20 de diciembre de 2023 se realizará seguimiento al avance de los demás ajustes solicitados al proyecto, y se espera que en la mesa de trabajo el formulador comprometa nuevas fecha de entrega de ajustes.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo: Seguimiento avances componente técnica y se realizarán compromisos de entregas de ajustes	Consultoría Interventoría ESP Municipio MVCT	20/12/2023
2	Entrega de ajustes de topografía	Consultoría Interventoría ESP Municipio	22/12/2023

FIRMAS (Imágenes de la reunión virtual):

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

1. Resumen			
Título de la reunión	Mesa de trabajo "CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO-BOYACÁ"		
Participantes que asistieron	9		
Hora de inicio	12/18/23, 1:56:00 PM		
Hora de finalización	12/18/23, 2:40:01 PM		
Duración de la reunión	44 min 1s		
Tiempo medio de asistencia	18 min 42s		
2. Participantes			
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	12/18/23, 1:59:51 PM	12/18/23, 2:37:25 PM	37 min 34s
Anderson López	12/18/23, 2:00:01 PM	12/18/23, 2:40:01 PM	40 min
XIOMARA ALCANTAR SION OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S (Invitado)	12/18/23, 2:07:54 PM	12/18/23, 2:10:54 PM	3 min
Alix Johana Gonzalez	12/18/23, 2:09:06 PM	12/18/23, 2:36:59 PM	27 min 53s
XIOMARA ALCANTAR SION OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S (Invitado)	12/18/23, 2:15:10 PM	12/18/23, 2:22:40 PM	7 min 30s
Lina Lanziano	12/18/23, 2:15:20 PM	12/18/23, 2:36:57 PM	21 min 37s
XIOMARA ALCANTAR SION OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S (Invitado)	12/18/23, 2:23:24 PM	12/18/23, 2:37:07 PM	13 min 43s
Marlen Pérez	12/18/23, 2:24:34 PM	12/18/23, 2:36:59 PM	12 min 24s
TOPOGRAFÍA - COSERVICIOS SA-ESP (Invitado)	12/18/23, 2:32:14 PM	12/18/23, 2:36:56 PM	4 min 41s

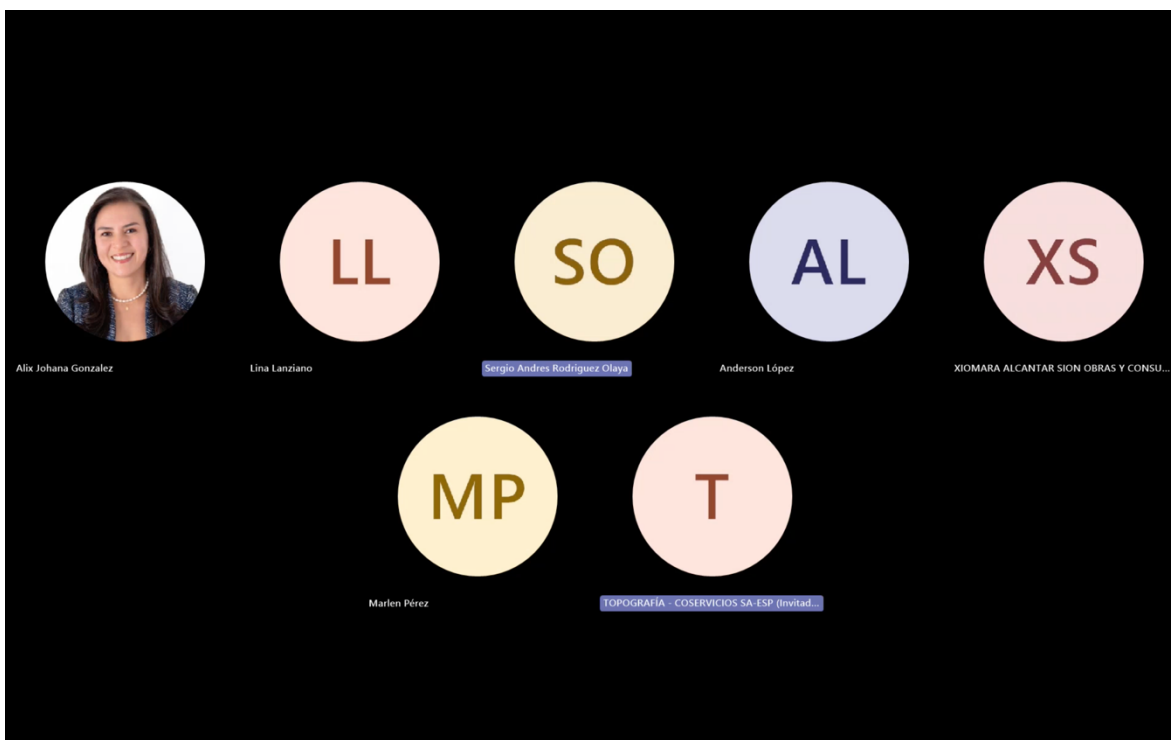

Anexo(s): No aplica

Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 18/12/2023
