

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13-09-2023
HORA:	De 16:14 a 17:17 horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento- Subdirección de Proyectos MVCT Paula Alcántara, Secretaría de Planeación Aracataca Luis Ferney Agudelo Metaute, Aguas Nacionales Maria Elena Rondón, Directora de Interventoría Juan Camilo Ruiz, Residente de Interventoría. Pedro Russi, Contratista de Obra. Jheison Escobar, Oficina Jurídica de Aracataca Andrea Lozano Varon, Direccion de Infraestructura y Desarrollo Empresaria MVCT Gabriel Bonett Solano, Subdirección de Proyectos MVCT
INVITADOS:	María Bedoya, Aguas Nacionales Ivan Diez, Aguas Nacionales Fredy Giraldo, Aqualia – Interventoría Isabel Vardas Montero. Aguas Nacionales

ORDEN DEL DIA:

1. Compromisos de la reunión anterior
2. Construcción de la línea de Impulsión (Pruebas)
3. Escenarios para puesta en marcha del sistema
4. Entrega de línea de impulsión.

DESARROLLO:

1. No se realiza lectura de compromisos por que los representantes de la Alcaldía de Aracataca perdieron conexión.
2. La interventoría manifiesta que se realizaron pruebas de la línea de impulsión por parte del contratista no fue utilizada una empresa externa para la toma de estas, los resultados se pueden consultar en cada uno de los formatos entregados, se tuvo en cuenta lo estipulado en el manual de EPM y manual triple A.

Se realiza presentación de registro fotográfico de la toma de pruebas, mientras explican el procedimiento y los resultados obtenidos en la lectura

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

del manómetro. Se informa que el agua utilizada en la prueba es agua del río.

Se realiza presentación de los formatos diligenciados de las pruebas de presión hidrostática tubería de Acueducto y se resuelven dudas generales del diligenciamiento y del proceso de toma de las pruebas.

Finalmente, la Interventoría da fe de la realización de las pruebas, manifiestan que realizaron acompañamiento con el Ing Cristian González delegado por la interventoría de quien se evidencia firma en cada uno de los formatos, recibe a satisfacción y entregan a satisfacción los resultados de estas.

Interventoría Manifiesta que a enero de 2022 el sistema quedó funcional.


3. Se sugiere realizar una nueva prueba de presión para verificar un supuesto daño provocado por un tercero y terminar la incertidumbre de la funcionalidad de la tubería al lado y lado del río.
4. Aguas Nacionales propone que una vez tengan las llaves de las cajas en su poder, se sugerirá una fecha tentativa de entrega física de la línea de impulsión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de las llaves de las cajas a la interventoría.	Contratista	20-09-2023
2	Compartir la grabación de la reunión.	Vanessa Arias	14-09-2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

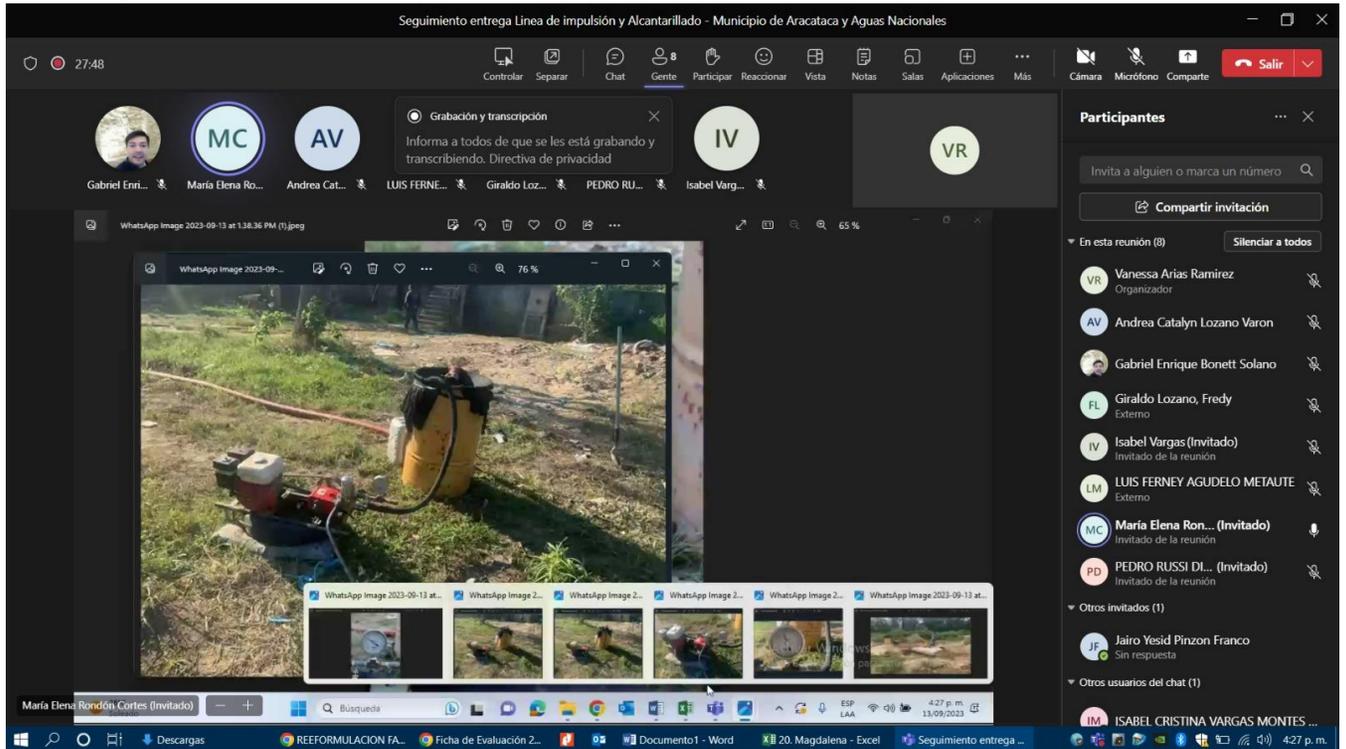

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Revisó:
Fecha: 13-09-2023
