

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	Reunión Virtual - Teams, 15 de marzo de 2024
HORA:	De 10:00 am a 10:40 am
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Jessica Sanchez – Consultoría Utsanpablo2021@gmail.com Eduardo Cañas Ramos - Evaluador Líder del Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT ecanas@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	

OBJETO:

Realizar seguimiento a las subsanaciones producto de la evaluación del proyecto denominado "OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a las subsanaciones producto de la evaluación del proyecto denominado "OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

DESARROLLO:

Se inició la reunión indicando que el alcance de la misma es para conocer el estado de avances de las subsanaciones del proyecto, por lo cual se abordó por componentes el proyecto así:

Componente Hidráulico:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

La ingeniera Jessica, manifiesta que el diseñador hidráulico ha incumplido con la entrega del informe de diseño ajustado, para lo cual se comprometió a remitir el mismo el día 18/03/2024.

Componente Topografía y geotecnia:

Con respecto a estos componentes, la ingeniera consultora indica que en estos momentos se encuentran realizando los trabajos de campo de los ajustes del componente de topografía. Con respecto a geotecnia manifestó que se encuentran terminando de ajustar el informe, por lo cual el día 18/03/2024 remitirán los componentes ajustados.

Componente de presupuestos:

Con el fin de avanzar en la evaluación de este componente, la firma consultora se comprometió en remitir el presupuesto ajustado con cotizaciones actualizadas y especificaciones técnicas de construcción el día 22/03/2024.

Componente predial:

La consultoría manifiesta que el proyecto requiere 12 servidumbres que se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Alcaldía, sin embargo, manifestó que se reunirá con el alcalde para conocer el avance de estas gestiones.

Componente de estructuras:

La ingeniera Jessica indica que este componente se encuentra en fase de ajustes, manifestando que se encuentra diseñado la PTAR, cabezal de descarga y en estos momentos se está elaborando los diseños de los pasos elevados. Por lo cual no se comprometió a una fecha de entrega, sin embargo, en el transcurso de la semana indicará fecha de entrega.

Componente Ambiental:

El proyecto requiere el permiso de vertimientos, la actualización del PSMV y dos ocupaciones de cauces para los pasos elevados. La ingeniera consultora manifiesta que ya se cuenta con un permiso de ocupación de cauces para un paso elevado y que el resto de los permisos se encuentran en proceso de trámite.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


Componente institucional:

Con respecto a este componente, la consultora indicó que realizará una solicitud al municipio donde indique si dentro del alcance de la consultoría del fortalecimiento institucional se encuentra el plan de acción propuesto por el proyecto, esto con el fin de evitar una doble contratación.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar ajustado los componentes hidráulico, topografía y geotecnia.	Consultor	18/03/2024
2	Enviar ajustado el componente presupuestal	Consultor	22/03/2024

FIRMAS:

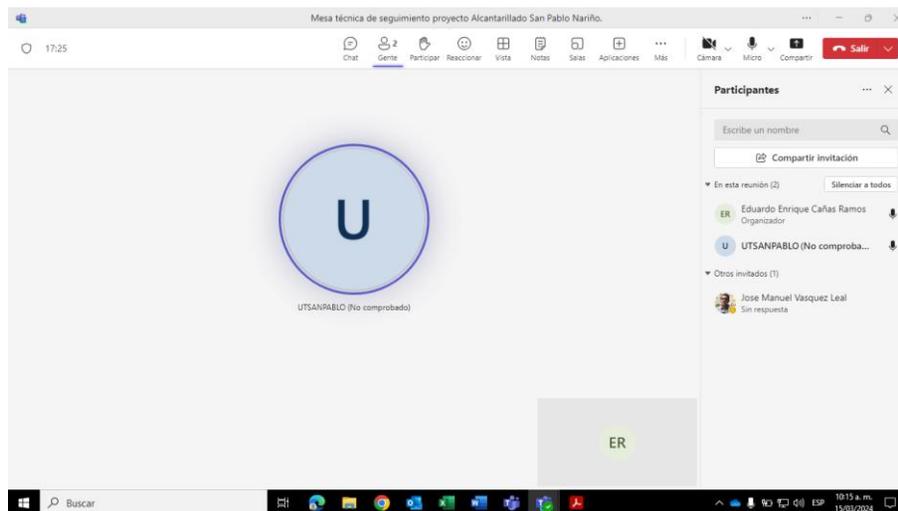

Anexos: Ninguno

Elaboró: Eduardo Cañas Ramos.
Fecha: 15-03-2024
