

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA REUNION VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de febrero de 2024
LUGAR:	Reunión seguimiento proyecto Támesis
ASISTENTES:	Daily Liliana Lopez Bedoya, secretaria de Planeación Támesis Armando Larrota Duque, Municipio de Támesis Leidy Carmona, Supervisora proyecto – PDA de Antioquia Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT Jesus Antonio Castro Guerra, Especialista en Topografía Geodesia

CONVENIO 1137 DE 2020:

Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial del Municipio de Támesis – Antioquia.

OBJETO: Seguimiento a la subsanación de observaciones a la documentación entregada como soportes de la reformulación No. 3.- Calibración Geodésica del proyecto.

Agenda:

1. Estado liquidación Contrato de Interventoría.
2. Avance en la solución a la calibración geodésica cumpliendo la Resolución 661 de 2019 y verificar que los diseños estén acorde a la topografía del sitio de implantación.

DESARROLLO

La reunión virtual contó la participación de la administración municipal de Támesis, el contratista encargado de la calibración geodésica, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

1. Estado liquidación Contrato de Interventoría

El PDA de Antioquia informó que el proyecto de acta de liquidación se encuentra en suscripción por parte del contratista de interventoría, ya está aprobada por la parte del área jurídica del PDA y se cuenta con las pólizas.

2. Avance en la solución a la calibración geodésica

La secretaria de Planeación de Támesis señaló que se dará un reporte de las actividades realizadas a la fecha por parte del contratista que ejecuta los trabajos.

Por otra parte, el Municipio informó que para adelantar los trabajo se firmó un contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano de Támesis, y esta

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

entidad suscribió contrato con el consultor. Su duración es de dos meses. Esta documentación se remitirá tanto al PDA de Antioquia como el Ministerio.

El contratista informó que de conformidad con las observaciones del MVCT se está realizando una red principal y una red de apoyo, mediante las cuales se radiaran los detalles de las obras por realizar en el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Las actividades relevantes ejecutados se relacionan a continuación:

- Se realizó recorrido por la totalidad de las rutas a seguir con la información suministrada en planos.
- Se fabricaron las placas que se empotraran.
- Se construirán los mojones materializando la red.
- Se tomarán los datos.
- Están trabajando 5 comisiones, 3 con equipos RTK y dos con estación.
- Construcción de la red principal y secundaria y el calcula de la misma se estima una semana, al 25 de febrero. El informe se entregaría el 29 de febrero de 2024.
- Posterior se procederá a realizar los levantamientos de los aproximadamente 15 kilómetros lo cual se espera tener el 26 de marzo de 2024.

El MVCT solicitó se informe sobre la interventoría y supervisión de los trabajos que se están adelantando.

El Municipio señala que no se contrató interventoría externa, se hará desde el personal de topógrafos de la administración municipal.

El Consultor aclara que la verificación de la topografía existente solo se realizará una vez se tengan los resultados de la consultoría se hará esta actividad, revisando en cota para establecer.

El MVCT solicitó al municipio se informe sobre las actuaciones que se han adelantado para continuar con el proceso de incumpliendo al diseñador inicial.


El Municipio de Támesis informó que se comunicó al secretario de Gobierno que se continúe con el proceso de reclamación, partiendo de la resolución existente para notificar la consultora y a la aseguradora.

Se determina que la visita al proyecto se debe realizar una vez conocidos los resultados de la consultoría y la comparación con los diseños. Sin embargo, se solicitará que por parte del MVCT se requerirá el acompañamiento para verificar los resultados.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

Actividades	Responsable	Fecha
Liquidación de la Interventoria	GSPG Antioquia-PDA	25-02-2024
Calibración Geodésica acorde con a la resolución 0661 de 2029	Municipio de Támesis	26-03-2024
Reunión de seguimiento	MVCT-PDA de Antioquia municipio de Támesis	23-02 - 2024

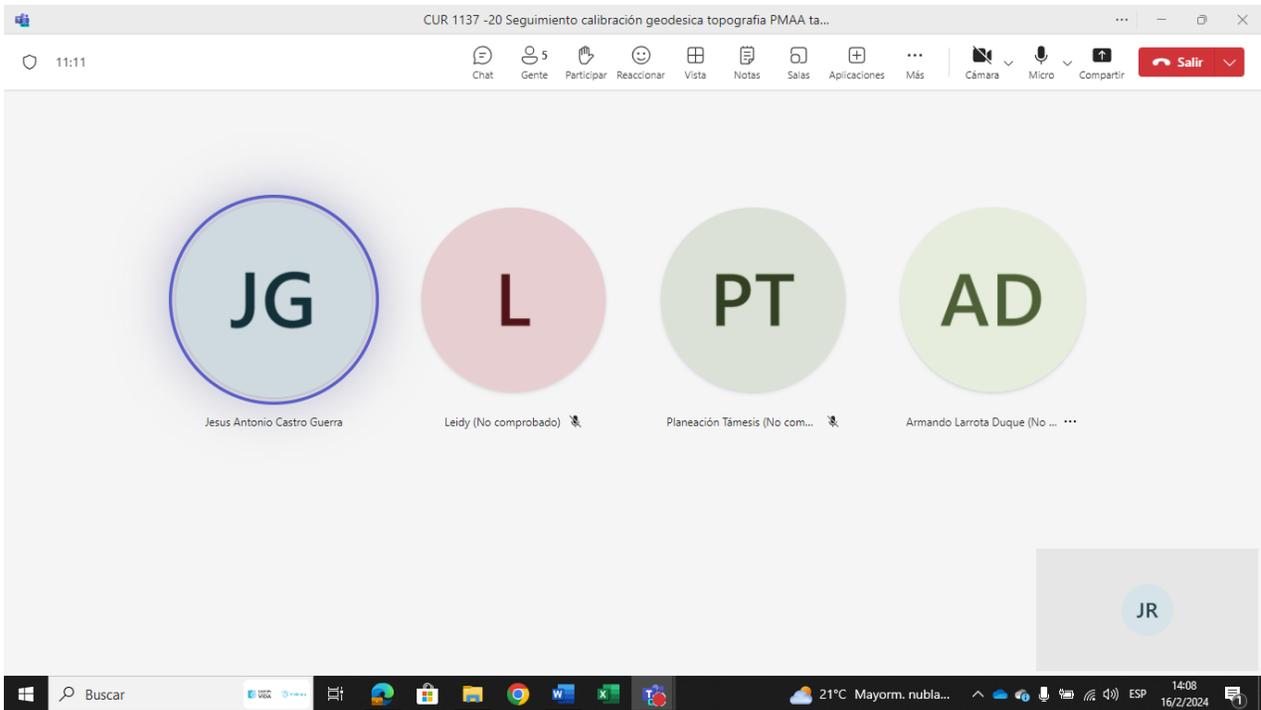

The screenshot shows a Zoom meeting window titled "CUR 1137 -20 Seguimiento calibración geodesica topografia PMAA ta...". The meeting time is 11:11. The interface includes a toolbar with icons for Chat, Gente, Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Salas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micro, and Compartir. A red "Salir" button is also present. The main area displays four participant avatars: JG (Jesus Antonio Castro Guerra), L (Leidy (No comprobado)), PT (Planeación Támesis (No com...)), and AD (Armando Larrota Duque (No ...)). A fifth participant, JR, is visible in a smaller window at the bottom right. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar, taskbar icons, and system tray with a temperature of 21°C and date 16/2/2024.
