

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 5 de abril de 2024
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Maria Camila Erira, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Wilson Asprilla, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Sandra Londoño, Alcaldía de Fredonia, Antioquia Hector Hernández, Alcaldía de Fredonia, Antioquia Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS PALOMOS, MUNICIPIO DE FREDONIA - ANTIOQUIA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión indicando que desde el 5 de diciembre de 2023, no se realizaba reunión producto que la consultoría solicitó un plazo hasta

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

el 31 de marzo de 2024, para remitir subsanaciones, plazo que no se cumplió. Pregunta por el estado de avance del proyecto.

- El Ingeniero Felipe Ceballos, indica que se tuvo la creencia de que se iban a cumplir plazos de entrega de la información técnica, predial e institucional del proyecto, sin embargo surgieron varios inconvenientes. Se quiere cumplir con lo pactado. Se firmaron contratos para el diseño de la PTAP del municipio, queriendo adelantar a observaciones que pudieron haberse recibido del aspecto normativo. Indica que ya recibió los estudios de la PTAP y se están realizando las revisiones correspondientes. También se contrataron los estudios hidrológicos e hidráulicos. El estudio de suelos ya se encuentra completo. El retraso más grande es el componente estructural. Los demás estudios, se entregarán en un par de semanas.
 - La Ingeniera Sandra Londoño, indica que se está retomando el proyecto en mención. El alcalde quiere socializar con las comunidades los proyectos que recibe y los que va a ejecutar.
 - El Ingeniero Felipe Ceballos, indica que se le va a dar cumplimiento al componente institucional. Está dentro del componente más próximo a entregar.
 - La Ingeniera Sandra Londoño sobre el componente predial comenta que se está trabajando en el componente predial.
 - El Ingeniero Felipe Ceballos indica que el componente topográfico tiene el amarre geodésico respectivo. Está dentro del paquete inicial a entregar. Del componente documental y ambiental, comenta que se remitirán estas subsanaciones prontamente. La parte ambiental, se entregará en los últimos informes de entrega. Indica fechas de entrega de las subsanaciones:
 Hidráulica, Topografía, Institucional, Documental – 6 de mayo de 2024
 Estructural, Ambiental, Predial, Geotecnia – 6 de junio de 2024
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone nueva mesa de trabajo para el 13 de mayo de 2024, para realizar mesas de trabajo cada semana. Solicita que los compromisos de entrega de la información sean cumplidos, dado que anteriormente no se han cumplido los compromisos. Sugiere que asista el interventor a todas las reuniones.
4. Cierre de la reunión


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones hidráulicas, topográficas, institucionales y documentales del proyecto	Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	06/05/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

2	Remisión de subsanaciones estructurales, ambientales, prediales y geotécnicos del proyecto	Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	06/06/2024
3	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	13/05/2024

FIRMAS:

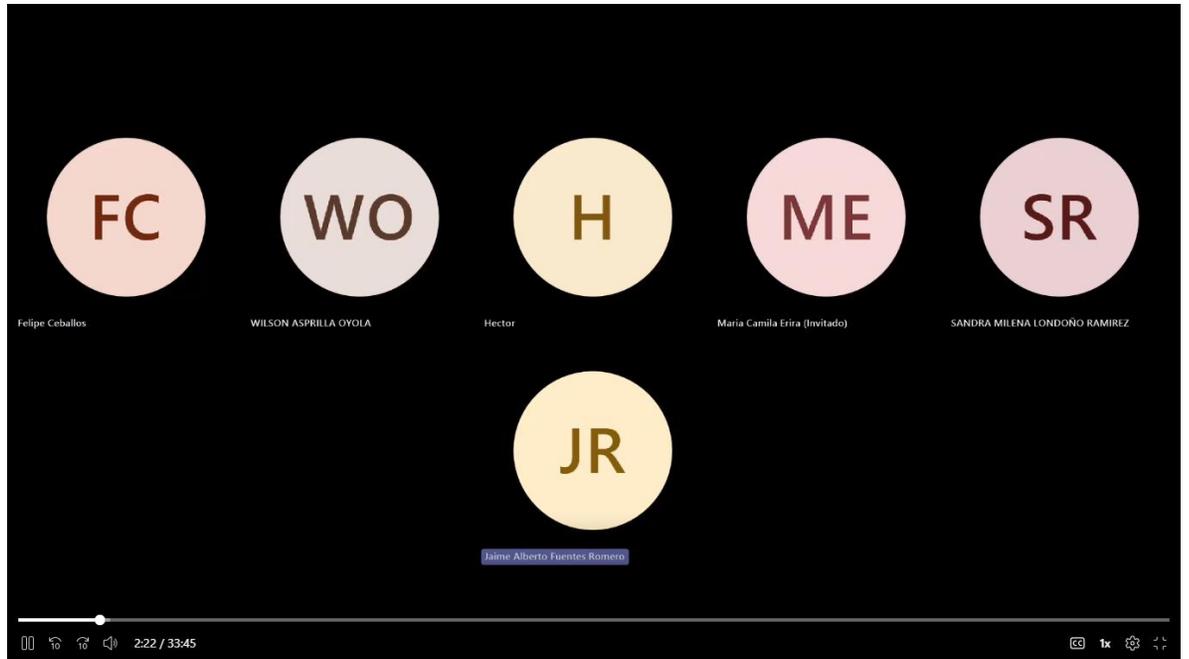

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 05-04-2024
