

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	10 de abril de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Melissa Atencia Gerente Servimag ESP e-mail: servimagmaganque@gmail.com - Laura Valdelamar Asesora Jurídica secretaria de Planeación de Magangué e-mail: alvaro-jose.salcedo@veolia.com - Álvaro Salcedo Jefe de Proyectos Veolia Sabana e-mail: co.informacion.adesa@veolia.com - Walter Hernández Gerente de Planeación y Construcción, Veolia Sabana e-mail: co.informacion.adesa@veolia.com - Félix Antonio Domínguez Pérez Jefe de Unidad acueducto Magangué, Veolia Sabana e-mail: felix-antonio.dominguez@veolia.com - Jhonatan Peñates Líder de Operaciones unidad de negocio, Veolia Sabana e-mail: co.informacion.adesa@veolia.com - Daniel Fabián Cortes Santos Diseñador de Proyectos, Veolia Sabana e-mail: daniel-fabian.cortes@veolia.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Seguimiento al proceso de entrega de la documentación ajustada y actualizada del proyecto "código 1-2021-60. EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ” (Radicado: 2020ER0110679), conforme a lo acordado en la mesa de trabajo del 13/dic/2023.


ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al proceso de entrega de la documentación ajustada y actualizada del proyecto de inversión 1-2021-60.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El MVCT recordó a los asistentes que según lo acordado en la última reunión de este proyecto celebrada el pasado 13/dic/2023, para el 16/feb/2024 se pactó presentar ante el MVCT toda la documentación del proyecto debidamente ajustada y actualizada teniendo en cuenta los temas tratados en las

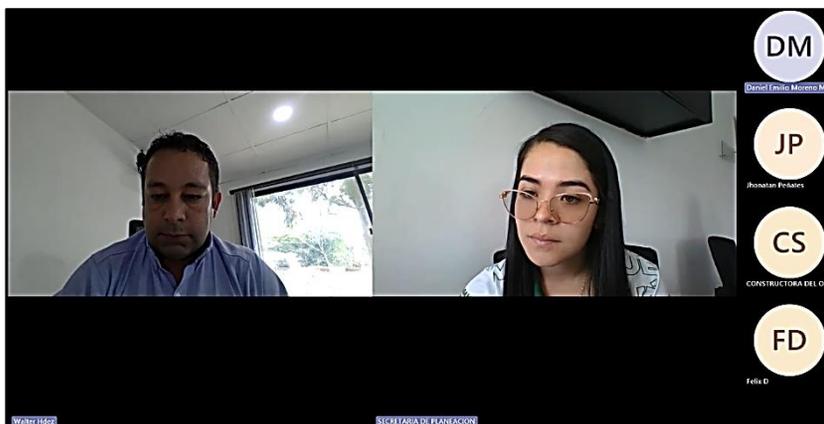

mesas de trabajo efectuadas durante el año 2023; no obstante lo anterior, a la fecha en el MVCT no hemos recibido la información referenciada. Sobre el particular Veolia Sabana explicó que acontecieron situaciones técnicas que dilataron la fecha de entrega al MVCT, sin embargo, dichas circunstancias ya fueron superadas y se indicó que el 30/abril/2024 se enviará al MVCT la totalidad de la documentación del proyecto debidamente ajustada, actualizada y avalada por la Interventoría.

Veolia Sabana señaló que producto de: i) la actualización de precios de mercado del año 2020 al año 2024, ii) los rediseños del proyecto y iii) las actualizaciones del alcance, el proyecto 1-2021-60 que inicialmente se presupuestó en COP\$ 51.665.774.350, ahora asciende a los COP\$ 95 mil millones aproximadamente. El MVCT mencionó que en esta etapa del proceso de evaluación es posible realizar cambios al alcance físico y financiero de los proyectos; lo importante en ese caso es presentar la documentación técnica del proyecto con todos los soportes y justificaciones técnicas correspondientes.

Servimag ESP manifestó que ha trabajado mancomunadamente con Veolia Sabana para llevar a feliz término este proyecto de inversión, e igualmente tiene toda la disposición para efectuar las subsanaciones que sean requeridas. La Secretaría de Planeación de Magangué agregó que se encuentra ultimando los trámites prediales del lote donde fue reubicada la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

estación de bombeo (EBAR) de la cuenca 3, quedando pendiente únicamente el certificado de carencia de antecedente registral dentro del proceso de formalización de la propiedad de dicho lote a nombre del municipio de Magangué; así mismo se mencionó que en la siguiente semana se visitará la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para solicitar dicho certificado, el cual fue requerido desde el año 2023.

El MVCT solicitó a la Entidad Formuladora realizar su mejor esfuerzo para remitir a esta Cartera a finales de abril de 2024, la documentación completa del proyecto 1-2021-60 conforme a los requisitos de presentación establecidos en la resolución MVCT 661/2019 (anexo 1).

- Por parte de los asistentes no se generan comentarios u observaciones finales. Se da por terminada esta mesa de trabajo.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar al MVCT el rediseño y actualización del proyecto “EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ”, aprobado por la Interventoría.	Alcaldía de Magangué, Veolia Sabana	30 de abril de 2024

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary							
Meeting title	Mesa de Trabajo 08 Alcantarillado cuenca 3 Magangué						
Attended participants	7						
Start time	4/10/24, 09:59:30 AM						
End time	4/10/24, 10:30:27 AM						
Meeting duration	30m 56s						
Average attendance time	23m 41s						
2. Participants							
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	4/10/24, 10:00:19 AM	4/10/24, 10:30:27 AM	30m 8s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Jhonatan Peñates	4/10/24, 10:00:25 AM	4/10/24, 10:30:19 AM	29m 53s			Presenter	
CONSTRUCTORA DEL ORIENTE SAS	4/10/24, 10:01:42 AM	4/10/24, 10:30:16 AM	28m 33s			Presenter	
Felix D	4/10/24, 10:03:27 AM	4/10/24, 10:30:13 AM	26m 45s			Presenter	
Walter Hdez	4/10/24, 10:04:56 AM	4/10/24, 10:30:10 AM	25m 14s			Presenter	
PLANEACION	4/10/24, 10:05:04 AM	4/10/24, 10:13:24 AM	8m 19s			Presenter	
SECRETARIA DE PLANEACION	4/10/24, 10:13:16 AM	4/10/24, 10:30:14 AM	16m 57s			Presenter	
3. In-Meeting Activities							
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role		
Daniel Emilio Moreno Montenegro	4/10/24, 10:00:19 AM	4/10/24, 10:30:27 AM	30m 8s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer		
Jhonatan Peñates	4/10/24, 10:00:25 AM	4/10/24, 10:30:19 AM	29m 53s		Presenter		
CONSTRUCTORA DEL ORIENTE SAS	4/10/24, 10:01:42 AM	4/10/24, 10:30:16 AM	28m 33s		Presenter		
Felix D	4/10/24, 10:03:27 AM	4/10/24, 10:30:13 AM	26m 45s		Presenter		
Walter Hdez	4/10/24, 10:04:56 AM	4/10/24, 10:30:10 AM	25m 14s		Presenter		
PLANEACION	4/10/24, 10:05:04 AM	4/10/24, 10:13:24 AM	8m 19s		Presenter		
SECRETARIA DE PLANEACION	4/10/24, 10:13:16 AM	4/10/24, 10:30:14 AM	16m 57s		Presenter		

Elaboró: Daniel Moreno – MVCT.

Vo.Bo.: Melissa Atencia, Laura Valdellamar, Álvaro Salcedo, Walter Hernández, Jhonatan Peñates, Daniel Cortes, Félix Domínguez (Entidad Formuladora del proyecto).
