



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 18

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 16 de julio de 2024
HORA:	De 09:00 a 09:32 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	De parte de Aguas del Chocó S.A. E.S.P. Gestor PDA <ul style="list-style-type: none">- Héctor Emilio Mosquera, Coordinador Área Técnica De parte de la consultoría <ul style="list-style-type: none">- Yeniffer Suárez, Ing. Civil (Apoyo consultoría) Consultoría Redes Condoto- William Barajas De parte del MVCT <ul style="list-style-type: none">- Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la empresa Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor P.D.A.), la consultoría y profesional del MVCT.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se invitó a representantes del municipio de Condoto, quienes no asistieron.

2. Objetivo de la reunión.

Se solicitó por parte del evaluador del proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”**, la mesa de trabajo con el fin de realizar corte y seguimiento a los pendientes con que cuenta este a la fecha.

3. Desarrollo de la reunión.

- El Ing. Rodríguez (MVCT), menciona a los representantes del formulador que se realizará seguimiento sobre estado de todos los requisitos del referido proyecto.
 - Componente documental y legal:
Con respecto de la carta de presentación y ficha MGA, se encuentran con observaciones pendientes de atender, sin embargo, con el fin de evitar reprocesos, una vez subsanado los demás componentes del proyecto serán ajustados los documentos.
 - Componente institucional:
El componente fue revisado y los requisitos sobre este aprobados por parte del profesional de la subdirección de desarrollo empresarial. No obstante, se aclara que las certificaciones relacionadas con este componente deberán actualizarse dado el tiempo transcurrido de aquella revisión.
 - Componente técnico:
Al igual que la carta de presentación y ficha MGA, el formato resumen del proyecto será ajustado una vez se encuentre de conformidad la demás documentación del proyecto.
Sobre los diseños hidráulicos, los pendientes fueron solicitados a través del correo electrónico del 15 de abril de 2024, los cuales se encuentran pendientes de atención. Se incluyen observaciones sobre los informes de diseño, memorias, manuales y planos.
Sobre el diseño eléctrico, no se han presentado las subsanaciones requeridas.

Se encuentra también pendiente presentar la disponibilidad de servicio (energía), certificado de canteras y escombreras, certificado de funcionalidad e integralidad, cronograma de obra, especificaciones técnicas, entre las principales.

Sobre los diseños estructurales, el día 15 de julio de 2024 se presentaron por parte del formulador los últimos ajustes, los cuales se encuentran en revisión del especialista del MVCT y se espera contar con resultado el día 17 de julio de 2024.

Con relación al estudio de suelos, se recibieron ajuste por parte del formulador, y se espera contar con esta revisión del especialista del MVCT el 26 de julio de 2024.

Fueron revisados y encontrados con cumplimiento de requisitos: el estudio de topografía, el estudio hidrológico, diagnóstico situacional y análisis de alternativas.

- Componente ambiental: Se requiere permiso de ocupación de cauce y concesión de aguas, y se desconoce el estado de los trámites. Con relación al desagüe proveniente de la PTAP (uso de instalaciones y tratamiento de subproductos), se desconoce si se requiere permiso de vertimientos o disponibilidad de servicio en caso de conectarse al sistema de alcantarillado existente. En la presente reunión no se informó estado de los trámites.
 - Componente financiero: Una vez subsanado el componente técnico, se espera contar con el presupuesto coherente con la documentación técnica.
 - Componente predial: Sobre el componente predial, entre lo cual se encuentra pendientes relacionadas con plano de localización, acreditación de titularidad, servidumbres y formatos, en la presente reunión no se brindó información del estado de las subsanaciones sobre este requisito.
- La Ing. Suarez de parte de la consultoría, frente a lo anterior, comenta sobre los diseños hidráulicos, y los pendientes relacionados en el correo del 15 de abril de 2024, se encuentran en proceso de ajuste y se espera contar con estos para el final de la semana (19 de julio de 2024). Con relación a los pendientes respecto de los diseños eléctricos, ambientales y prediales, menciona que averiguará con los responsables de la consultoría y PDA del Chocó la información que permita informar sobre el estado y fechas de entrega esperadas.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se realiza seguimiento sobre el estado de los pendientes del referido proyecto el cual cuenta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnica, financiera y predial.

Los profesional del grupo de evaluación del MVCT actualmente se encuentran revisando subsanaciones parciales, correspondientes al estudio de geotecnia y diseño estructural.

Sobre los diseños eléctricos, el formulador manifiesta que se encuentra realizando las subsanaciones requeridas y espera contar con estas el 19 de julio de 2024 para la revisión del evaluador del MVCT.

Sobre los demás pendientes comentados, entre los cuales se encuentran el diseño eléctrico y los componentes ambiental y predial, no se presentaron avances y se acordó que el formulador averiguarían estado de los mismos con el fin de proyectos fechas esperadas de entregas.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar ajustes técnicos completos <i>Nota 1: Se han presentado parciales – los días 10 (estudio de suelos) y 15 (diseño estructural) de julio de 2024 a través de correo electrónico los cuales se encuentran en revisión de los profesionales del grupo de evaluación.</i> <i>Nota 2: se espera entrega el 19 de julio de 2024 sobre el componente</i>	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	<i>Nota: No se definen fechas de la entrega total de los requisitos por parte del formulador. Se han realizado entregas parciales, sin embargo, no se cuenta con el pleno de los requisitos</i>
2	Presentar ajustes componente legal y documental	PDA del Chocó Municipio Condoto	<i>Nota: No se definen fechas en mesa de trabajo. El formulador depende de entregas de otros componentes.</i>
3	Presentar ajustes financieros	Consultoría Interventoría	<i>Nota: No se definen fechas en mesa de trabajo. El formulador</i>



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
		PDA del Chocó	<i>depende de entregas de otros componentes</i>
4	Presentar ajustes componente predial y ambiental	PDA del Chocó Municipio Condoto	<i>Nota: No se definen fechas en mesa de trabajo. El formulador deberá consultar el estado de los trámites correspondientes.</i>
5	Revisión de ajustes recibidos el 16 de julio de 2024 – diseño estructural	MVCT	17/07/2024
6	Revisión de ajustes recibidos el 10 de julio de 2024 – estudio de suelos	MVCT	26/07/2024

FIRMAS:



SEGUIMIENTO PENDENTES PR... Chat Archivos Resumen Asistencia Salas para sesión de ... +2 [Unirse](#) 2


16 July 2024 09:00 - 09:32 [Descarga](#)

3 Asistieron	09:00 - 09:32 Hora de inicio y finalización	31m 51s Duración de la reunión	28m 43s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Sergio Andres Rodríguez Olaya SRodriguez@minvivienda.gov.co	09:03	09:32	28m 58s	Organizador
hector emilio mo... (No comprobado)	09:03	09:32	28m 46s	Moderador
Yeniffer (No comprobado)	09:03	09:31	28m 26s	Moderador

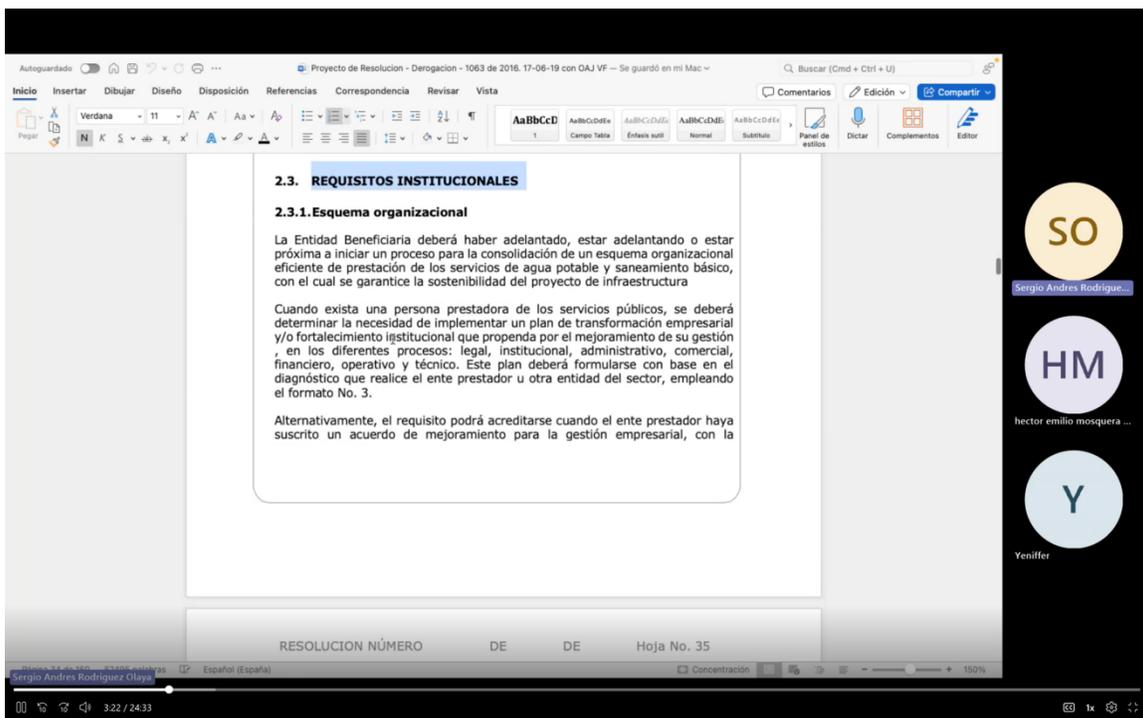


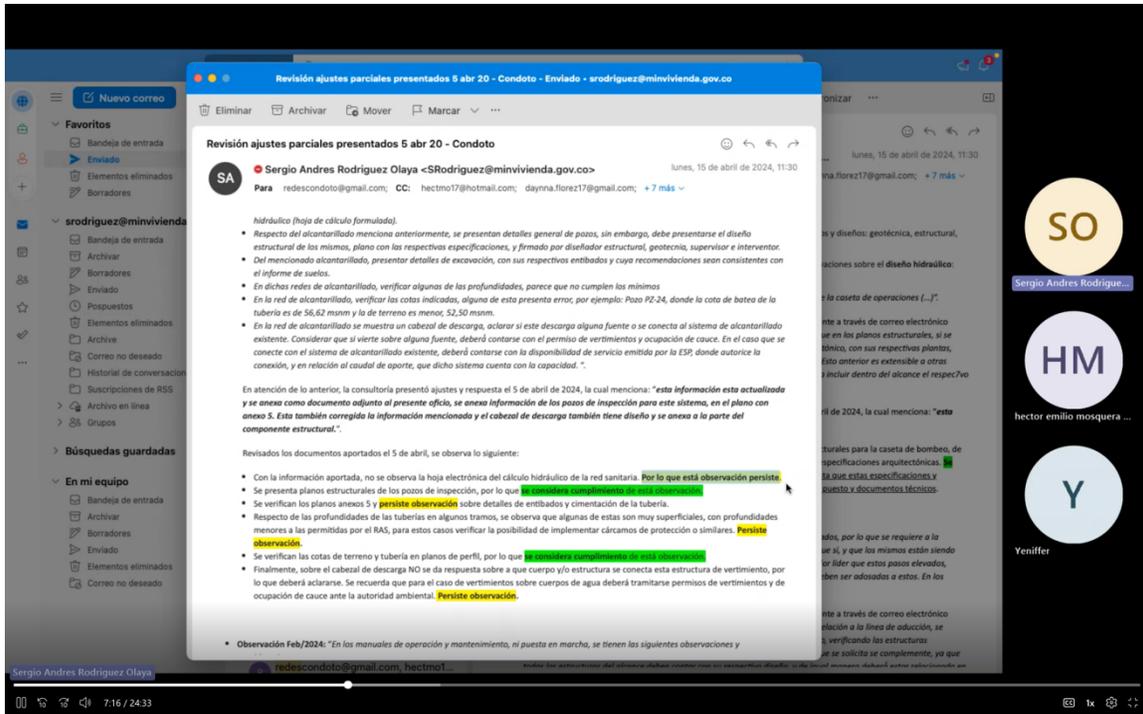

SO
Sergio Andres Rodriguez...

HM
hector emilio mosquera ...


Y
Yeniffer

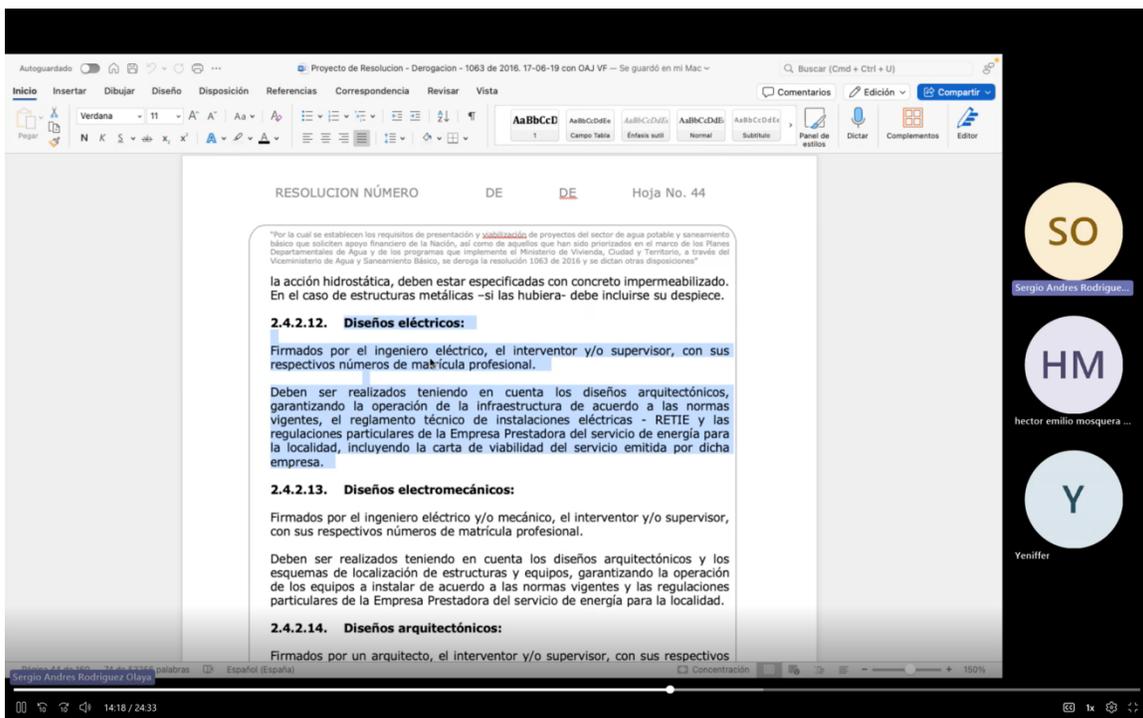

SO
Sergio Andres Rodriguez...

HM
hector emilio mosquera ...

Y
Yeniffer

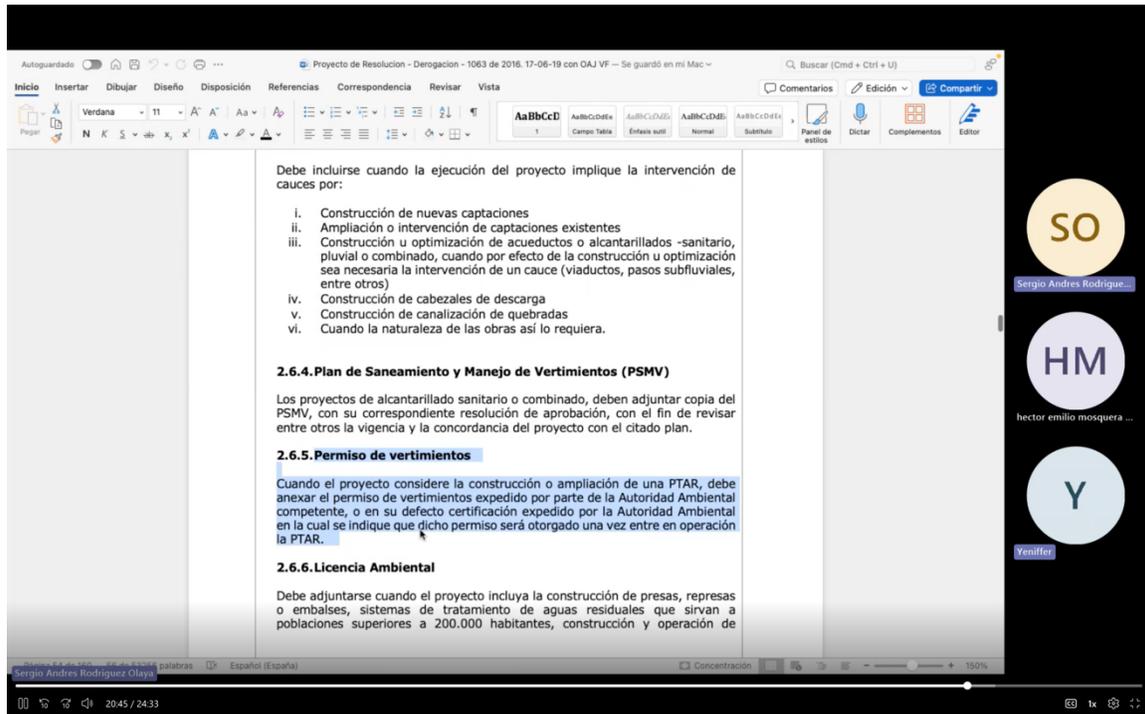

Anexos: (No aplica)

Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 16/07/2024
