



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 8 de agosto de 2024
HORA:	De 10:30 a 11:00 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	Ricardo Rueda, ingeniero civil, PDA de Atlántico, rrieda1000@gmail.com Marco Escolar, interventoría del proyecto, PDA de Atlántico, mescolar@atlantico.gov.co Armando Rodríguez, ingeniero civil, director de la consultoría de diseños, arujol@hotmail.com Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, MVCT, AACorcho@minvivienda.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Verificación de los temas pendientes.
3. Revisión del perfil de la interventoría.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se reúnen en la mesa de trabajo del 8 de agosto de 2024 para el seguimiento del proyecto **1-2022-43 EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO CAMPO DE LA CRUZ**, el formulador del proyecto en cabeza del Ingeniero Ricardo Rueda, el Ingeniero Marco Escolar, quien realizó la verificación del proyecto por parte del PDA de Atlántico. Por parte de la consultoría se encuentra el Ingeniero Armando Rodríguez, director de la consultoría del proyecto. Por parte del MVCT, se encuentra el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.
2. Se aclara que la mesa de trabajo tiene como intención establecer un plan de trabajo revisar los pendientes de manera general y a partir de esto, establecer fechas de radicación de los productos.


3. El ingeniero Alvaro Corcho menciona que la parte documental dependerá de la aprobación de los demás componentes, incluyendo el presupuesto.
4. Con respecto a la topografía se menciona que esta fue radicada el 11 de junio de 2024 y que no se ha realizado la revisión por parte del especialista del ministerio. El ingeniero Alvaro Corcho menciona que, debido a que no cuenta con la aprobación de la interventoría, se realizaría una nueva lista de requerimientos. Recomienda que se haga la radicación con la firma de aprobación de la interventoría para evitar reprocesos.
5. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que los componentes de hidráulica, geotecnia y predial no se ha hecho ningún tipo de subsanación.
6. Al respecto el Ingeniero Armando Rodríguez solicita el reenvío de las observaciones realizada por el equipo de evaluación del ministerio para realizar el 13 de agosto una revisión con interventoría y PDA, y de esta manera poder enviar la última versión de todos los documentos.
7. El Ingeniero Alvaro Corcho se compromete a enviar los requerimientos al finalizar la mesa de trabajo.
8. Continuando con el tema estructural se indica que este fue radicado el 11 de junio, con los mismos inconvenientes descritos en el numeral 4.
9. Consultoría y PDA se comprometen a reunirse el 13 de agosto y hacer la revisión de los componentes e incluir la firma de interventoría en todos los productos.
10. El Ingeniero Armando aclara que en la parte predial se cuenta con el certificado de Planeación de Campo de la Cruz en la que se indica que el proyecto no requiere de ningún tipo de permiso por servidumbres o compra de predio por estructuras puntuales.
11. El Ingeniero Alvaro Corcho solicita que se envíe la información.
12. Sobre el tema ambiental el ingeniero Alvaro Corcho solicita que se eleve la petición a la Corporación Autónoma Regional de Atlántico, ya que será necesario contar con el concepto de ellos por el cambio del punto de vertimiento.
13. El Ingeniero Armando Rodríguez menciona que el vertimiento se haría en una madre vieja del río Magdalena por lo que no se requeriría de tal permiso.
14. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que es imperativo tener en este caso el concepto escrito de la corporación, para que, al momento de ejecutar las obras, no haya ningún tipo de problema.
15. La mesa de trabajo finaliza a las 11:46 a.m.

COMPROMISOS

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo para revisión de productos previa radicación	PDA Atlántico Consultor	13/08/2024
2	Envío de los requerimientos de los diferentes componentes a la fecha	Alvaro Corcho	08/08/2024
3	Radicación de los productos	PDA	Pendiente por determinar
4	Mesa de trabajo con la corporación autónoma	MVCT, PDA, consultor, corporación	Pendiente por determinar

FIRMAS:

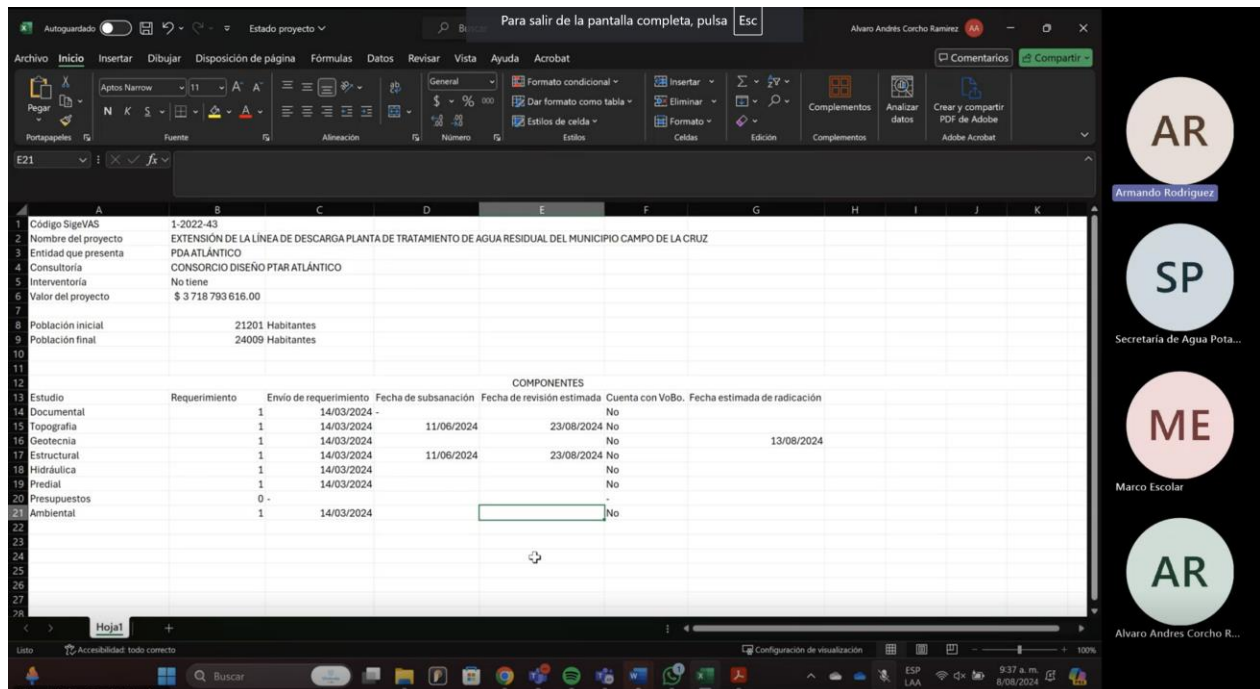

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

Código SigeVAS	Nombre del proyecto	Entidad que presenta	Consultoría	Interventoría	Valor del proyecto
1-2022-43	EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO CAMPO DE LA CRUZ	PDA ATLÁNTICO	CONSORCIO DISEÑO PTAR ATLÁNTICO	No tiene	\$ 3 718 793 616.00
8	Población inicial	21201 Habitantes			
9	Población final	24009 Habitantes			

	Requerimiento	Envío de requerimiento	Fecha de subsanación	Fecha de revisión estimada	Cuenta con VoBo.	Fecha estimada de radicación
13	Estudio	1	14/03/2024	-	No	
14	Documental	1	14/03/2024	11/06/2024	23/08/2024	No
15	Topografía	1	14/03/2024	11/06/2024	23/08/2024	No
16	Geotecnia	1	14/03/2024	11/06/2024	23/08/2024	No
17	Estructural	1	14/03/2024	11/06/2024	23/08/2024	No
18	Hidráulica	1	14/03/2024	11/06/2024	23/08/2024	No
19	Predial	1	14/03/2024	11/06/2024	23/08/2024	No
20	Presupuestos	0	14/03/2024	11/06/2024	23/08/2024	No
21	Ambiental	1	14/03/2024	11/06/2024	23/08/2024	No

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
 Fecha: 09/08/2024
