



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Colombia, Bogotá, 20 de agosto de 2024
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	<p>Paola Rodríguez, profesional universitaria, banco de proyectos, EAAAM S.A. E.S.P.</p> <p>Luisa Cárdenas, Ingeniera Civil, interventoría.</p> <p>Héctor Maffiu Herrera, profesional de apoyo, banco de proyectos, EAAAM S.A. E.S.P.</p> <p>Miguel Suárez, Ingeniero Civil, Interventor del proyecto.</p> <p>Luz Angélica Díaz, coordinadora de proyectos, Amarilo S.A.</p> <p>Diana Carolina Ramírez Pinto, coordinadora de urbanismo y servicios públicos, Amarilo S.A.</p> <p>Sandra Milena Acero, jefe de planeación y desarrollo integral, EAAAM S.A. E.S.P.</p> <p>Andrés Francisco Martínez Agudelo, director de proyectos, Amarilo S.A.</p> <p>John Alexander Rojas Moreno, director de diseños, Amarilo S.A.</p> <p>Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, VASB, MVCT, AACorcho@minvivienda.gov.co</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Revisión de los componentes pendientes del proyecto:
 - a. Componente presupuestal.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- b. Componente geotecnia.
 - c. Componente institucional.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se reúne en la mesa de trabajo del 20 de agosto de 2024 para el seguimiento del proyecto **1-2023-62 CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE 4800 FUSIONADO AL ACERO VFA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMPENSACIÓN DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA** por parte de la Empresa Pública de Alcantarillado, Agua y Aseo de Madrid S.A. E.S.P. (EAAAM S.A. E.S.P.), la ingeniera Paola Rodríguez, el ingeniero Héctor Herrera y la doctora Sandra Acero, por parte del equipo consultor de Amarilo S.A. se encuentran la Ingeniera Angélica Díaz, la Ingeniera Diana Ramírez, el Ingeniero Andrés Martínez y el Ingeniero John Rojas. Por parte de la consultoría del proyecto, se encuentra la Ingeniera Luisa Cárdenas y el Ingeniero Miguel Suárez. Por parte del MVCT se encuentra el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.
2. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que el propósito de la mesa de trabajo es hacer un seguimiento a los compromisos adquiridos en la mesa del 2 de abril de 2024, empezando por el tema presupuestal. Menciona que quedaba pendiente la actualización de este producto, y que había temas relacionados al transporte que se debían ajustar.
3. Al respecto, la ingeniera Diana Ramírez, menciona que están retomando el proyecto, y que quedaba pendiente definir los temas del A.I.U, impuestos, zonas de disposición del material, además de la actualización de costos.
4. El ingeniero Alvaro Corcho pregunta por la zona del sitio de disposición.
5. La doctora Sandra Acero menciona que en otros proyectos han allegado un certificado, y solicita mostrar este documento para ver cómo proceder al respecto.
6. Mientras se hace la búsqueda de este documento, el Ingeniero Miguel Suárez pregunta sobre el tema de suministro del tanque.
7. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que se debe considerar como una sola actividad el suministro e instalación del tanque. De acuerdo con la resolución 0661 de 2019 esta separación se hace con el suministro de tubería.
8. Se continúa con los otros componentes, se aclara que el tema estructural y predial se encuentran en revisión por parte del equipo de evaluación de proyectos.
9. Finalmente se presenta el certificado con la identificación de dos (2) puntos, que tienen permiso de la CAR para la disposición de residuos de construcción.
10. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que se debe incluir una imagen que permita identificar la distancia entre el sitio de obra y el punto de disposición, valor que debe coincidir con el presupuesto. Revisar el APU, y ajustar de acuerdo a valores adicionales como cobro por disposición, peajes, entre otros.

11. Continuando con el componente de geotecnia y suelos, el Ingeniero Alvaro Corcho solicita confirmar si el pasado 14 de marzo se recibieron las observaciones de este componente.
12. La Ingeniera Diana Ramírez solicita que se envíe de nuevo esta información. (En la revisión realizada en correos enviados, esta información había sido suministrada el mismo día de la revisión por parte del ingeniero especialista del ministerio).
13. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que los requerimientos que se presentan en este correo son reiteraciones de la revisión pasada realizada por la anterior evaluadora. Se hace envío de la información y se confirma el recibido de esta.
14. Con respecto al componente institucional, se pregunta el estado del componente, teniendo en cuenta que esta información fue solicitada en la primera revisión del año 2023, con encargo de EPC, y que, a la fecha no se ha recibido.
15. La doctora Sandra Acero indica que se ha elevado la solicitud a EPC y que esta se encuentra en manos del ingeniero Víctor Garzón.
16. Teniendo en cuenta que se ha cubierto los componentes pendientes, Ingeniero Alvaro Corcho pregunta por fechas para la radicación de los productos, iniciando con el tema presupuestal.
17. La ingeniera Diana Ramírez menciona que una vez se envíe el certificado, el tema de impuestos, se puede tener en dos semanas el producto para revisión por parte de la interventoría.
18. Se solicita el envío de los impuestos para la ejecución de la obra por parte de la empresa de servicios y EPC.
19. El Ingeniero Miguel Suárez menciona que en término de una semana se tendría la revisión del presupuesto, quedando como fecha pactada el 26 de septiembre.
20. Sobre el componente de geotecnia se pacta la misma fecha, teniendo en cuenta que es un subcontrato.
21. Del tema estructural y predial, los cuales se encuentran en revisión por parte de los especialistas del ministerio, se espera que se tengan la aprobación o nuevas observaciones para el 6 de septiembre.
22. El tema institucional se estima para el 6 de septiembre.
23. La mesa de trabajo finaliza a las 3:27 p.m.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Componente presupuestal	Amarilo, interventoría y formulador	16 de septiembre 2024
2	Geotecnia	Amarilo, interventoría y formulador	16 de septiembre de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Estructural y predial	MVCT	6 de septiembre de 2024
4	Institucional	EPC y formulador.	6 de septiembre de 2024

FIRMAS:

Seguimiento tanque de almacenamiento Madrid - Cundinamarca

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

08:13

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Transcripción

PR 3:05 p. m.
Buenas tardes.

Mi nombre es Paula Rodríguez, soy profesional universitario del área de Banco de proyectos de la empresa de Acueducto de Madrid.

AR Alvaro Andres Corcho Ramirez 3:05 p. m.
Gracias, ingeniera Luisa, por favor.

LC Luisa Cardenas. (No comprobado) 3:05 p. m.
Buenas tardes, Eh, soy la ingeniera Luisa.

Hago parte de la interventoría con el ingeniero Miguel Suarez.

AR Alvaro Andres Corcho Ramirez 3:05 p. m.
Gracias Héctor Herrera.


HH Hctor Maffiu Herrera (No comprobado) 3:05 p. m.
Buenas tardes para todos.

Mucho gusto, mi nombre es tu hermana Ferrera, hago parte de acá de la I am en la oficina de Planeación y como apoyo a Banco Proyectos.

AR Alvaro Andres Corcho Ramirez 3:06 p. m.
Gracias, ingeniero Miguel.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

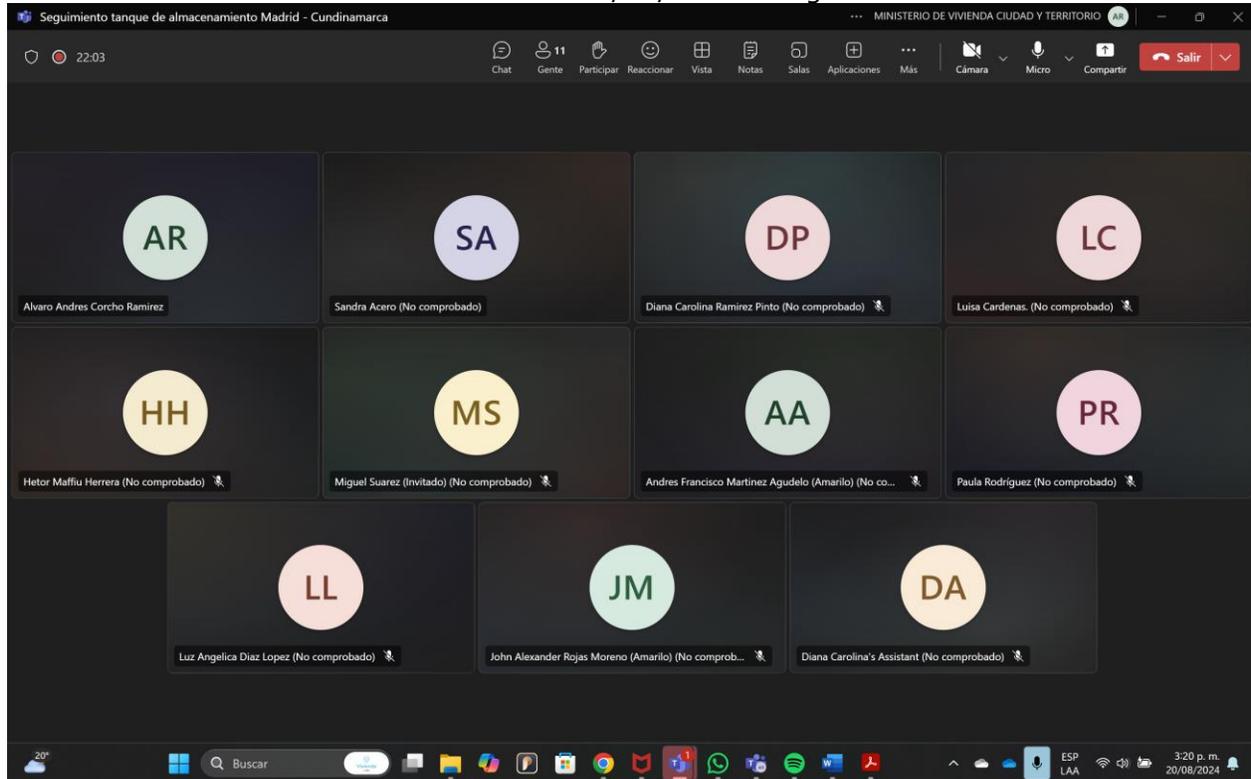

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 20/08/2024
