



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 22

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 21 de agosto de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Cristian Palma, Alcaldía de Baranoa, Atlántico Lady Ospina, Gobernación del Atlántico Juan Camilo Manotas, Alcaldía de Baranoa, Atlántico Ricardo Rueda, Gobernación del Atlántico Danny Santos, Empresa de Servicios Públicos Julián Mesino, Empresa de Servicios Públicos Oscar López, Consultoría del proyecto Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Naty Vanesa Rivero Galvis, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jairo Arely Urbina Gómez, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP José Eduard Guazá Zabala, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando que se inicia por el componente topográfico del proyecto, que tiene aval.
 - El Ingeniero Jesús Castro, indica que emitió su aval del proyecto, sin embargo se debe allegar todo el componente compilado.
 - El Ingeniero Ricardo Rueda recomienda a Julián Mesino que envíe el compilado del componente topográfico del proyecto.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes indica que el proyecto tiene aval topográfico, predial e institucional.
 - El Ingeniero José Eduard Guazá Zabala, indica que están en un 95% las observaciones que se realizaron. Hay que realizar observaciones en la EBAP.
 - El Ingeniero Ricardo Rueda, pide esas observaciones para el día 21 de agosto de 2024.
 - El Ingeniero Ricardo Rueda indica que las subsanaciones geotécnicas se remitirán el día 22 de agosto de 2024.
 - La Ingeniera Naty Rivero indica que a más tardar el 2 de septiembre de 2024, remitirá su revisión geotécnica.
 - El Ingeniero Ricardo Rueda, indica que para el componente estructural se hicieron todas las subsanaciones. Se presentaron cambios en los planos.
 - El Ingeniero Julián Mesino indica que el proyecto fue dividido por componentes. Ya se cuenta con las subsanaciones, pero se trabaja en el tema del tanque elevado. Las subsanaciones se entregarán el 28 de agosto de 2024.
 - La Ingeniera Mayra Martínez indica que en cuánto al presupuesto, solamente se envió el presupuesto eléctrico. Pregunta cómo está dicho componente.
 - El Ingeniero Julián Mesino indica que la directriz es el visto bueno de los componentes, antes de enviar el presupuesto final. Se ha adelantado la actualización de cotizaciones.
 - La Ingeniera Mayra Martínez recomienda que se adelante la revisión, para que después no haya urgencias en tiempos.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes indica que para la parte documental, envió las observaciones documentales. La parte hidráulica, la remitirá el 30 de agosto de 2024. Solicita para la mesa de trabajo del 3 septiembre de 2024, que se envíe un adelanto del presupuesto.
 - El Ingeniero Julián Mesino, indica que el 30 de agosto de 2024, va a remitir subsanaciones presupuestales.
4. Cierre de la reunión.




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de observaciones eléctricas del proyecto	José Eduard Guazá Zabala, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	21/08/2024
2	Entrega de subsanaciones geotécnicas del proyecto	Ricardo Rueda, Gobernación del Atlántico	22/08/2024
3	Entrega de observaciones geotécnicas del proyecto	Naty Vanesa Rivero Galvis, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	02/09/2024
4	Entrega de subsanaciones estructurales del proyecto	Julián Mesino, Empresa de Servicios Públicos	28/08/2024
5	Entrega de observaciones hidráulicas del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	30/08/2024
6	Entrega de subsanaciones presupuestales del proyecto	Julián Mesino, Empresa de Servicios Públicos	30/08/2024
7	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de	03/09/2024

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
		Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	

FIRMAS:

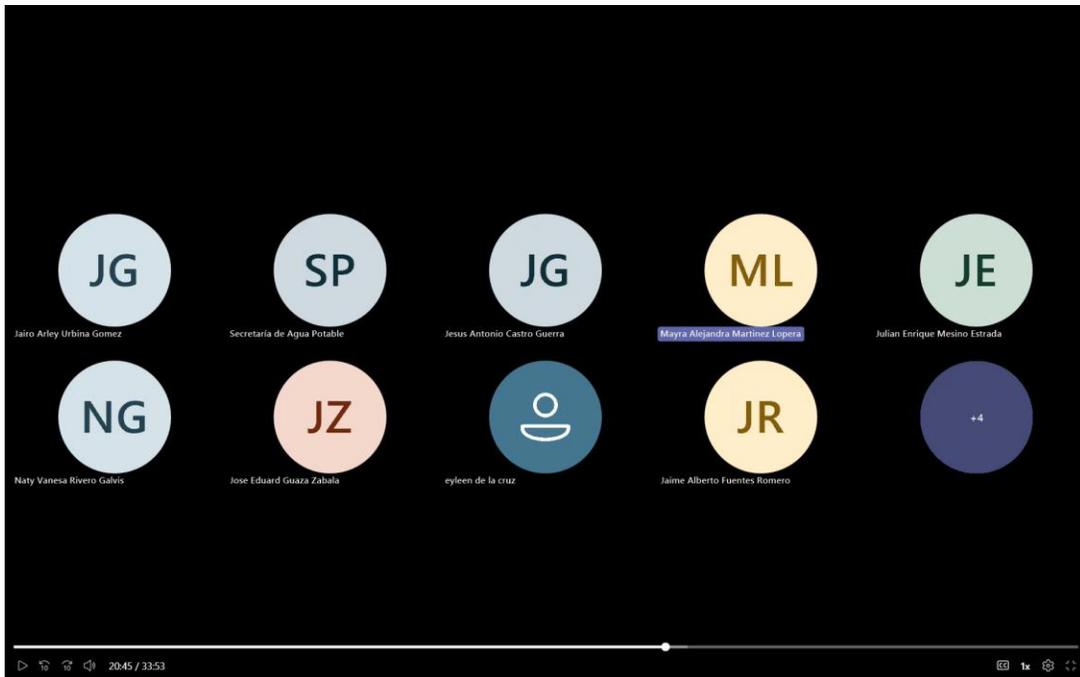

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/21/24, 10:00:16 AM	8/21/24, 10:34:01 AM	33 min 44 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Juan Camilo Manotas - Alcaldía De Baranoa (No comprobado)	8/21/24, 10:00:22 AM	8/21/24, 10:34:19 AM	33 min 57 s		Moderador
Secretaría de Agua Potable	8/21/24, 10:00:23 AM	8/21/24, 10:33:59 AM	33 min 36 s	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	Moderador
Jesus Antonio Castro Guerra	8/21/24, 10:00:51 AM	8/21/24, 10:34:11 AM	33 min 19 s	JACastro@minvivienda.gov.co	Moderador
Danny Javier Santos Oviedo	8/21/24, 10:01:05 AM	8/21/24, 10:34:07 AM	33 min 2 s	danny.santos@aaa.com.co	Moderador
Oscar Julian Lopez Pedroza	8/21/24, 10:01:29 AM	8/21/24, 10:34:04 AM	32 min 34 s	o.lopezp@uniandes.edu.co	Moderador
Naty Vanesa Rivero Galvis	8/21/24, 10:01:34 AM	8/21/24, 10:34:12 AM	32 min 38 s	NRivero@minvivienda.gov.co	Moderador
Jairo Arley Urbina Gomez	8/21/24, 10:02:45 AM	8/21/24, 10:34:05 AM	31 min 20 s	JUrbina@minvivienda.gov.co	Moderador
Julian Enrique Mesino Estrada	8/21/24, 10:03:42 AM	8/21/24, 10:16:21 AM	12 min 38 s	julian.mesino@aaa.com.co	Moderador
Julian Enrique Mesino Estrada	8/21/24, 10:18:11 AM	8/21/24, 10:34:39 AM	16 min 28 s	julian.mesino@aaa.com.co	Moderador
Jose Eduard Guaza Zabala	8/21/24, 10:05:31 AM	8/21/24, 10:34:00 AM	28 min 29 s	JGuaza@minvivienda.gov.co	Moderador
eyleen de la cruz	8/21/24, 10:12:45 AM	8/21/24, 10:38:10 AM	25 min 25 s		Moderador
EDINSON JOSE PALMA J (No comprobado)	8/21/24, 10:15:29 AM	8/21/24, 10:34:22 AM	18 min 53 s		Moderador
Mayra Alejandra Martinez Lopera	8/21/24, 10:21:42 AM	8/21/24, 10:34:03 AM	12 min 20 s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 21-08-2024
