



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Colombia, Bogotá, 25 de septiembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	Paola Rodríguez, profesional universitaria, banco de proyectos, EAAAM S.A. E.S.P. Luisa Cárdenas, Ingeniera Civil, interventoría. Héctor Maffiu Herrera, profesional de apoyo, banco de proyectos, EAAAM S.A. E.S.P. Miguel Suárez, Ingeniero Civil, Interventor del proyecto. Katherine Bohórquez, jefe de planeación y desarrollo integral, EAAAM S.A. E.S.P. Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, VASB, MVCT, AACorcho@minvivienda.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Revisión de los componentes pendientes del proyecto:
 - a. Componente presupuestal.
 - b. Componente geotecnia.
 - c. Componente institucional.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se reúne en la mesa de trabajo del 25 de septiembre de 2024 para el seguimiento del proyecto **1-2023-62 CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE 4800 FUSIONADO AL ACERO VFA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMPENSACIÓN DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA** por parte de la Empresa Pública de

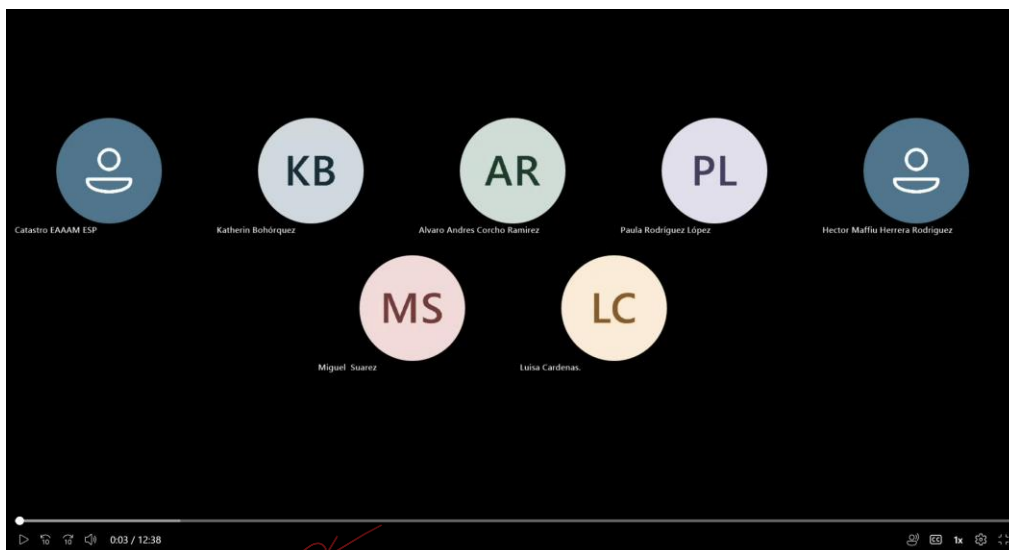
Alcantarillado, Agua y Aseo de Madrid S.A. E.S.P. (EAAAM S.A. E.S.P.), la ingeniera Paola Rodríguez, el ingeniero Héctor Herrera y la Ingeniera Katherine Bohórquez. Por parte de la interventoría del proyecto, se encuentra la Ingeniera Luisa Cárdenas y el Ingeniero Miguel Suárez. Por parte del MVCT se encuentra el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.

2. El ingeniero Alvaro Corcho, hace alusión a los componentes pendientes y las fechas establecidas para la radicación de los productos. Teniendo en cuenta que la doctora Sandra Acero, se encuentra en el proceso de empalme con la Ingeniera Katherine Bohórquez, se hace un barrido de los diferentes componentes que se evalúan en el mecanismo de viabilización del MVCT.
3. Se inicia con el componente documental, se explica que este depende del presupuesto, el cual se encuentra en actualización y ajuste.
4. Del componente institucional, se indica que EPC fue el responsable del diagnóstico de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (EAAAM), y que, aunque fue requerido hace más de un año, a la fecha no se ha tenido ningún tipo de subsanación del producto.
5. Con respecto a lo anterior, el ingeniero Alvaro Corcho solicita al personal del EAAAM que aclaren el estado de la solicitud de actualización del diagnóstico.
6. La Ingeniera Katherine Bohórquez menciona que, en el proceso de empalme, no se ha podido revisar los documentos de este proyecto, por lo que no hay claridad del estado de solicitud.
7. El Ingeniero Alvaro Corcho solicita revisar el tema para la siguiente mesa de trabajo, y de esta forma mirar la posibilidad de solicitar un acompañamiento por parte del ministerio ante EPC, para darle celeridad al componente.
8. Con respecto al tema técnico, se menciona que los componentes de topografía e hidráulica se encuentran aprobados, quedando pendiente un tema de firmas. Del componente estructural se espera respuesta por parte del especialista del ministerio para el 11 de octubre.
9. Del componente geotécnico, se menciona que este fue requerido por el especialista, y que AMARILO, quienes son los responsables del componente técnico, habían quedado de radicar el 16 de septiembre, fecha que no se cumple. Al no haber presencia de AMARILO, no se puede establecer una nueva fecha de radicación.
10. Del componente predial, se indica que se realizaron observaciones al plano presentado ya que no contaba con el detalle requerido.
11. Del componente presupuestal se menciona que la solicitud de revisión y actualización fue realizada y, que dentro de los compromisos quedaba radicar el producto para el 16 de septiembre.
12. Sin tener otro tema, se da paso a la Ingeniera Katherine Bohórquez quien solicita información del estado de los productos técnicos pendientes a la interventoría, y si estos productos ya fueron radicados a ellos.
13. La Ingeniera Luisa Cárdenas responde que no han radicado nada para revisión.

- 14.El Ingeniero Miguel Suárez indica que se reunieron aproximadamente ocho (8) días antes de esta mesa de trabajo, pero, secundando la información de la Ingeniera Luisa Cárdenas, no se radicó nada.
- 15.El Ingeniero Alvaro Corcho solicita confirmar disponibilidad para una nueva mesa de trabajo para el 11 octubre con AMARILO.
- 16.La mesa de trabajo finaliza a las 10:32 a.m.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Componente presupuestal	Amarilo, interventoría y formulador	Por determinar
2	Geotecnia	Amarilo, interventoría y formulador	Por determinar
3	Estructural y predial	MVCT	11/10/2024
4	Institucional	EPC y formulador.	Por de terminar
5	Mesa de seguimiento	Todos	11/10/2024

FIRMAS:

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 25/09/2024
