



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 16

### DATOS GENERALES

|             |   |
|-------------|---|
| FECHA:      | Bogotá, Colombia, 25 de septiembre de 2024  |
| HORA:       | De 14:00 a 15:00 horas  |
| LUGAR:      | Reunión virtual   |
| ASISTENTES: | Sair Giraldo – Secretaría de Planeación Municipal<br>Ana Lucia López – Apoyo técnico Sría. Planeación Municipal<br>Jorge Moreno – Rep. Legal contratista de obra<br>Vivian Beltran – Consorcio contratista<br>Miguel Sánchez – Ing. Residente de interventoría<br>Sayda Montes – Supervisora CUR 639-2019<br>Angela Cuadros - Abogado contratista DIDE<br>Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy. |
| INVITADOS:  | N/A   |

### ORDEN DEL DIA:

Reunión de Seguimiento a la terminación del proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS.

### DESARROLLO:

Se inició la reunión por parte del MVCT, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados en el comité anterior y conocer el resultado del recorrido programado para el 21 de septiembre de 2024.

Al respecto indicó el municipio que se realizó el recorrido programado en el área de barcaza, con el Director de la Unidad de Servicios Públicos de Leticia - USPL, el acompañamiento por parte de la supervisión del Municipio, contratista de obra y la delegación por parte de la interventoría. En el recorrido se observó que el nivel de la quebrada Yahuaraca está muy bajo debido al verano que se presenta en la región y esto podría generar dificultades para las pruebas de bombeo; asimismo se realizó una inspección en la barcaza para la instalación de las motobombas, frente a lo cual se observó la necesidad de realizar unas adecuaciones electromecánicas, que serán realizadas por parte de la Unidad de Servicios Públicos de Leticia, con el objeto de que los equipos a instalar queden funcionales y se puedan operar de manera



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

alternada, garantizando la operación de los dos equipos, pero con las limitantes de bombeo por las condiciones actuales de la fuente.

Para llevar a cabo las actividades de instalación de los equipos de bombeo y sus pruebas hidráulicas, se estructuró, entre el contratista de obra y la interventoría, un plan de trabajo para desarrollar dichas actividades entre el 12 y 19 de octubre de 2024, el cual se encuentra en revisión del Municipio; no obstante, de manera preliminar, la entidad territorial indicó que el plan de trabajo contempla, una suspensión de los contratos de obra e interventoría por término de quince (15) días, mientras se realizan las actividades de adecuación a cargo de la Unidad de Servicios Públicos de Leticia.

Por parte del MVCT se solicitó al Municipio, entregar el plan de trabajo completo que incluya las actividades, tiempos y responsables de realizar tanto las actividades de adecuación preliminar a cargo de la USPL, como las actividades para la terminación de la totalidad de actividades a cargo del contratista de obra. Al respecto, el municipio se compromete a entregar este plan de trabajo al MVCT para el 27 de septiembre de 2024.

Respecto a las pólizas, el MVCT solicitó aclarar cuál es la dificultad que se tiene para actualizar las pólizas del contrato de obra según el último reinicio suscrito. Por parte del Contratista se informó que la compañía de seguros no ha manifestado tener alguna justificación en particular y se espera tener las pólizas actualizadas, al finalizar el presente día.

De otra parte, el contratista indicó que ya se realizaron los recorridos con todas las partes a las obras ejecutadas y se tienen unas observaciones puntuales, por lo cual propone que se suscriba un compromiso con la interventoría y la supervisión del Municipio para empezar a revisar la documentación requerida para el recibo y liquidación del contrato, de forma paralela a la ejecución de las demás actividades.

El MVCT sugiere que se avance de manera paralela con la recopilación y revisión de los documentos requeridos para la liquidación de los contratos de obra e interventoría.

La Secretaria de Planeación Municipal manifestó respecto a lo que se ha venido hablando en el transcurso de la reunión que, la condición en la que se encuentra el Río Amazonas y particularmente la Quebrada Yahuarca donde se capta el agua para el acueducto, es de aguas bajas, siendo una condición normal de cierta manera; es decir, en la región se tiene un régimen mono modal, donde actualmente hay una



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

época marcada de aguas bajas, por lo que se debe probar las bombas para esa condición de operación, que se va a tener una vez al año. Eso quiere decir que desde el municipio se deben tomar las provisiones con la Unidad de Servicios Públicos de Leticia para que las bombas a instalar funcionen en esta época, seguramente no de forma simultánea por el nivel de la fuente, pero que puedan operar de forma paralela cuando las condiciones así lo permitan.

Se da por terminada la reunión y se pactan los siguientes compromisos.


### COMPROMISOS

| No. | Compromiso   | Responsable          | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--|----------------------|------------------------------|
| 1   | Entrega de plan de trabajo para las adecuaciones previas en la barcaza y posterior instalación de los equipos de bombeo, así como la terminación del proyecto. | Municipio de Leticia | 27-sep-2024                  |
|     |  |                      |                              |

**FIRMAS:** [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_OTdhMmE1MWMtN2I5ZC00Mzg2LTg1Y2EtYTY0OWE0MTUzYjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdhMmE1MWMtN2I5ZC00Mzg2LTg1Y2EtYTY0OWE0MTUzYjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d)



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

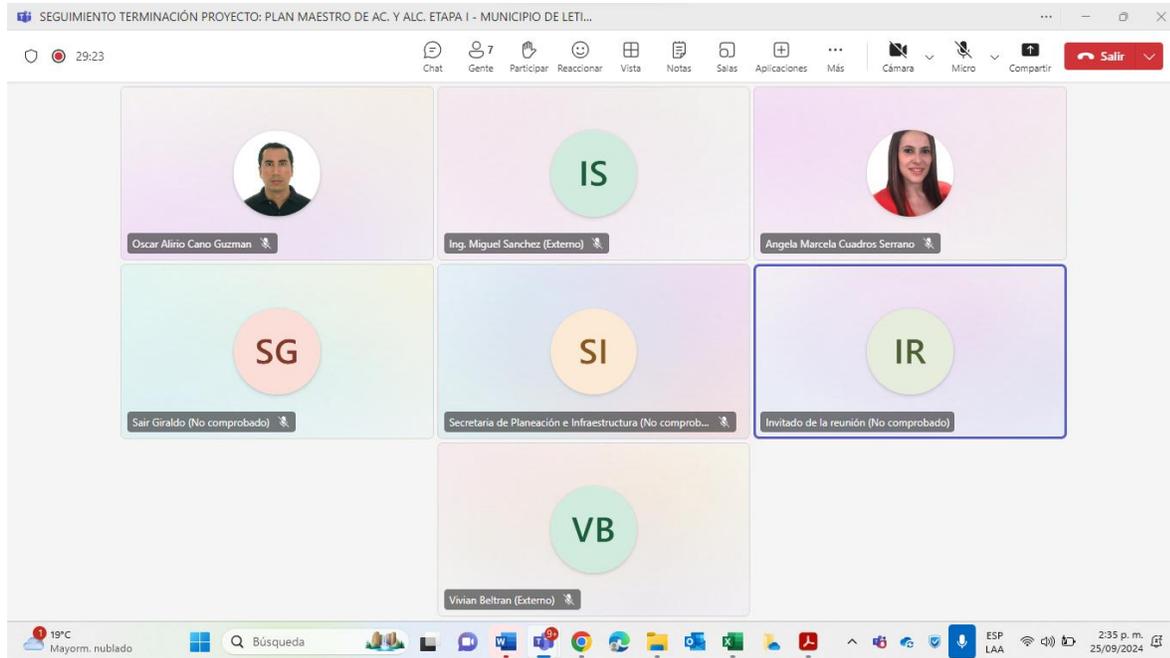

Elaboró: Oscar Cano   
Revisó: Sayda Montes  
Fecha: 25-sep-2024
