

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 1 - Mayo 2024**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 2 de mayo de 2024.
HORA:	7:00 a.m. a 9:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Proyecto Acueducto Lebrija – CUR 311-2017
2. Proyecto Acueducto Mogotes – CUR 1373-2023
3. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
4. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
5. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

### **DESARROLLO:**

1. Proyecto Acueducto Lebrija – CUR 311-2017

Proyecto en ejecución, se ejecuta la actividad de "Actualización de diseños conforme los requerimientos de los futuros operadores, amb S.A. E.S.P. y Empulebrija E.S.P.", prórroga por tres (3) meses, aprobada en el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo del día 09/04/2024 (Sesión No. 450), por lo que la nueva fecha de terminación es el 10/07/2024. Avance del proyecto 26,21%. Findeter se encuentra en trámite con Alcaldía de Bucaramanga de licencia de intervención y ocupación de espacio público de Bucaramanga.

2. Proyecto Acueducto Mogotes – CUR 1373-2023

El Ministerio solicita a la Esant el tramite de Acta de Inicio del proyecto y tramite de desembolso del primer 30% del proyecto, con fecha del 2 de mayo de 2024, el cronograma de actividades en porcentaje y en proyet, cuadro de cantidades viabilizadas con porcentajes ejecutadas mensuales con el informe de interventoría mensual e informe gerencial del proyecto semanal todos los jueves.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

La Esant informa que el día de hoy se aprueban las pólizas por parte de la Esant y se inicia el trámite de acta de inicio de obra contrato 056-24 entre la ESANT y Consorcio Ptap Mogotes.

La Esant indica que ya se tiene la información recopilada de acuerdo con la lista de chequeo enviada por el Ministerio y se encuentra en trámite de conseguir cuenta bancaria del FIA, para trámite de primer desembolso.

El componente social se define el 30 de mayo de 2024 en Mogotes por parte del Ministerio, con visita al Municipio de Mogotes.

El Ministerio solicita se actualice la plataforma Sigevas con la información precontractual, contractual incluyendo los contratos de obra e Interventoría.

La Esant indica que la Ingeniera Sandra Chacón es la encargada de cargar la información en Sigevas a partir de la fecha.

### 3. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

La Esant informa que el proyecto tiene fecha de terminación 9 de febrero de 2024.

La Esant se encuentra en trámite de socialización de entrega del proyecto a la comunidad, veedores y Municipio.

El contratista se encuentra en arreglo de observaciones de 2 llaves por cambio de material y malla de aseguramiento.

El Ministerio solicita se actualice la plataforma Sigevas con informes de supervisión de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024 y Acta de recibo final del proyecto.

### **COMPROMISOS** (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Licencia de intervención y ocupación de espacio público	FINDETER	15-06-2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	de Bucaramanga. Proyecto Lebrija		
2	Acta de inicio proyecto Mogotes	ESANT	2-05-2024
3	Solicitud de primer desembolso proyecto Mogotes	ESANT	2-05-2024
4	Contratos de obra e Interventoría proyecto Mogotes	ESANT	3-05-2024
5	Reunión social por el Ministerio en el Municipio de Mogotes	MINISTERIO	30-05-2024
6	Arreglo de 2 llaves y malla proyecto Socorro.	CONTRATISTA DE OBRA	17-05-2024
7	Actualización de plataforma Sigevas.	ESANT	15-05-2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**FIRMAS:**

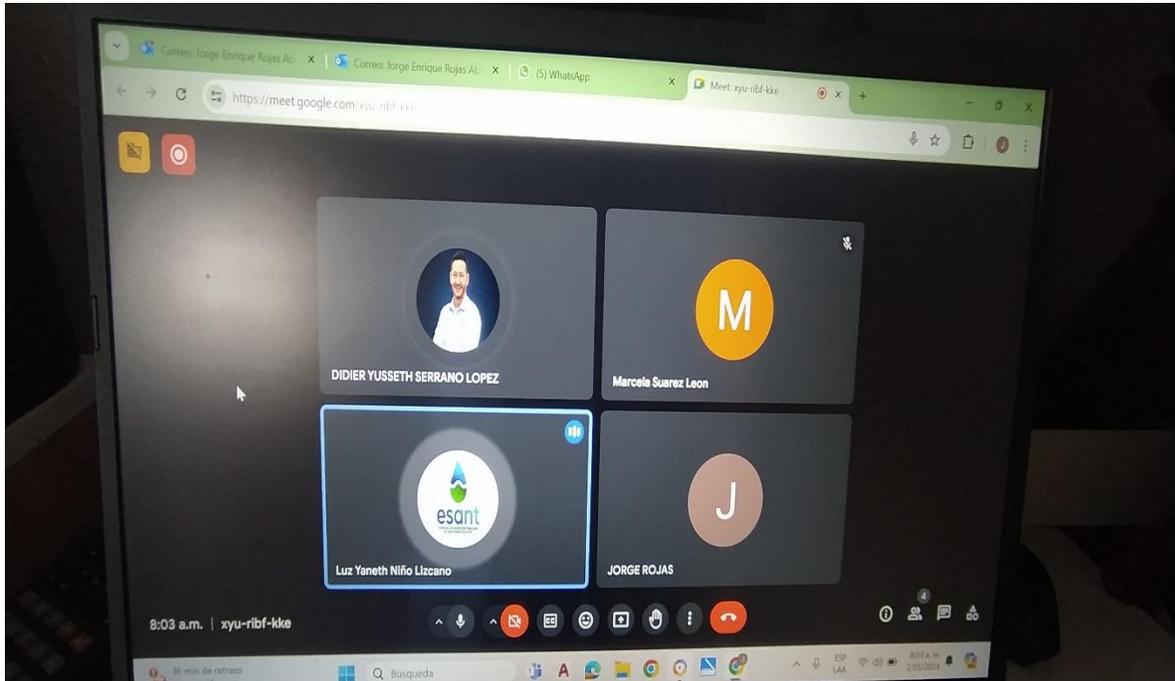

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: Mayo 2 de 2024
