

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 9 - Mayo 2024

### DATOS GENERALES

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá, Colombia, 17 de mayo de 2024. |
| HORA:       | 10:00 a.m. a 11:00 a.m.               |
| LUGAR:      | Virtual                               |
| ASISTENTES: | Relacionados en Firmas                |
| INVITADOS:  | Relacionados en Firmas                |

### ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

### DESARROLLO:

1. En la reunión participan el Ministerio de Vivienda y la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.

La ingeniera Adriana Serrano directora del proyecto por parte del contratista informa que en la revisión preliminar de las cantidades contratadas con respecto a los planos viabilizados se presenta el siguiente balance del proyecto:

1. Suministro e instalación de 862 ml de aducción en tubería de PVC de D=20" RDE 21., en los planos la cantidad se mantiene igual.
2. Suministro e instalación de 30 codos HD 20" x 22, en los planos la cantidad es de 33 codos.
3. Suministro e instalación de 30 codos HD 20" x 11", en los planos la cantidad es de 37 codos.
4. Suministro e instalación de válvula mariposa tipo bridada cuerpo en HD vástago y disco en acero D=20", en los planos la cantidad se mantiene igual.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. Suministro e instalación válvula purga en acero D=8", en los planos la cantidad se mantiene igual.
6. Suministro e instalación de 4 válvulas ventosa antifraude de 4" extremo Brida ANSI, en los planos la cantidad se mantiene igual.
7. Suministro e instalación de 61 uniones dresser 20", en los planos la cantidad es de 70 codos.
8. El valor del proyecto es \$ 3.375.857.801 que incluye Obra, Interventoría y seguimiento por parte del Ministerio, el cual no varía con el acta de mayores y menores cantidades y se mantiene igual.


De acuerdo con lo anterior la Empresa Piedecuestana de Servicios públicos realizara acta de mayores y menores cantidades en conjunto con el contratista e Interventoría e informaran al Ministerio del ajuste de cantidades teniendo en cuenta que corresponden a los planos viabilizados.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso                           | Responsable           | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1   | Acta de mayores y menores cantidades | Empresa Piedecuestana | 30-05-2024                   |

**FIRMAS:**

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

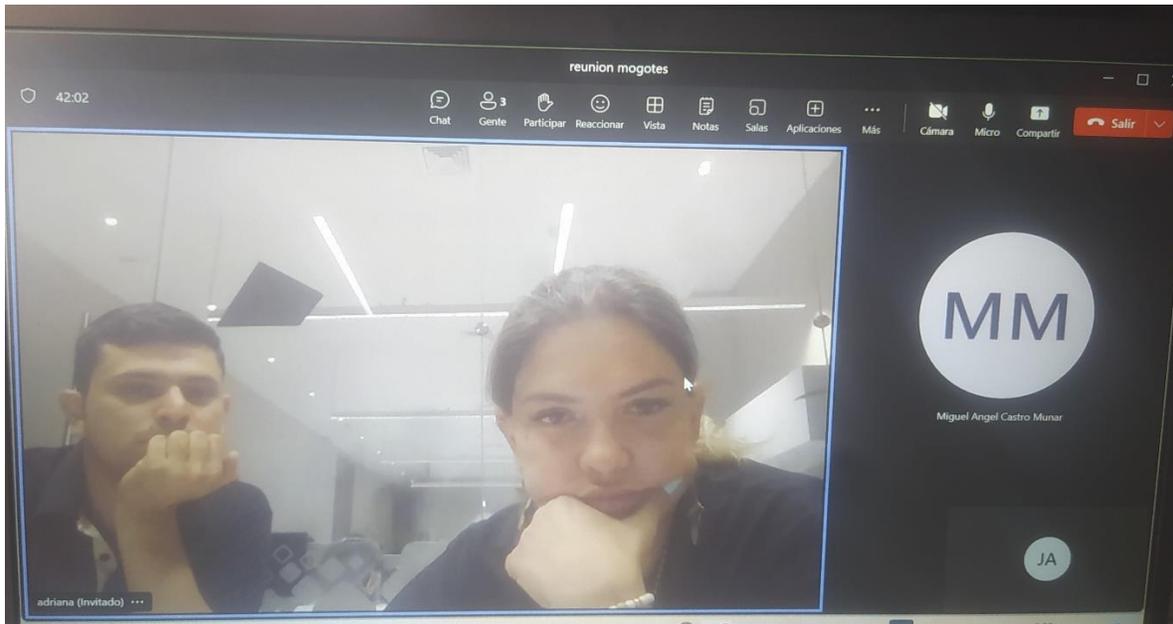

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   
Revisó:  
Fecha: Mayo 17 de 2024
