

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 5 - Julio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de Julio de 2024.
HORA:	11:00 a.m. a 1:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto: Reformulación No. 1 plan maestro alcantarillado Paratebueno.

DESARROLLO:

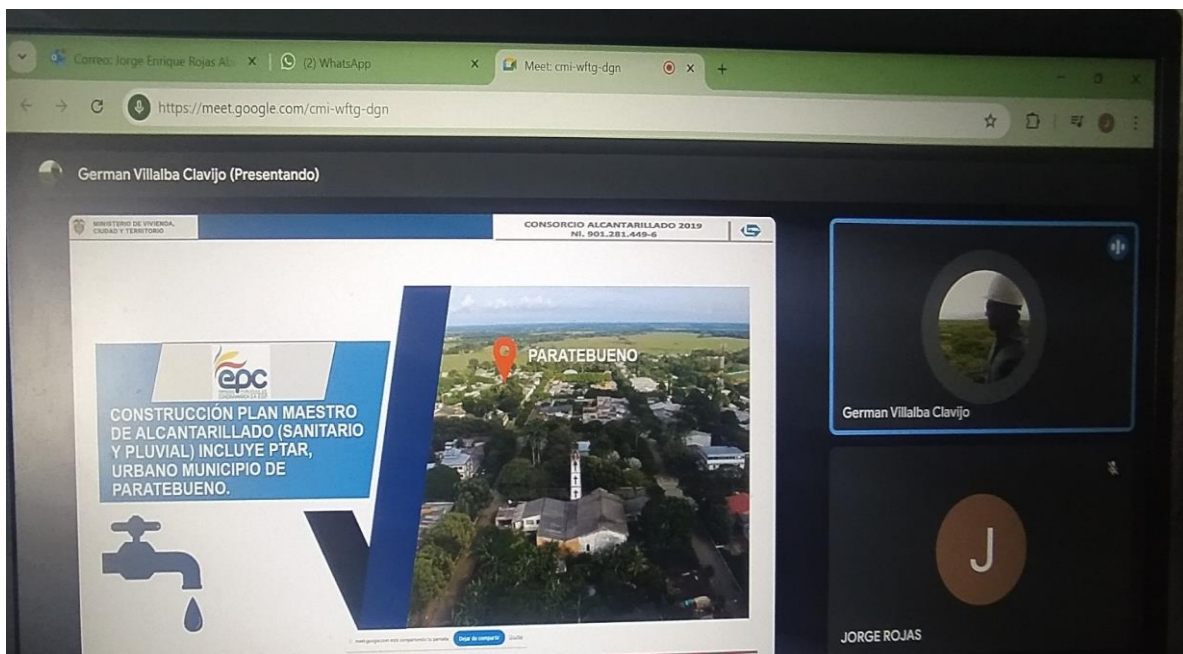
Relacionados en acta anexa.

COMPROMISOS (Si aplica)

Relacionados en acta anexa.

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 






Revisó:

Fecha: 17 de julio de 2024

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	17/07/2024	No. ACTA:	
---------------	------------	------------------	--

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Reunión Seguimiento PMA Puentebueno		
LUGAR:	Oficina EPC		
HORA INICIO:	11:00 AM	HORA FIN:	1:00 PM

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	David Fernando Suarez	Interventora	
2	Edwar Andres Sepulveda	Controlista Obra	
3	Clarida Johanna Remy	Gerente ESP Puentebueno	
4	Alvaro E. Vargas D.	Prof. Apoyo / Planeación Alcaldia P. B. B.	
5	Cesar H. Garcia R.	Prof. Apoyo Supervisión E.P.C.	
6	Manuel G. Granados	E.P.C. SA EOP Prof. Master	
7	Germán Villalba Clavijo	Contratista Dirección de Proyectos	
8			
9			
10			
11			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:

17/07/2024

No. ACTA:

ORDEN DEL DÍA:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Nos reunimos los firmantes del acta junto con el Ingeniero Jorge Rojas del MVCT, y se realiza la presentación de los presentes, adicionalmente de manera virtual se presenta el alcalde del municipio.

Se inicia la reunión con la presentación general del contrato de obra como de intervención. Se presenta el alcance vializado de alcantarillado sanitario donde se tienen 15953m de red vializado, 8318m de red construida y 3441m de red para reformulación.

Debido a observaciones del municipio y diferencias de cantidades llevarán a cambios del proyecto contemplado inicialmente.

En la parte baja del municipio se presentan cambios de diámetros dado que en el diseño inicial se contaban con diámetros mayores.

De igual manera el Bano Galán y Guadalupe Salcedo no estaban contemplados en el diseño inicial y fueron incluidos dentro de la reformulación.

FECHA:

17/07/2024

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En el barrio El Pardo se instalará tubería nueva de 10" dado que la existente de 12" no cumple parámetros hidráulicos establecidos por la 0330 de 2019 y adicionalmente no es posible conectar una tubería de 12" a 10" para garantizar conexión con el colector final hacia la PTAR.

Se presentan los dos pasos elevados necesarios para realizar la conexión del alcantarillado sanitario a la PTAR. De igual manera se presentan los cambios solicitados por la administración municipal en reuniones anteriores dando alcance al 100% del impacto necesario para las redes de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario.

Se aclara que el contratista junto con el municipio han trabajado conjuntamente para la solicitud de los permisos de ocupación de cauce por parte de la corporación.

Se ha avanzado en la reunión de autoridades en un 85-90% intentando adelantar lo más posible las reuniones necesarias avanzando para continuar con la obra este año.

Se propone realizar la radicación de la reformulación a más tardar en 10 días junto con los permisos necesarios para solicitar los permisos de ocupación de cauce.

Se solicita por parte del contratista armonizar los esfuerzos para agilizar junto con las entidades directamente implicadas el trámite de los permisos necesarios para la reformulación.

ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:

17/07/2024

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se incluye adicionalmente en la carrera 10 entre AV. Magrinal y Cl/2 se realiza el reemplazo de la tubería propuesta de 14" a 16", junto con la construcción de sumideros para evitar inundaciones en esta carrera.

Se presentan adicionalmente los sumideros propuestos para el control del caudal de escorrentía por la precipitación en el caso urbano.

Se aclara que el municipio debe reconfigurar el cauce para garantizar que el vertimiento de la PTAR cargue al cuerpo de agua.

Para la parte de obra se plantea un generador eléctrico para el funcionamiento de la planta a tiempo completo.

Fu ideal que la administración municipal delegue una persona para que se capacite y opere durante el periodo de puesta en marcha de la PTAR.


COMPROMISOS

	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.	Ayuda en la independización de aguas intradomiciliares	Alcaldía Municipal	
2.	Radicación de permisos de ocupación de cauces	Alcaldía Municipal Contratista	27/07/2024
3.	Radicación de la reformulación al MVCT	Contratista	27/07/2024
4.	Revisión de cantidades de la reformulación	Contratista / EPC	14/07/2024

	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	17/07/2024	No. ACTA:	
---------------	------------	------------------	--

5.	Complementar el cartel pluvial al cono algarrobo en el Barro El Prado	Alcaldia Municipal	
6.	Proxima reunión (10:00 AM) en EPC	EPC - Alcaldia - Contraloría Ministerio - Interventoría	30/07/2024
7.			

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Raul Saavedra	NOMBRE:	
CARGO:	Interventor	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	
